


HARMONOGRAM VÝSTAVBY


Název úkolu	Start	Koniec
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej	01.08.2022	04.09.2022
Zateplenie obvodového pláňa	01.08.2022	25.08.2022
OSTATNÉ PRÁCE	01.08.2022	30.08.2022
Leženie ľahkej pracovnej pomôcky, s výškou	01.08.2022	01.08.2022
Búranie muriva z betónu prostého	04.08.2022	04.08.2022
Búranie kominov muriva z tehlí na akčkoľvek	04.08.2022	04.08.2022
Očistenie (jestvujúcej) omietky vonkajšieho schodiska vč.vyspravky a očistenie existujúceho poruchu, príprava pre montáž nových vrstiev	05.08.2022	06.08.2022
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za	05.08.2022	06.08.2022
Očistenie vonkajšej brzdovej omietky stien a sokla vč.vyspravky a vyvornanie povrchu (pod	08.08.2022	08.08.2022
Penetrácia stien pod omietku	09.08.2022	09.08.2022
Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku	10.08.2022	10.08.2022
Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za	10.08.2022	10.08.2022
Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	10.08.2022	10.08.2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a	10.08.2022	10.08.2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	10.08.2022	10.08.2022
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	01.08.2022	01.08.2022
Demontáž stábiou v doskách -0,01000	01.08.2022	01.08.2022
IZOLÁCIE TEPELNEJ BARIÉRY STAVEBNÝCH	12.08.2022	13.08.2022
Montáž tepelnej izolácie páne stropov	12.08.2022	13.08.2022
Presun hmôt pre izolácie tepelnej v objektoch	12.08.2022	13.08.2022
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	15.08.2022	25.08.2022
Montáž stábiou drevená pomocná konštrukcia z OSB3 dosiek hr.15 mm MW hr.30	15.08.2022	17.08.2022
Zateplenie vonkajšieho ostena NOBASIL TF	18.08.2022	22.08.2022
Adhézny náter vonkajšieho schodiska	22.08.2022	22.08.2022
Reprofilácia omietky vonkajšieho schodiska	22.08.2022	22.08.2022
Zateplenie sokla doskami XPS hr.150 mm	23.08.2022	25.08.2022
PRESUNY HMÔT	22.08.2022	23.08.2022
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	22.08.2022	23.08.2022
Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strechy	02.08.2022	30.08.2022
KRYTINY TVRDÉ	02.08.2022	02.08.2022
Demontáž arbestocement. krytiny z AZC	02.08.2022	02.08.2022
Demontáž arbestocement. krytiny z AZC	02.08.2022	02.08.2022
Stvorcov do sutiny. Príplatok k cene za likvidáciu	02.08.2022	02.08.2022
Demontáž arbestocement. krytiny z AZC	02.08.2022	02.08.2022
Stvorcov do sutiny. Príplatok k cene za sklon nad	02.08.2022	02.08.2022
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch	02.08.2022	02.08.2022
Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku	08.08.2022	08.08.2022
Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za	08.08.2022	08.08.2022
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za	08.08.2022	08.08.2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a	08.08.2022	08.08.2022
Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na	08.08.2022	08.08.2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	08.08.2022	08.08.2022
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	03.08.2022	10.08.2022
Demontáž zvislého latovania	03.08.2022	03.08.2022
Vybúranie tramového dreveného stropu	04.08.2022	04.08.2022
Výmena poškodených častí krovu	05.08.2022	06.08.2022
Montáž latovania striech sklonu do 60 st.	08.08.2022	08.08.2022
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v	08.08.2022	08.08.2022
Montáž latovania štítových odkvapových rím	09.08.2022	10.08.2022
OSTATNÉ PRÁCE	04.08.2022	04.08.2022
Búranie podkladov mazačie hr. 50 mm,	04.08.2022	04.08.2022
Výskalenie kápsy v tehlovom murive pre	04.08.2022	04.08.2022
Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku	04.08.2022	04.08.2022
Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za	04.08.2022	04.08.2022
Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládku	04.08.2022	04.08.2022
Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za	04.08.2022	04.08.2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a	04.08.2022	04.08.2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	04.08.2022	04.08.2022
VOODROVNÉ KONŠTRUKCIE	05.08.2022	05.08.2022
Osadenie oceľových väzbových nosníkov L	05.08.2022	05.08.2022
KOVOVÉ DOPĽAKOVÉ KONŠTRUKCIE	05.08.2022	05.08.2022
Montáž trapezového plechu	05.08.2022	05.08.2022
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	08.08.2022	20.08.2022
Vyspravky - muriva po osadení IPE profilov	08.08.2022	08.08.2022
Sadrokartónový strop na drevenú konštrukciu uchytenú rýchlzávesom z dosiek GKFI hrúbky	15.08.2022	20.08.2022
POVLAKOVÉ KRYTINY	09.08.2022	12.08.2022
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v	09.08.2022	09.08.2022
Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej	10.08.2022	11.08.2022
Povlakové krytiny - montáž paronepriepustnej	12.08.2022	12.08.2022
Položenie geotextílie vodorovne pod tepelnú	12.08.2022	12.08.2022
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	10.08.2022	13.08.2022

Název stavby:
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov

Doba výstavby:
35 dní



HARMONOGRAM VÝSTAVBY

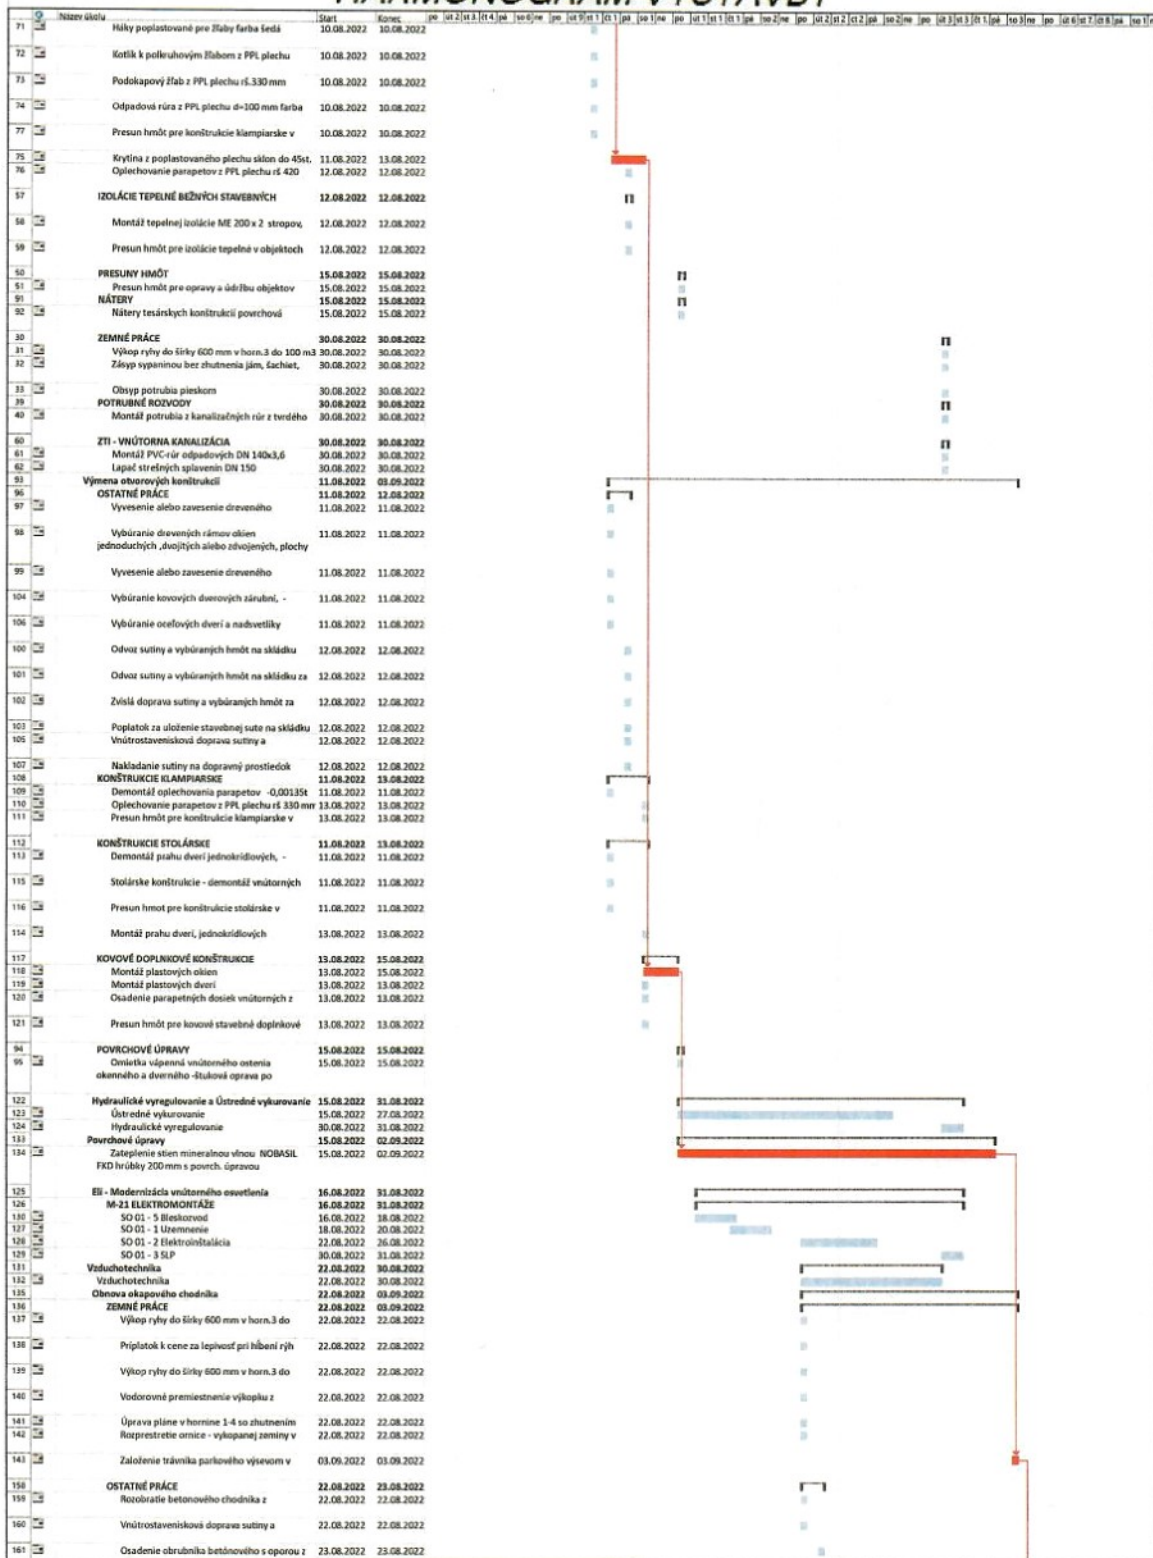


Názov stavby:
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brezov

Doba výstavby:
35 dní



STAVPOT, s.r.o.
 Mäsiarska 140
 044 15 Nizná Myňa
 IČO: 36746525 IČ DPH: SK2022033313

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

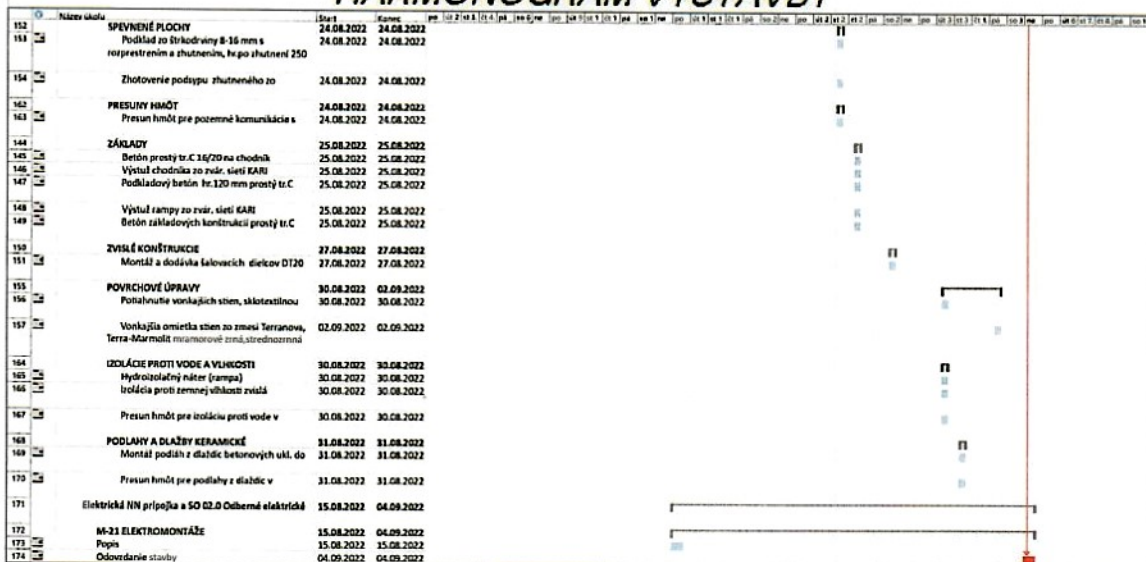

Práce na stavbe budú vykonávané počas pracovných dní a v dňoch pracovného voľna v čase od 7:00 do 18:00 hod. Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa na stavisku nebudú vykonávať práce.

<p>Název stavby:</p> <p>Začlenenie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Breňová</p> <p>Doba výstavby:</p> <p>35 dní</p>	<p>Účel</p> <p>Rozšírenie</p> <p>MÁK</p> <p>Stavby</p> <p>Stavba nových</p> <p>Rekonštrukcia</p> <p>Rekonštrukcia</p>	<p>Rekonštrukcia nových</p> <p>Ruční úlohy</p> <p>Práce s dĺžkou trvaním</p> <p>Ruční úlohy zahrnuté v určitej časovej úseku</p> <p>Ruční úlohy</p> <p>Práce s dátum dokončenia</p>	<p>Vnútroúložky</p> <p>Vnútroúložky</p> <p>Konebný termín</p> <p>Príbeh</p> <p>Príbeh ručne vedeného úseku</p> <p>Critical Path</p>	
--	---	---	---	--
