


NASADENIE A STAV PRACOVNÍKOV

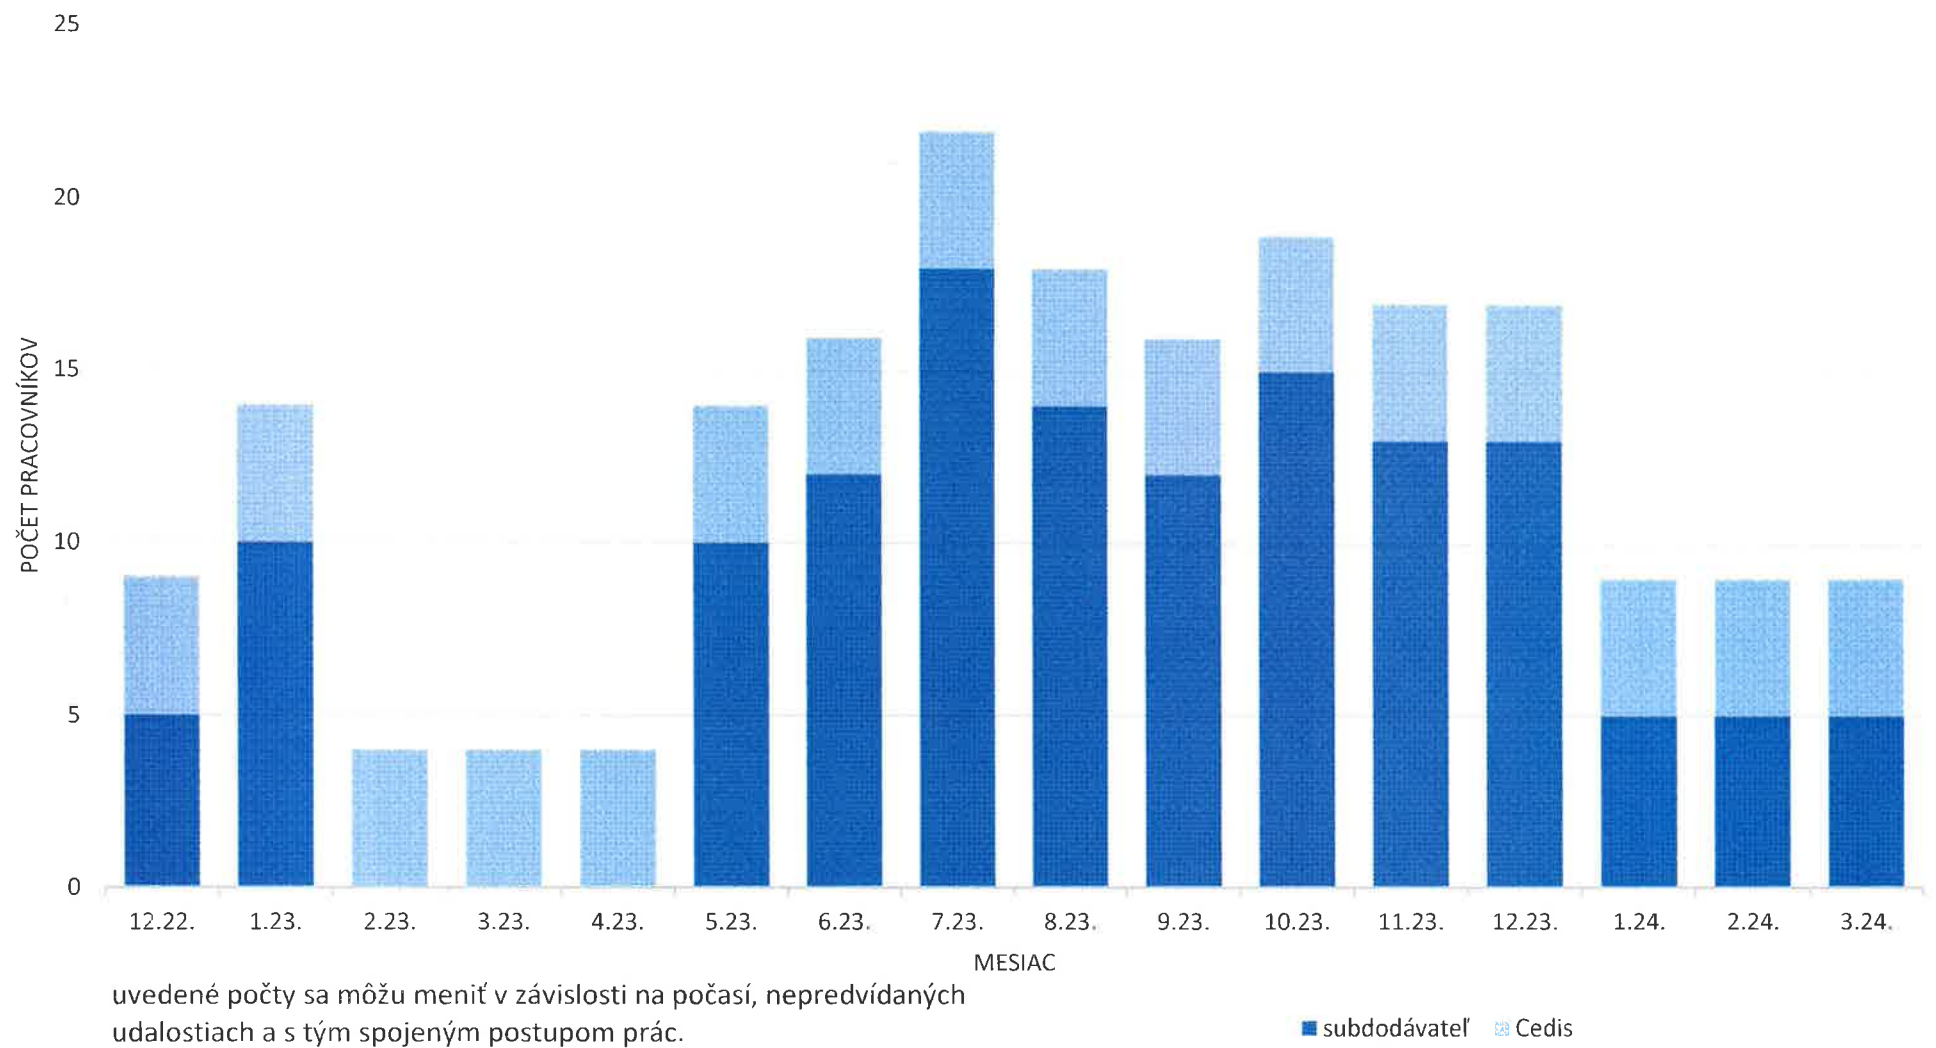

Vypracoval: Ing. Janoštiak

Kontroloval: Ing. Ferencz

Závazný harmonogram prác				Prestavba a nadstavba pôvodnej jedálne na základnú školu - zmena účelu využívania																																																
Identifikačný kód	Stavebný objekt	P.č.	Činnosť	Začiatok																																																
					nov	dec	Štvrť. 1, 2023				feb	mar	Štvrť. 2, 2023				apr	máj	jún	Štvrť. 3, 2023				júl	aug	sep	Štvrť. 4, 2023				okt	nov	dec	Štvrť. 1, 2024				jan	feb	mar												
1	SO01	1.	Prípravné práce																																																	
2	SO01	1.2	Prevzatie staveniska a zahájenie prác	Str 23.11.22	23.11																																															
3	SO01	1.3	Montáž oplotenia, zariadenia staveniska a wc	Str 23.11.22	23.11																																															
4	SO01	1.4	Búracie a demolačné práce																																																	
5	SO01	1.4.1	Búracie práce interiéru 1PP	Po 5.12.22	5.12																																															
6	SO01	1.4.1	Búracie práce interiéru 1NP	Str 21.12.22	21.12																																															
7	SO01	1.4.2	Búracie práce strecha	Ne 1.1.23	1.1																																															
8	SO02	2	Areálové rozvody	Št 15.6.23																																																
9	SO01	3	Stavebné práce																																																	
10	SO01	3.1	HSV																																																	
11	SO01	3.1.1	Zemné práce (Po odsúhlasení zmenového listu na stužujúce steny)		Predpokladaná doba trvania od nástupu na práce																																															
12			Betonáž stien (Po odsúhlasení zmenového listu na stužujúce steny)		Predpokladaná doba trvania od nástupu na práce																																															
13	SO01	3.1.2	Kanalizácia a uzemnenie objektu (Po odsúhlasení zmenového listu na stužujúce steny)		Predpokladaná doba trvania od nástupu na práce																																															
14	SO01	3.1.3	Zakladanie a izolácie (Po odsúhlasení zmenového listu na stužujúce steny)		Predpokladaná doba trvania od nástupu na práce																																															
15			Trysková injektáž	Ut 16.5.23																																																
16			Montáž stĺpov 1NP	Ut 16.5.23																																																
17	SO01	3.1.4	Betonárske práce, oceľová konštrukcia, ŽB stropy	Str 17.5.23																																																
18	SO01	3.1.5	Murovanie - obvodové steny a priečky (1PP závislé od So 20.5.23 sanácie stien)																																																	
19	SO01	3.1.6	Podlahy, omietky	Po 31.7.23																																																
20			Sanačné omietky a injektáž (po vyriešení dodatku)		Predpokladaná doba trvania od nástupu na práce																																															
21			Betonáž podláh 1PP (závislá od dodatku na sanáciu stien 1PP)		Predpokladaná doba trvania od nástupu na práce																																															
22	SO01	3.1.7	Strecha strešné konštrukcie a strešný plášť	Št 6.7.23																																																
23	SO01	M2	Míľnik č.1	Ne 17.12.23																																																
24	SO01	3.2	PSV		17.12																																															
25		S	Stavebná pripravenosť pre výplne otvorov	Po 31.7.23																																																
26	SO01	3.2.1	Výplne otvorov - okná	Po 31.7.23																																																
27	SO01	3.2.2	SDK - priečky a stropy - konštrukcie	So 5.8.23																																																
28		S	Stavebná pripravenosť pre záklop priečok	Št 31.8.23																																																
29	SO01	3.2.3	Záklop priečok	Št 31.8.23																																																
30		S	Stavebná pripravenosť pre dlažby a obklady	Ut 5.9.23																																																
31	SO01	3.2.4	Dlažby a obklady	Ut 5.9.23																																																
32	SO01	3.2.5	Maľby a nátery	Ne 22.10.23																																																
33		S	Stavebná pripravenosť pre začiatok prác na fasáde	Po 31.7.23																																																
34	SO01	3.2.6	Fasáda, vrátane všetkých vrstiev	Po 31.7.23																																																
35		S	Stavebná pripravenosť pre zámočnicke práce	Po 25.9.23																																																
Pi 19.5.23					Strana 1																																															
					Vypracoval: Ing. Matúš Ján Janoštiak																																															

