


Časový harmonogram realizácie diela

1 Plánovan Skutočnosť Cena prác

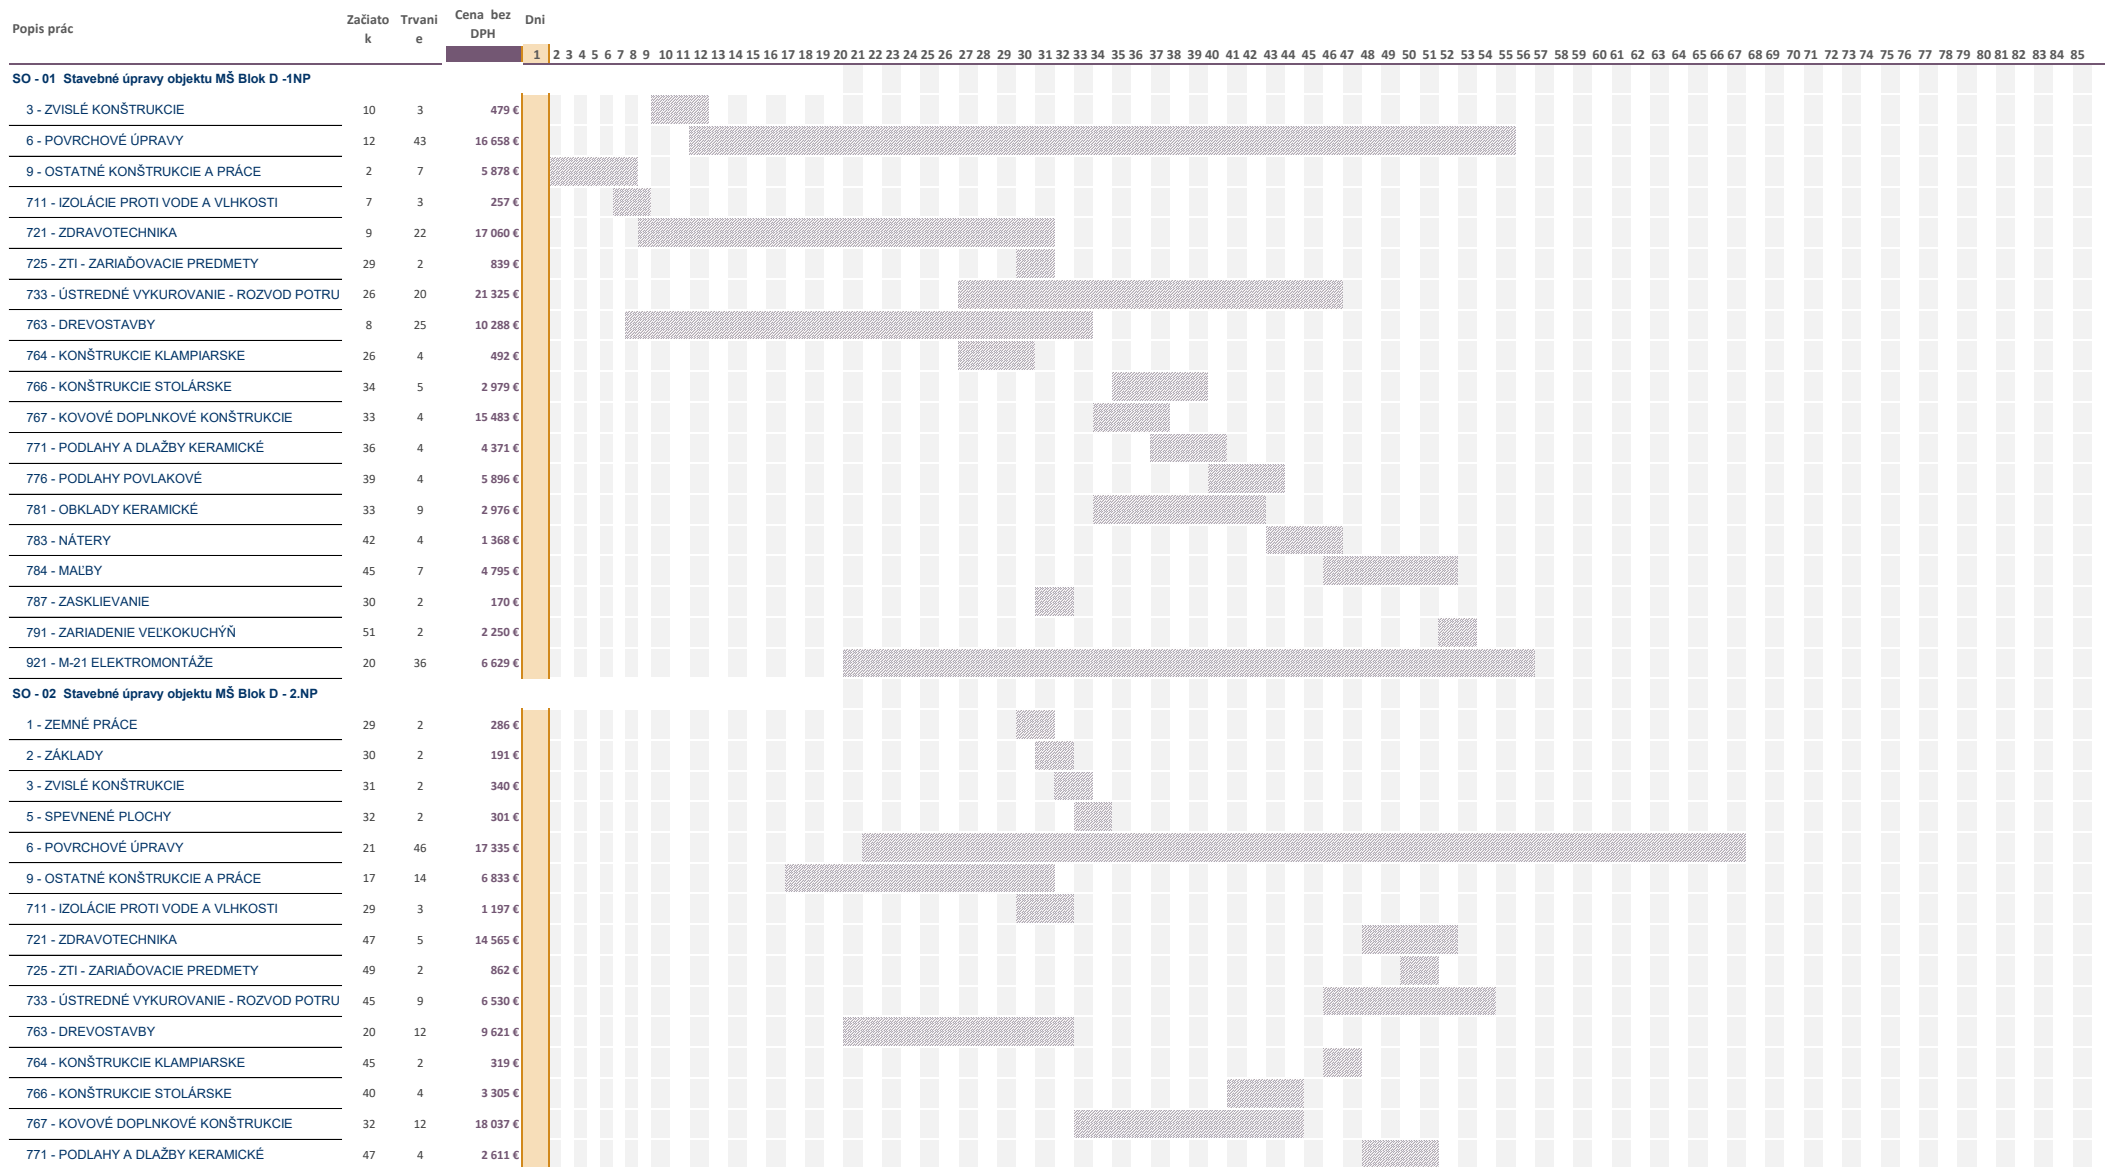

| | | | | |
|---|----|----|----------|--|
| 776 - PODLAHY POVLAKOVÉ | 45 | 5 | 4 712 € | |
| 781 - OBKLADY KERAMICKÉ | 40 | 7 | 5 718 € | |
| 783 - NÁTERY | 47 | 3 | 1 281 € | |
| 784 - MALBY | 48 | 5 | 3 725 € | |
| 787 - ZASKLIEVANIE | 49 | 1 | 170 € | |
| 791 - ZARIADENIE VEĽKOKUCHÝŇ | 50 | 3 | 2 250 € | |
| 921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 32 | 42 | 4 941 € | |
| SO - 03 Rekonštrukcia časti vnútroareálových rozvodov vody | | | | |
| 8 - POTRUBNÉ ROZVODY | 30 | 14 | 10 725 € | |
| SO - 04 Stavebné úpravy a prístavba časti jedálne MŠ | | | | |
| 1 - ZEMNÉ PRÁCE | 22 | 3 | 2 666 € | |
| 2 - ZÁKLADY | 23 | 2 | 4 904 € | |
| 3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE | 25 | 5 | 6 609 € | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 29 | 4 | 5 803 € | |
| 5 - SPEVNENÉ PLOCHY | 55 | 6 | 550 € | |
| 6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY | 34 | 46 | 21 828 € | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 25 | 28 | 2 626 € | |
| 711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI | 24 | 3 | 999 € | |
| 712 - POVLAKOVÉ KRYTINY | 35 | 4 | 5 934 € | |
| 713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAV. KONŠTR | 60 | 4 | 7 457 € | |
| 721 - ZDRAVOTECHNIKA | 40 | 7 | 4 857 € | |
| 733 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRU | 44 | 5 | 4 103 € | |
| 764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ | 34 | 21 | 1 725 € | |
| 766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE | 38 | 4 | 1 833 € | |
| 767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE | 54 | 7 | 9 012 € | |
| 775 - PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ | 30 | 3 | 36 € | |
| 776 - PODLAHY POVLAKOVÉ | 56 | 5 | 5 161 € | |
| 783 - NÁTERY | 62 | 4 | 557 € | |
| 784 - MALBY | 65 | 6 | 1 838 € | |
| 921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE | 42 | 40 | 1 983 € | |
| Preberanie a odovzdanie diela | 85 | 1 | | |
