


Identif.	Režim úlohy	Nazov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Nazvy zdrojov	2024	nov	dec	Štvrť 1, 2025	Štvrť 2, 2025	Štvrť 3, 2025	Štvrť 4, 2025	Štvrť 1, 2026	Štvrť 2, 2026
1		Zvyšenie kapacity materskej škôlky v obci Hefpa -dokončenie stavby	339 dni	Po 13.1.25	Št 30.4.26											
2		Prevzatia staveniška	1 deň	Po 13.1.25	Po 13.1.25											
3		Búracie práce	35 dni	Ut 14.1.25	Po 3.3.25											
4		očistenie interierových omietok, vyburanie podláh a priečok	11 dni	Ut 14.1.25	Ut 28.1.25	2										
5		demontáž zábradlia s kľampiarskymi prvkami	4 dni	Ut 14.1.25	Pi 17.1.25	2										
6		Vnútročné práce	154 dni	Po 24.3.25	Št 23.10.25											
7		vnútorná elektroinštalácia	13 dni	Po 24.3.25	Str 9.4.25	3										
8		zdravotechnická inštalácia	21 dni	Po 24.3.25	Po 21.4.25	3										
9		rozvody vykurovania	15 dni	Po 24.3.25	Pi 11.4.25	3										
10		realizácia vnútorných omietok	30 dni	Ut 22.4.25	Po 2.6.25	8,9,7										
11		realizácia vrstiev podláh okrem nášlapnej vrstvy	10 dni	Ut 3.6.25	Po 16.6.25	10										
12		Technologická prestávka	10 dni	Ut 17.6.25	Po 30.6.25	10,11										
13		SDK podlaž so zateplením stropu	30 dni	Ut 1.7.25	Po 11.8.25	12										
14		malby vnútorných omietok	20 dni	Št 28.8.25	Str 24.9.25	13FS+12 dni										
15		keramické obklady a dlažby	30 dni	Ut 12.8.25	Po 22.9.25	13										
16		kompletáž saníty, vykurovania a elektroinštalácie	15 dni	Št 25.9.25	Str 15.10.25	14										
17		realizácia PVC podlahy	10 dni	Št 25.9.25	Str 8.10.25	14										
18		kompletáž interierových dverí a stolárskych výrobkov	11 dni	Št 9.10.25	Št 23.10.25	17										
19		Vonkajšie práce	236 dni	Ut 3.6.25	Ut 28.4.26											
20		realizácia kontaktného zateplovacieho systému	119 dni	Ut 3.6.25	Pi 14.11.25	2FS+5 mesiace										
21		realizácia kompletného oploštenia	109 dni	Po 17.11.25	Št 16.4.26	20										
22		Ukončenie diela	117 dni	Po 17.11.25	Ut 28.4.26											
23		odstránovanie vád a nedorobkov	9 dni	Po 17.11.25	Št 27.11.25	20,6										
24		odovzdanie diela	1 deň	Ut 28.4.26	Ut 28.4.26	23										

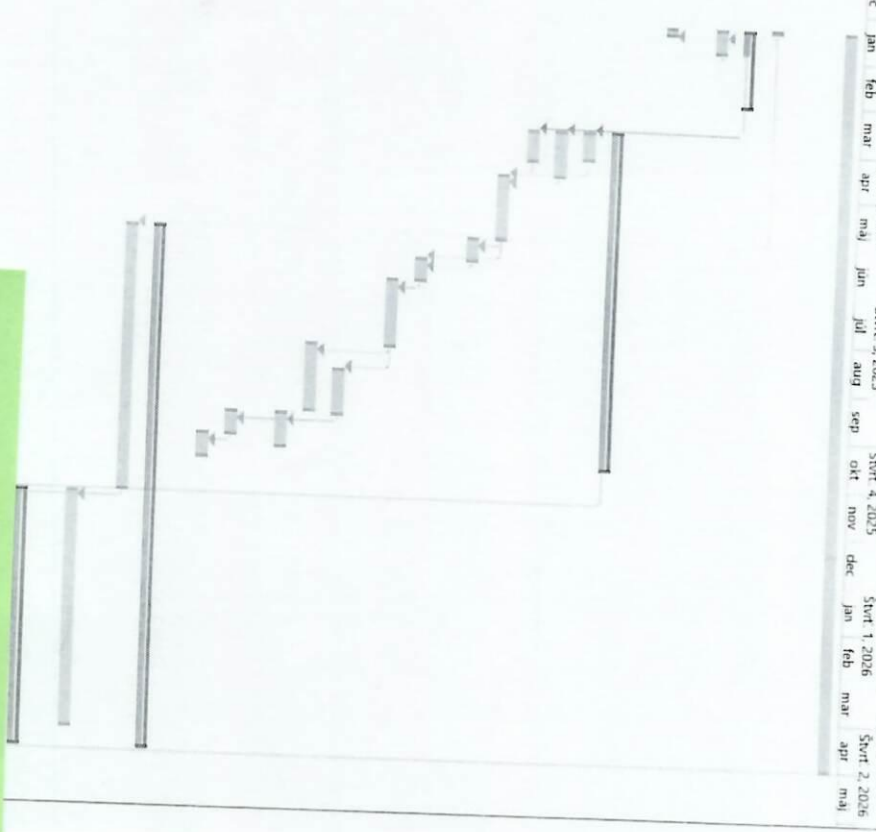

Projekt: Materska škôlka v Hefpe

Dátum: Ne 1.12.24

Úloha

Rozdeľte

Medzník

Súhrn

Súhrn projektu

Neaktívna úloha

Neaktívny medzník

Neaktívny súhrn

Manuálna úloha

Iba trvanie

Manuálny súhrn

Manuálny súhrn

Iba začiatok

Iba dokončiť

Externé úlohy

Externý medzník

Termin

Priebeh

Manuálny pr

Údaje o subdodávateľoch zákazka Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa

Obchodné meno subdodávateľa	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
	meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
Zdenko Krahulec, IČO: 51 748 622	Zdenko Krahulec	976 68 Heľpa, Plickova 924/24	29.08.1982
Predmet subdodávky:	zemné práce	Percento subdodávky:	10 %
Jozef Fedor, IČO: 41 861 175	Jozef Fedor	976 68 Heľpa, Hurbanova 743/9	25.05.1980
Predmet subdodávky:	elektroinštalačné práce	Percento subdodávky:	10 %
Peter Belko IČO.41 860 128	Peter Belko	976 52 Č. Balog Kopaničná 1138/49	25.03.1964
	kúrenárske práce	Percento subdodávky:	9 %

