



Harmonogram stavby "Prestavba bývalej školy na budovu EXPO, časť A"

Pracovná doba bude od 7:00 do 18:00 v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna.
Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa práca na stavenisku nebude vykonávať.
Zobrazenie kritickej cesty.

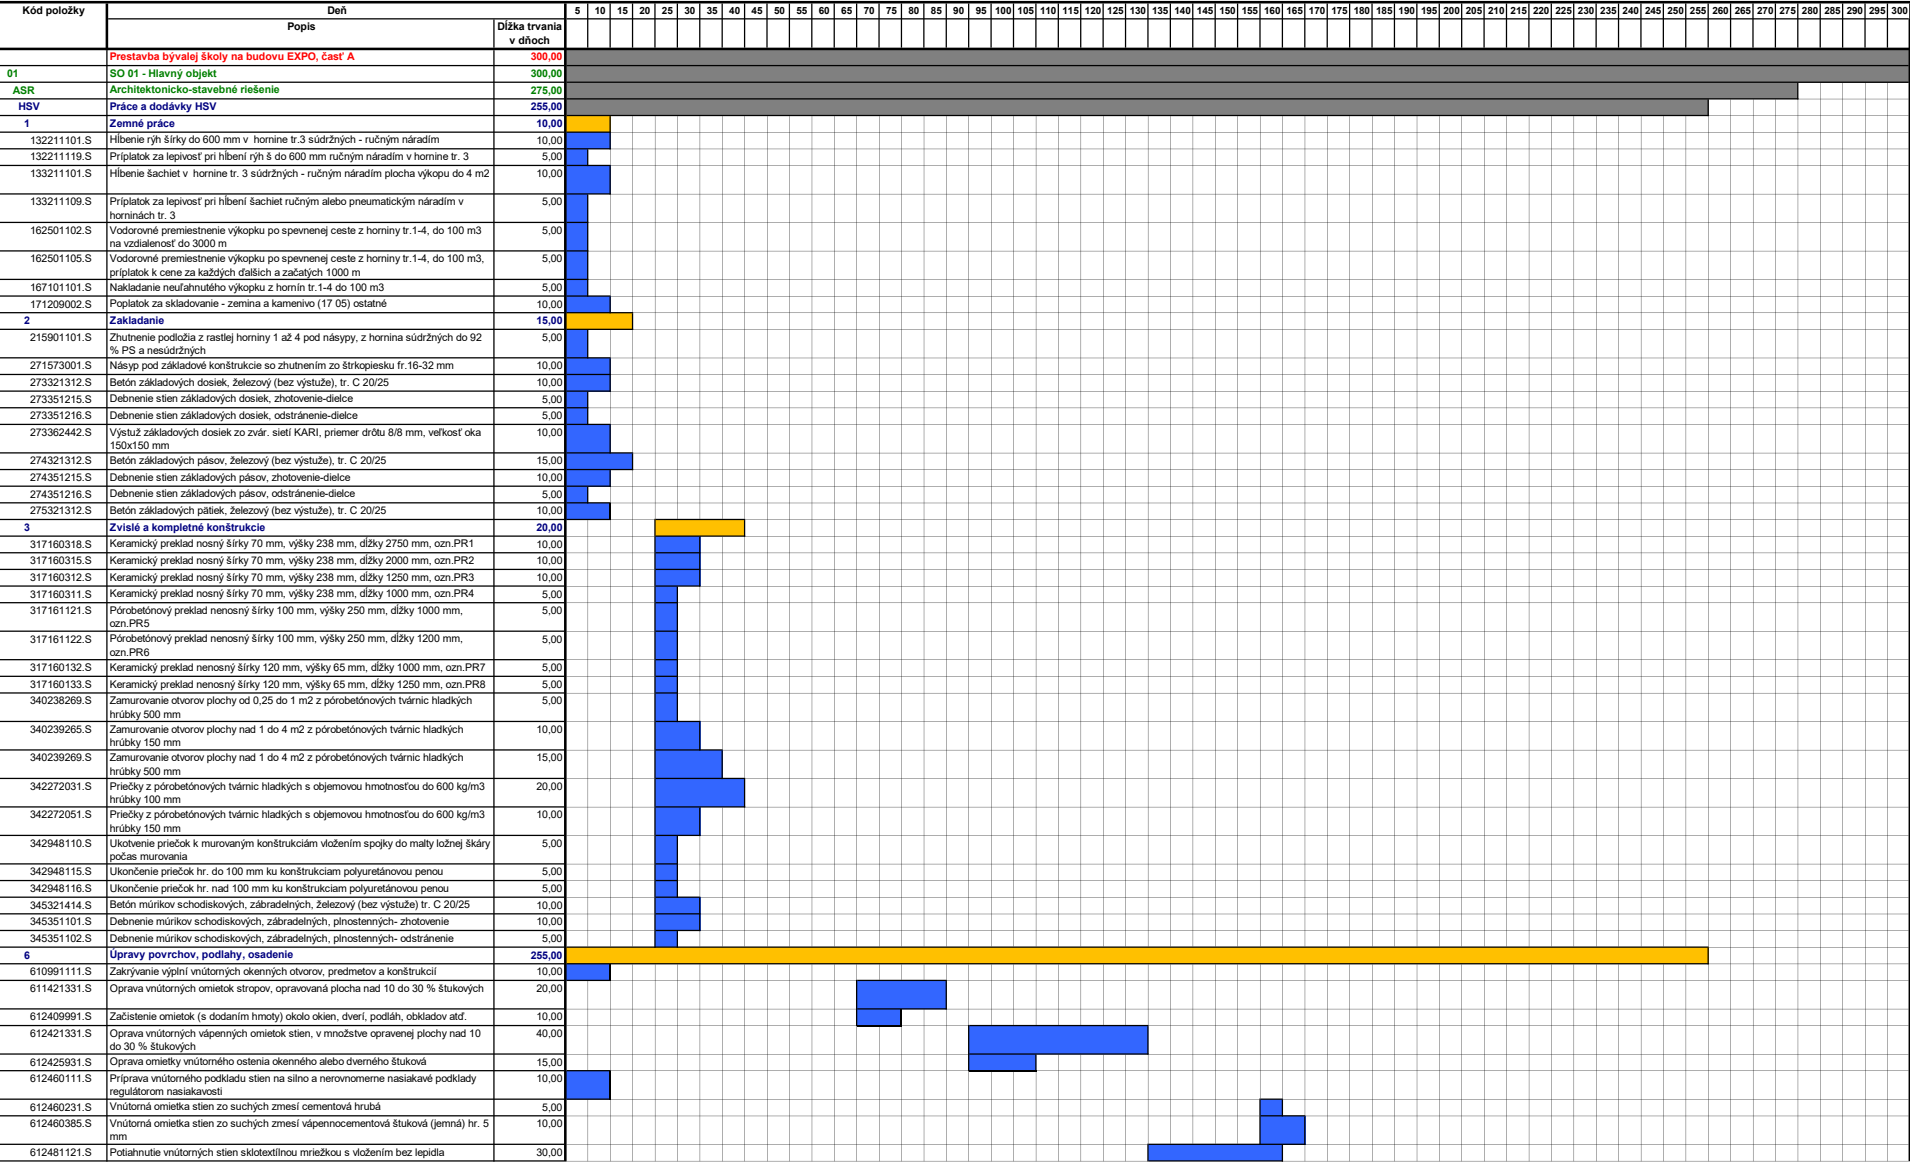


965044201.S	Brúsenie existujúcich terazzových podláh	10,00	
972056014.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových, ozn.UVK1	5,00	
766211811.S	Demontáž madiel schodiskových drevených	5,00	
978011141.S	Očistenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	10,00	
978013141.S	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	15,00	
941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	25,00	
952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	25,00	
952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostach, chodbách, na schodíšť a na poválach	5,00	
979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúranych hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	35,00	
979081111.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	40,00	
979081121.S	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	30,00	
979082111.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	35,00	
979082121.S	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	10,00	
979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	20,00	
979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľnice (17 01) ostatné	85,00	
99	Presun hmôt HSV	40,00	
999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	40,00	
PSV	Práce a dodávky PSV	230,00	
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	10,00	
711131101.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná AIP na sucho	10,00	
998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	5,00	
713	Izolácie tepelné	25,00	
713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne, ozn.P2	20,00	
713116030.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fókanou celulózou hrúbky do 23 - 28 cm, ozn.P2	20,00	
713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou, ozn.P3, P4, P6, P8	10,00	
713122121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách, ozn.P4	25,00	
713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	20,00	
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	5,00	
762	Konštrukcie tesárske	115,00	
762081022.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie reziva, hranoly do 224 cm2	5,00	
762081032.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie reziva, hranoly do 288 cm2	10,00	
762081042.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, jednostranné brúsenie reziva, hranoly do 450 cm2	10,00	
762081052.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 224 cm2	5,00	
762081053.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 288 cm2	10,00	
762081054.S	Zvlášťne výkony na stavenisku, jednostranné hobľovanie reziva, hranoly do 450 cm2	10,00	
762311103.S	Montáž kotvéných želez, príložiek, páteľ, s pripojením k drevenej konštrukcii	15,00	
762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	15,00	
762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	80,00	
762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	25,00	
762332140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2	95,00	
762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	25,00	
762341252.S	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	60,00	
762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	20,00	
762421315.S	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 25 mm	75,00	
762495000.S	Spojovacie prostriedky pre oštieňovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	5,00	
762810017.S	Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm, ozn.P2	15,00	
762810153.R	Základ stropov z dosiek OSB dvojvrstvových skrutkovaných na PD hr. dosky 12+12 mm, ozn.P3, P6, P8	70,00	
762823111.S	Montáž stropnic z hranešho reziva vrátane trámových výmen prierezovej plochy do 75 cm2, ozn.P2	30,00	
762895000.S	Spojovacie prostriedky pre základ, stropnice, podbijanie - klince, svorky	5,00	
998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	20,00	
763	Konštrukcie - drevostavby	57,90	
763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvójurovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12,5 mm	60,00	
998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	5,00	
764	Konštrukcie klampiarske	45,00	
764352425.S	Zřaby z pozinkovaného farbeného PZT plechu hr. 0,6 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií pododkrapové polkruhov r.š. 280 mm, ozn.1K, 3K, 8K, 9K	45,00	
764359411.S	Príslušenstvo k Zřabom z pozinkovaného farbeného PZT plechu, kotlík konický pre rúry s priemerom do 100 mm, ozn.4K	10,00	
764410730.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 180 mm	5,00	


764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	15,00
764430440.S	Oplechovanie z pozinkovaného farebného PZl plechu hr. 0,6 mm, muriva, nadmurovy a atiky, vrátane rohov r.š. 500 mm, ozn. 10K	20,00
764454453.S	Zvudové rúry z pozinkovaného farebného PZl plechu hr. 0,6 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov, kruhové, s priemerom 100 mm, ozn. 2K, 5K, 6K, 7K	20,00
998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie kiampiarske v objektoch výšky do 6 m	10,00
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	85,00
765332001.S	Betónová krytina drážková, jednoduchých striech, sklon do 35°	85,00
765331813.S	Doplnková výbava k betónovej krytine prestupy betónovou krytinou pre kanalizačné odvetranie	10,00
765331815.S	Doplnková výbava k betónovej krytine prestupy betónovou krytinou pre anténu a satelit	5,00
765331817.S	Doplnková výbava k betónovej krytine prestupy betónovou krytinou pre odvod spalín	5,00
765332165.S	Doplnky k betónovej krytine úžľabie hliníkový pás, r.š. 500 mm	10,00
765334501.S	Doplnky k betónovej krytine hrebeň s použitím vetracieho pásu, sklon do 35° so samolepiacim okrajom	10,00
765334541.S	Doplnky k betónovej krytine nárožie s použitím vetracieho pásu, sklon do 35° so samolepiacim okrajom	45,00
765331896.R	Montáž doplnkovej výbavy k betónovej krytine olemovanie komína mirtiva tesniacim pásom a krycou lištou	25,00
765332196.S	Montáž doplnkov k betónovej krytine odkvapovej hrany	25,00
765901082.S	Montáž pokrytia strechy fóliou od 22° do 35°, na krokvy	35,00
998765201.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	20,00
766	Konštrukcie stolárske	120,00
766211200.S	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	10,00
766621400.S	Montáž okien, dverí a stien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	85,00
766662113.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpodrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	60,00
766669116.S	Montáž samozatvárača pre dverné kridla	5,00
766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	10,00
766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	10,00
766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	15,00
766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dreve jednokridlove	30,00
998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	10,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	50,00
76711Z	Pilierová kotviaca páčka výškovo nastaviteľná, 150x150 mm / M30x250 mm, D+M, ozn. 1Z	5,00
7672Z	Kotviaca páčka trámu na stenu dvojdielná, 150x75x30 mm, D+M, ozn. 2Z	5,00
767163100.S	Montáž zábradlia oceľového, kotvenie do podlahy, ozn. 3Z, 4Z	20,00
767995215.S	Výroba atypického zábradlia rovného z rúrok, ozn. 3Z, 4Z	20,00
767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	10,00
767660199.R	Hliníkové vonkajšie žalúzie, podomietkové prevedenie-predný/zadný plech, vrátane elektrického ovládania, RAL 9006, D+M	50,00
767161111.R	Repas schodiskového zábradlia rovného	10,00
998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	5,00
771	Podlahy z dlaždíc	70,00
771275308.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu vef. 300 x 600 mm	10,00
771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu vef. 600 x 100 mm	10,00
771415068.S	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do tmelu vef. 600 x 95 mm	35,00
771575130.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore vef. 450 x 450 mm	10,00
771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 600 x 600 mm	35,00
771576136.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného vef. 600 x 600 mm	70,00
998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	10,00
776	Podlahy povlakové	70,00
776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	5,00
776541200.S	Položenie povlakových podláh PVC vinyl, spoj click	70,00
998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	5,00
781	Obklady	85,00
781445014.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 240x71 mm	30,00
781445122.S	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore vef. 200x400 mm	40,00
781445204.S	Montáž obkladov vonkajších stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného vef. 240x71 mm	85,00
998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	5,00
783	Nátery	40,00
783201812.S	Očistenie kovových stavebných doplnkových konštrukcií oceľovou keťou	5,00
783226100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	5,00
783225100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnas. 1x s emailov	5,00
783271002.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním, ozn. 3Z, 4Z	10,00
783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby šedej základné, ozn. 3Z, 4Z	10,00
783626000.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	30,00
783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	40,00

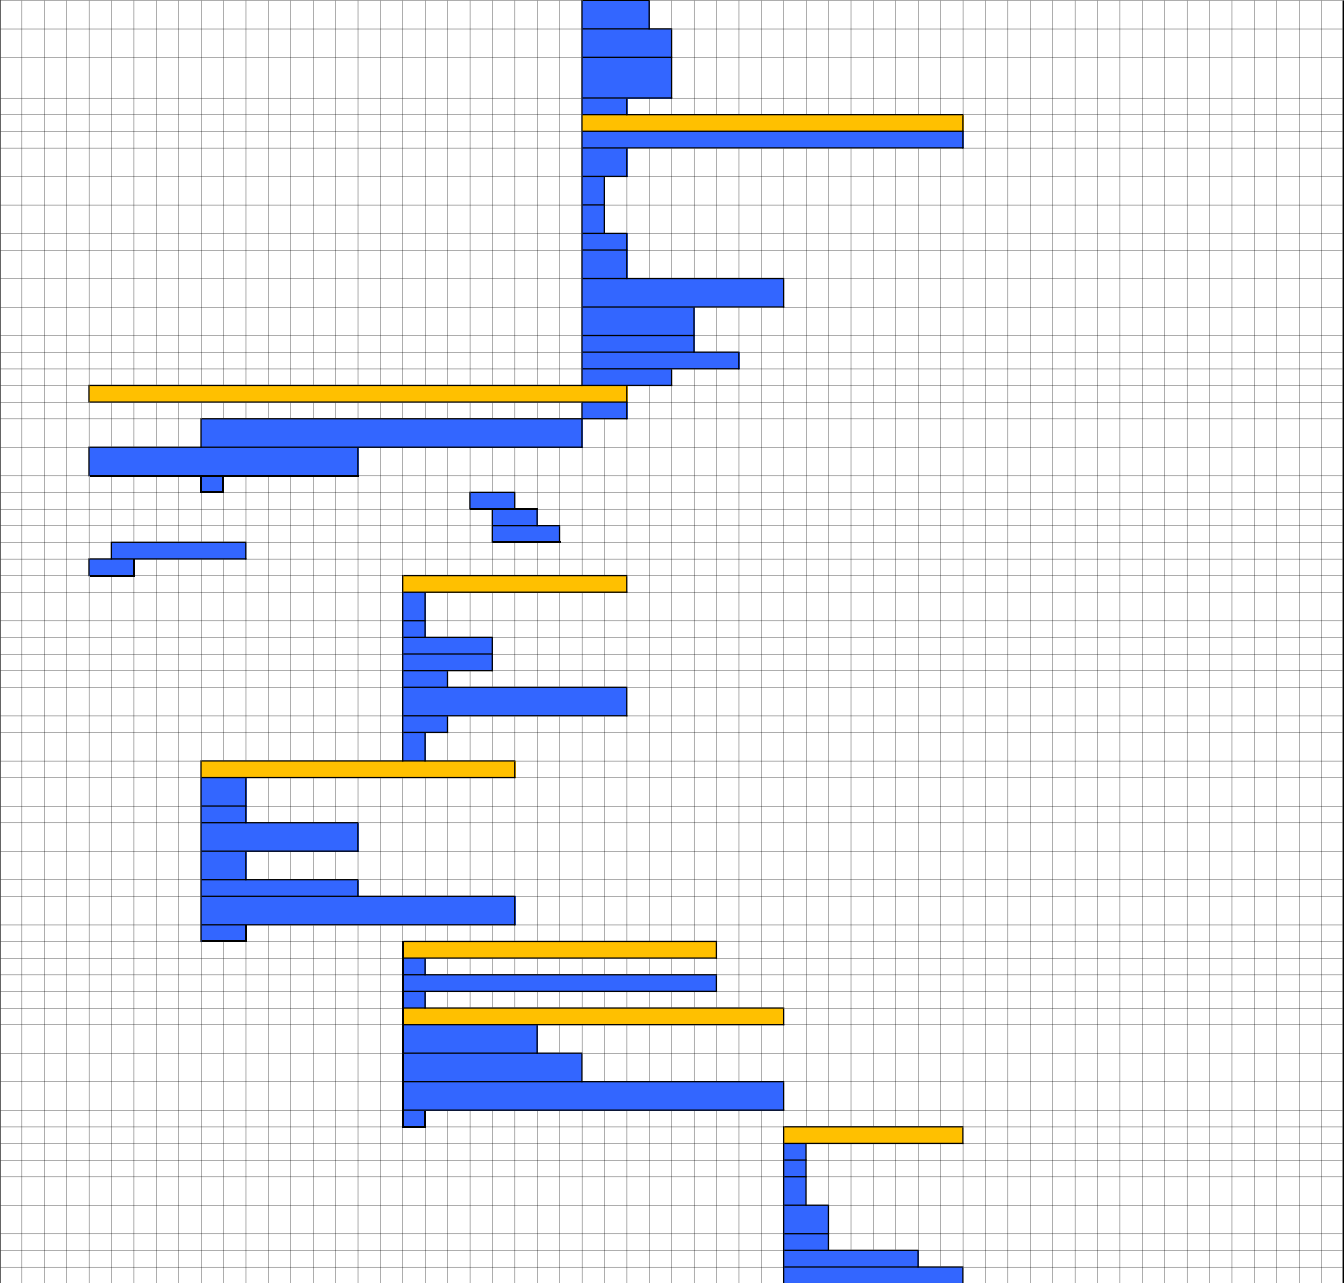

783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná, ozn.P2	15,00
783894612.S	Náter farbami akrylátovými ekologickými riediteľnými vodou, biely náter sadrokartónových stropov 2x	15,00
784	Maľby	30,00
784401801.S	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m	5,00
784424271.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, s bielym stropom na podklad jemnozrný do 3,80 m	30,00
784424281.S	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, s bielym stropom na schodisku na podklad jemnozrný do 3,80 m	5,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	275,00
HZS000111	Demontáž a spätná montáž prvkov na fasáde a streche	275,00
ZTI	Zdravotechnika	15,00
HSV	Práce a dodávky HSV	5,00
1	Zemné práce	5,00
132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	5,00
132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	5,00
174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	5,00
175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	5,00
4	Vodorovné konštrukcie	5,00
451573111	Lážko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	5,00
8	Rúrové vedenie	5,00
871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zvislých	5,00
871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	5,00
871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	5,00
871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	5,00
877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	5,00
877266024.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	5,00
877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	5,00
877276026.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	5,00
877276048.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	5,00
877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	5,00
877326050.S	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 150/100	5,00
892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	5,00
892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	5,00
892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	5,00
892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	5,00
892372111-R	Zabezpečenie koncov kanal. potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	5,00
99	Presun hmôt HSV	5,00
998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	5,00
PSV	Práce a dodávky PSV	15,00
713	Izolácie tepelné	5,00
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	5,00
713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	5,00
998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	5,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	5,00
721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	5,00
721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	5,00
721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	5,00
721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	5,00
721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	5,00
721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	5,00
721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	5,00
721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	5,00
721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	5,00
998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	5,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	15,00
722171130.S	Potrubie plastlinikové D 16 mm	5,00
722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	5,00
722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	15,00
722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	5,00
722173175.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	5,00
722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	5,00
722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	5,00
722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	10,00
722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	5,00
722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	5,00
998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	5,00
725	Zdravotechnika - zariadenia	15,00
725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	15,00
725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	10,00

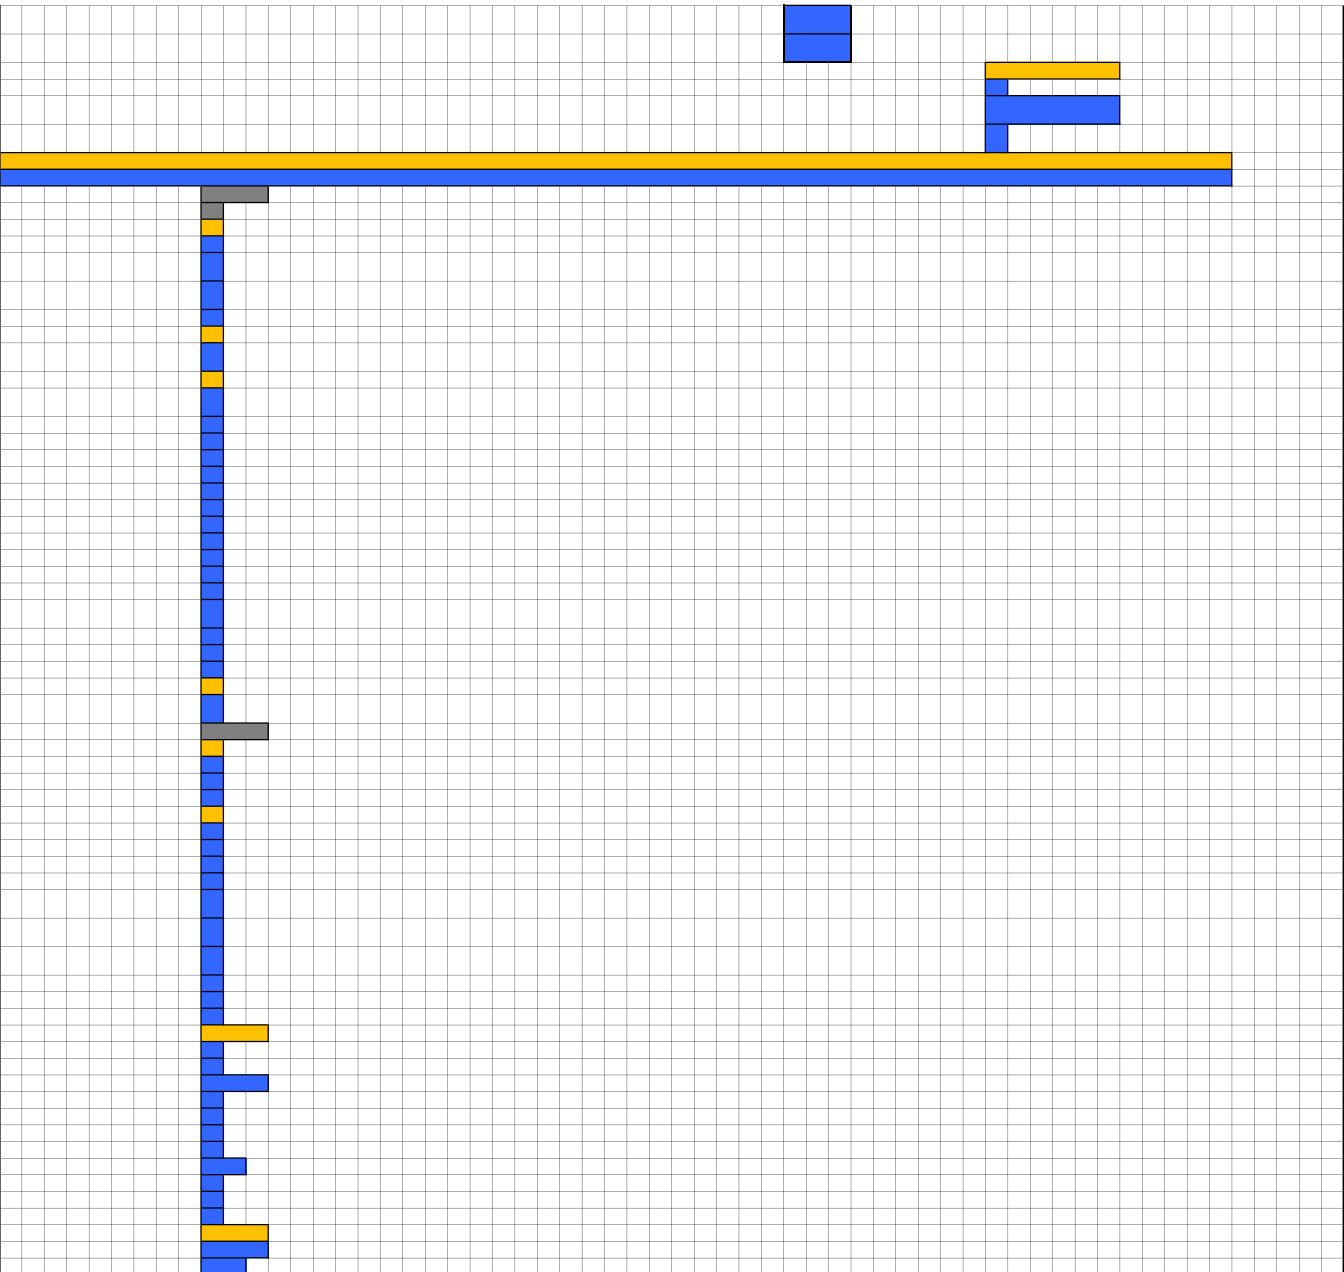

725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	5,00
725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, maďlá	5,00
725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	5,00
725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	15,00
725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malotrážneho do 10 L	15,00
725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	5,00
725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	10,00
725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	10,00
725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, ostatných typov do D 40 mm	5,00
998725201.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	5,00
763	Konštrukcie - drevostavby	5,00
763170031.S	Revízie dveríka s pevnými pántmi pre 300x300 mm	5,00
998763401.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	5,00
OPZ	Odborné plynové zariadenie	10,00
HSV	Práce a dodávky HSV	5,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5,00
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	5,00
PSV	Práce a dodávky PSV	10,00
723	Zdravotechnika - plynovod	10,00
723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	5,00
723120204o	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	10,00
723130251	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	5,00
723130252	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 32	10,00
723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	5,00
723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	5,00
723150366.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 44,5x2 mm	5,00
723150367.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	5,00
998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	5,00
783	Dokončovacie práce - nátery	5,00
783424340.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	5,00
M	Práce a dodávky M	5,00
23-M	Montáže potrubia	5,00
230210003.S	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	5,00
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	10,00
HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, oblažne, rutinné (Tr,2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - prevrátky stien, stropu	10,00
OST	Ostatné	10,00
HZS001	Revízia , revízia správa	10,00
UVK	Ústredné vykurovanie	50,00
HSV	Práce a dodávky HSV	20,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	20,00
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	5,00
HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie (Tr 2) /prevrátky priečok, vyspravenie/	20,00
PSV	Práce a dodávky PSV	50,00
713	Izolácie tepelné	15,00
713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	10,00
713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	15,00
713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	5,00
998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	5,00
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5,00
721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné prípojacie D 32 mm	5,00
721194103.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm	5,00
731	Ústredné kúrenie, kotolne	50,00
731200825.S	Demontáž kotla oceleového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 25 do 40 kW, -0,30625t	5,00
731201812.S	Demontáž kotla žiarorúrkového skriňového s polomechanickým roštom nad 40 do 75 kW, -0,78000t	10,00
731391813.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	5,00
731202810.S	Rozrezanie demontovaných kotlov oceleových s hmotnosťou do 500 kg	10,00
731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	10,00
731261070.S	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	50,00
B2HA2787	Uvedenie kotla Vitodens 100-W do prevádzky - alt. ekvivalent	20,00
VIE M082	Montáž dymovodov VISSMANN (50% z dodávky mat) - alt. ekvivalent	10,00
998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	10,00
732	Ústredné kúrenie - strojeovne	10,00
732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	10,00
998732201.S	Presun hmôt pre strojeovne v objektoch výšky do 6 m	5,00
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	15,00
733110803.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	5,00

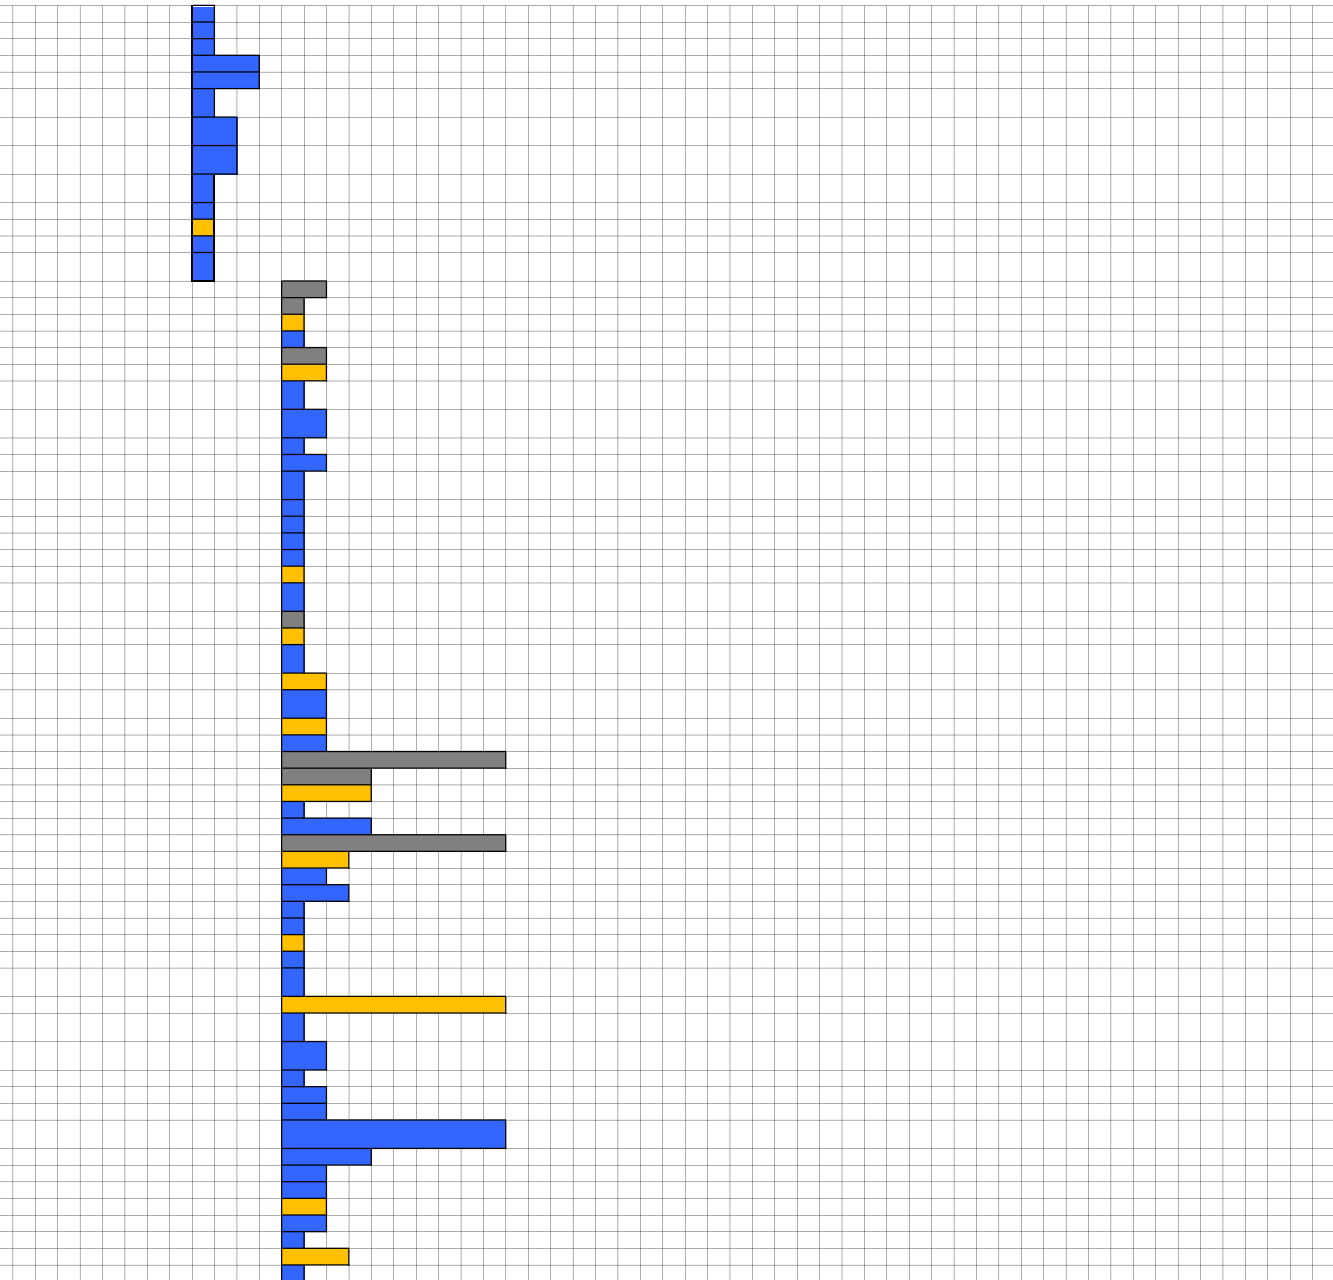

733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	10,00
733890801.S	Vnútroštv. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	5,00
733167115.S	Montáž plastliniového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 16 mm	10,00
733167118.S	Montáž plastliniového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 20 mm	10,00
733167121.S	Montáž plastliniového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 26 mm	10,00
733167124.S	Montáž plastliniového flexibilného potrubia pre vykurovanie lisovaním D 32 mm	15,00
733167187.S	Montáž plastliniového kolena lisovaním D 32 mm	10,00
733167199.S	Montáž plastliniového T-kusu lisovaním D 16 mm	5,00
733167200.S	Montáž plastliniového T-kusu lisovaním D 20 mm	10,00
733167203.S	Montáž plastliniového T-kusu lisovaním D 26 mm	10,00
733167206.S	Montáž plastliniového T-kusu lisovaním D 32 mm	10,00
733167378.S	Montáž plastliniovkej redukcie lisovaním D 26 mm	5,00
733167166.S	Montáž plastliniového prechodu lisovaním D 32 mm	10,00
733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	10,00
998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	5,00
734	Ústredné kúrenie - armatúry	10,00
734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	10,00
734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do 1, -0,00110t	5,00
734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	5,00
734223028.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalného jednoduchej	10,00
73423255.S	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích teles priamych/výbojov	10,00
73424006.S	Montáž guľového kohútia závitového G 1/2	5,00
73424012.S	Montáž guľového kohútia závitového G 1	2,00
73424000.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	2,00
734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	2,00
734291340	Montáž filtra závitového G 1	10,00
734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	5,00
734424140.S	Montáž tlakomera radiačného priemer 100 mm	5,00
998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	5,00
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	30,00
735151811.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového stavebnéj dĺžky do 1500 mm, -0,02135t	5,00
735151821.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového stavebnéj dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	5,00
735151822.S	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového stavebnéj dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04676t	5,00
73549811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav v o. pl. vykurovacích teles	5,00
735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 6m	5,00
735154040.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm dĺžky 400-600 mm	10,00
735154122.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 400 mm dĺžky 1000-1200 mm	10,00
735154132.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 500 mm dĺžky 1000-1200 mm	10,00
735154133.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 500 mm dĺžky 1400-1800 mm	30,00
735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 600 mm dĺžky 700-900 mm	10,00
735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	10,00
735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	10,00
735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvoradového výšky 900 mm dĺžky 400-600 mm	10,00
998735201.S	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch výšky do 6 m	5,00
H2S	Hodinovné zúčtovacie sadzby	15,00
HZS0000113	Stavbu montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (Zaregulovanie systému, vykurov. skúška/	15,00
ELI	Elektroinštalácia	115,00
M	Práce a dodávky M	115,00
D1	Bleskozvod	20,00
21022-0101	Vosiči zberní, zvodový s podperami FažN D10, Al D10, Cu D8mm	20,00
21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	5,00
21022-0302	Svorka bleskozvodná do 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	5,00
21022-0211	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 2m do muriva	5,00
21022-0401	Stĺtok na označenie zvodu	5,00
21022-0372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,00
21022-0373	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	5,00
21022-0403	Štukaňa pre bleskozvodné svorky, pod izoláciu	5,00
21022-0022	Vedenie uzemňovacieho v zemi FežN D 8-10mm, vrátane svoriek	5,00
21022-0361	Týč zemizačn. ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	10,00
46020-0143	Káblové rhyhy šírky 35, hĺbky 60, zmintra tr 3	10,00
46056-0143	Káblové rhyhy šírky 35, hĺbky 60, zmintra tr 3	10,00
22178-0051-PM	Priérážka pre podružný materiál	5,00
22178-0052-SM	Priérážka zo strážneho nosného materiálu	5,00
22178-0053-D	Doprava	5,00
22178-0054-P	Presuny	5,00
22178-0055-PV	Priérážne výkony	5,00
21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,00

21329-1001	Demontážne práce	5,00
D2	Elektroinštalácia	115,00
21080-0016	Vodič Cu uložený v rúrkach CYY 16	5,00
21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	20,00
21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	25,00
21081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	10,00
21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	5,00
21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	10,00
21001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36mm	5,00
21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	5,00
21011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	5,00
21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	5,00
21011-0044	Spínač zapustený IP20, žaluziový	5,00
921 AN02637	Spínač 3558-A88340 s klytom a rámkom	5,00
21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	10,00
21011-1031	Zásuvka nást. zapust x-násobná 10/16A - 250V, podlahová	15,00
21020-1-r03	Montáž trojkruhovej lišty	100,00
21020-0059	Svetidlo LED nástenné resp. stropné IP20-54	115,00
21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	5,00
21001-0321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	5,00
21019-0003	Montáž rozvodnice do 100kg	20,00
21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	5,00
21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	5,00
21010-0258	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklpkou do 5x4	5,00
21029-0751	Zapojenie ventilátora do 1,5kW	5,00
97403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	10,00
97403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	10,00
97403-1123	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 10 cm	5,00
22178-0051-PM	Prirážka pre podružný materiál	10,00
22178-0052-SM	Prirážka zo stratiného nosného materiálu	5,00
22178-0053-D	Doprava	10,00
22178-0054-P	Presuny	5,00
22178-0055-PV	Prídružné výkony	5,00
21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	10,00
21329-1001	Demontážne práce	10,00
D3	M22-OZV	50,00
22044-0501	Montáž zostavy zosilovača, mikrofónov a reproduktorov	50,00
ZZ	Zabezpečovacie zariadenie	30,00
EZS	Elektronický zabezpečovací systém	15,00
M	Práce a dodávky M	15,00
22-M6	Elektronický zabezpečovací systém D+M	15,00
220/EZS	Zabezpečovacia ústredňa deliteľná s komunikátorom.	15,00
220/EZS.1	Zbernicová klávesnica s čítačkou RFID	10,00
220/EZS.2	Detektor PIR, do 15m	15,00
220/EZS.3	Magnetický kontakt na dvere	10,00
220/EZS.4	Akumulátor 12 V - 2.2 Ah - rozmer 178 x 35 x 61 mm, hmotnosť 1 kg / ks	5,00
220/EZS.5	Síreňa exterierová so záložným zdrojom	10,00
220/EZS.6	RFID prístupový čip / karta	5,00
220/EZS.7	VEZFI 8x0,5mm Signálny kábel pre EZS	10,00
220/EZS.8	Napájanie230V CYKY-J 3x2,5	5,00
220/EZS.9	Montážna krabica UK68	5,00
220/EZS.10	Sadra	5,00
220/EZS.11	Blížšie nešpecifikovaný materiál (matice, šróuby a iné)	5,00
220/EZS.12	Vypracovanie bezpečnostnej smernice	10,00
220/EZS.13	Doprava materiálu	10,00
CCTV	Kamerový systém CCTV	30,00
M	Práce a dodávky M	30,00
22-M7	Kamerový systém CCTV D+M	30,00
220/CCTV	Doska montážna do zateplenia MDZ 300 KOPOS	10,00
220/CCTV.1	6MP dome kamera;Objektív: min 90stupnov IR 30m; 12VDC/POE; IP66;	30,00
220/CCTV.2	Montážny golier pre uloženie koncov káblov	10,00
220/CCTV.3	Passíve POE Injektor adaptérová súprava	5,00
220/CCTV.4	Napájacie trafo 12V 2A	10,00
220/CCTV.5	4K; Video káňdlov -16; HDD - 4; Nahrávanie 12MP; Ethernet RJ45;	15,00
220/CCTV.6	SATA III 3.5" HDD 4TB, 5900RPM, 64MB cache (pracovné vyťaženie 24/7)	10,00
220/CCTV.7	Napájací kábel CYKY-J 3x2,5	5,00
220/CCTV.8	Montážna krabica UK68	5,00
220/CCTV.9	Sadra	5,00
220/CCTV.10	Dvojzásuvka s prepäťovou ochranou 230V 16A	5,00
220/CCTV.11	Panel napájací do 19" racku 1U s vypínačom 9x zásuvka	10,00
220/CCTV.12	Kábel dátový pevný FTP cat.5e - exteriér (alebo závesný)	10,00
220/CCTV.13	Switch LAN port: 16x RJ45 10/100/1000 mbps	10,00
220/CCTV.14	Rack skriňa 19" jednodielná 15U/600mm, plechové dvere	10,00
220/CCTV.15	Polica s perforáciou 1U/350mm	5,00
220/CCTV.16	Montážna sada do racku M6, balenie 20ks, (skrutky, matice, podložky)	5,00
220/CCTV.17	Patch kábel cat5e 1,5m	5,00
220/CCTV.18	UPS - záložný zdroj - UPS 950VA, 230V	10,00

