


Harmonogram stavby "Prestavba bývalej školy na budovu EXPO, časť B"

Pracovná doba bude od 7:00 do 18:00 v pracovných dňoch a dňoch pracovného voľna.
Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa práca na stavenisku nebude vykonávať.
Zobrazenie kritickej cesty.



133201101	Výkop šachty hĺbina 3 do 100 m3-osadenie DZ	5,00
133201109	Pripjatok k cenam za lepiivosť horniny	5,00
162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	50,00
162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 , do 100 m3, pripiatok k cene za každých ďalších a začínajých 1000 m	15,00
171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³ , prebyť. výkop	30,00
181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	15,00
182001111	Plôšná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovíně alebo na svahu do 1:5	35,00
182313101	Vyplnenie otvoru v tvárniciah omicou	25,00
2	Zakladanie	10,00
271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku - DZ	5,00
275321111	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr.C 8/10 - Dz	10,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5,00
338171122	Osadenie stlpika oceového do výšky 2.60m so zabetónovaním - DZ	5,00
5	Komunikácie	155,00
56423111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕňením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - A+E	60,00
56425111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕňením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm - D	25,00
564732111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63mm po zhut.hr. 150 mm - B+E	95,00
564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm - A	35,00
564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm - C	105,00
564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm - B	55,00
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 0-32mm - B	25,00
567114211.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm- D	45,00
567124215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm- C	90,00
573111115.S	Postrek asfaltový infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2.50 kg/m ² - A	20,00
577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm - A	65,00
577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm - A	80,00
584121111	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr.40 mm - E	140,00
596911142.S	Kladienie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	115,00
596911211	Kladienie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	125,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búrnie	150,00
914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stľpk,stlp,konzolu alebo objekt	25,00
915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	5,00
915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	5,00
915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípek nápisov, prechodov a pod.	10,00
915729111	Pripjatok za reflexnú úpravu balotnovú stopčiar, zebier, tieňov, šípek nápisov, prechodov a pod.	5,00
915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pručky	10,00
915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	5,00
917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	60,00
99	Presun hmôt HSV	50,00
998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (R22 2.3, R22 5.3) akékoľvek dlžky objektu	50,00
05	SO 05 - Sadové úpravy	55,00
I	I.Špecifikácia-terénne úpravy, prípravné a realizačné práce	50,00
SUP	Plôšná úprava terénu s urovaním povrchu s odstránením nerovností	50,00
SUP.1	Terénne úpravy (výkopy, presun hmôt)	50,00
SUP.2	Odstránenie nežiadúcich drevín a krov a ich spracovanie	20,00
SUP.3	Osadenie EKO brím obrubníka	30,00
SUP.4	Založenie záhona pre výsadbu	30,00
SUP.5	Založenie trávnika výsevom	35,00
SUP.6	Zhotovenie mlátového chodníka	30,00
SUP.7	Zhotovenie spevnených sploché-betónová dlažba hr.6cm, štrkové lôžko hr.30cm	25,00
SUP.8	Betonárske práce - palisádový obrubník	25,00
SUP.9	Výsadba rastlinného materiálu (Trvalky)	45,00
SUP.10	Výsadba rastlinného materiálu (Dreviny aj s prípadným ukotvením)	40,00
SUP.11	Modelácia terénu prebytkovou zeminou	35,00
SUP.12	Mulčovacie záhonov (mulčovacia kôra)	15,00
SUP.13	Štrkovanie záhonov (okrasy štří)	30,00
SUP.14	Doprava	40,00
II	II.Špecifikácia-rastlinný materiál	30,00

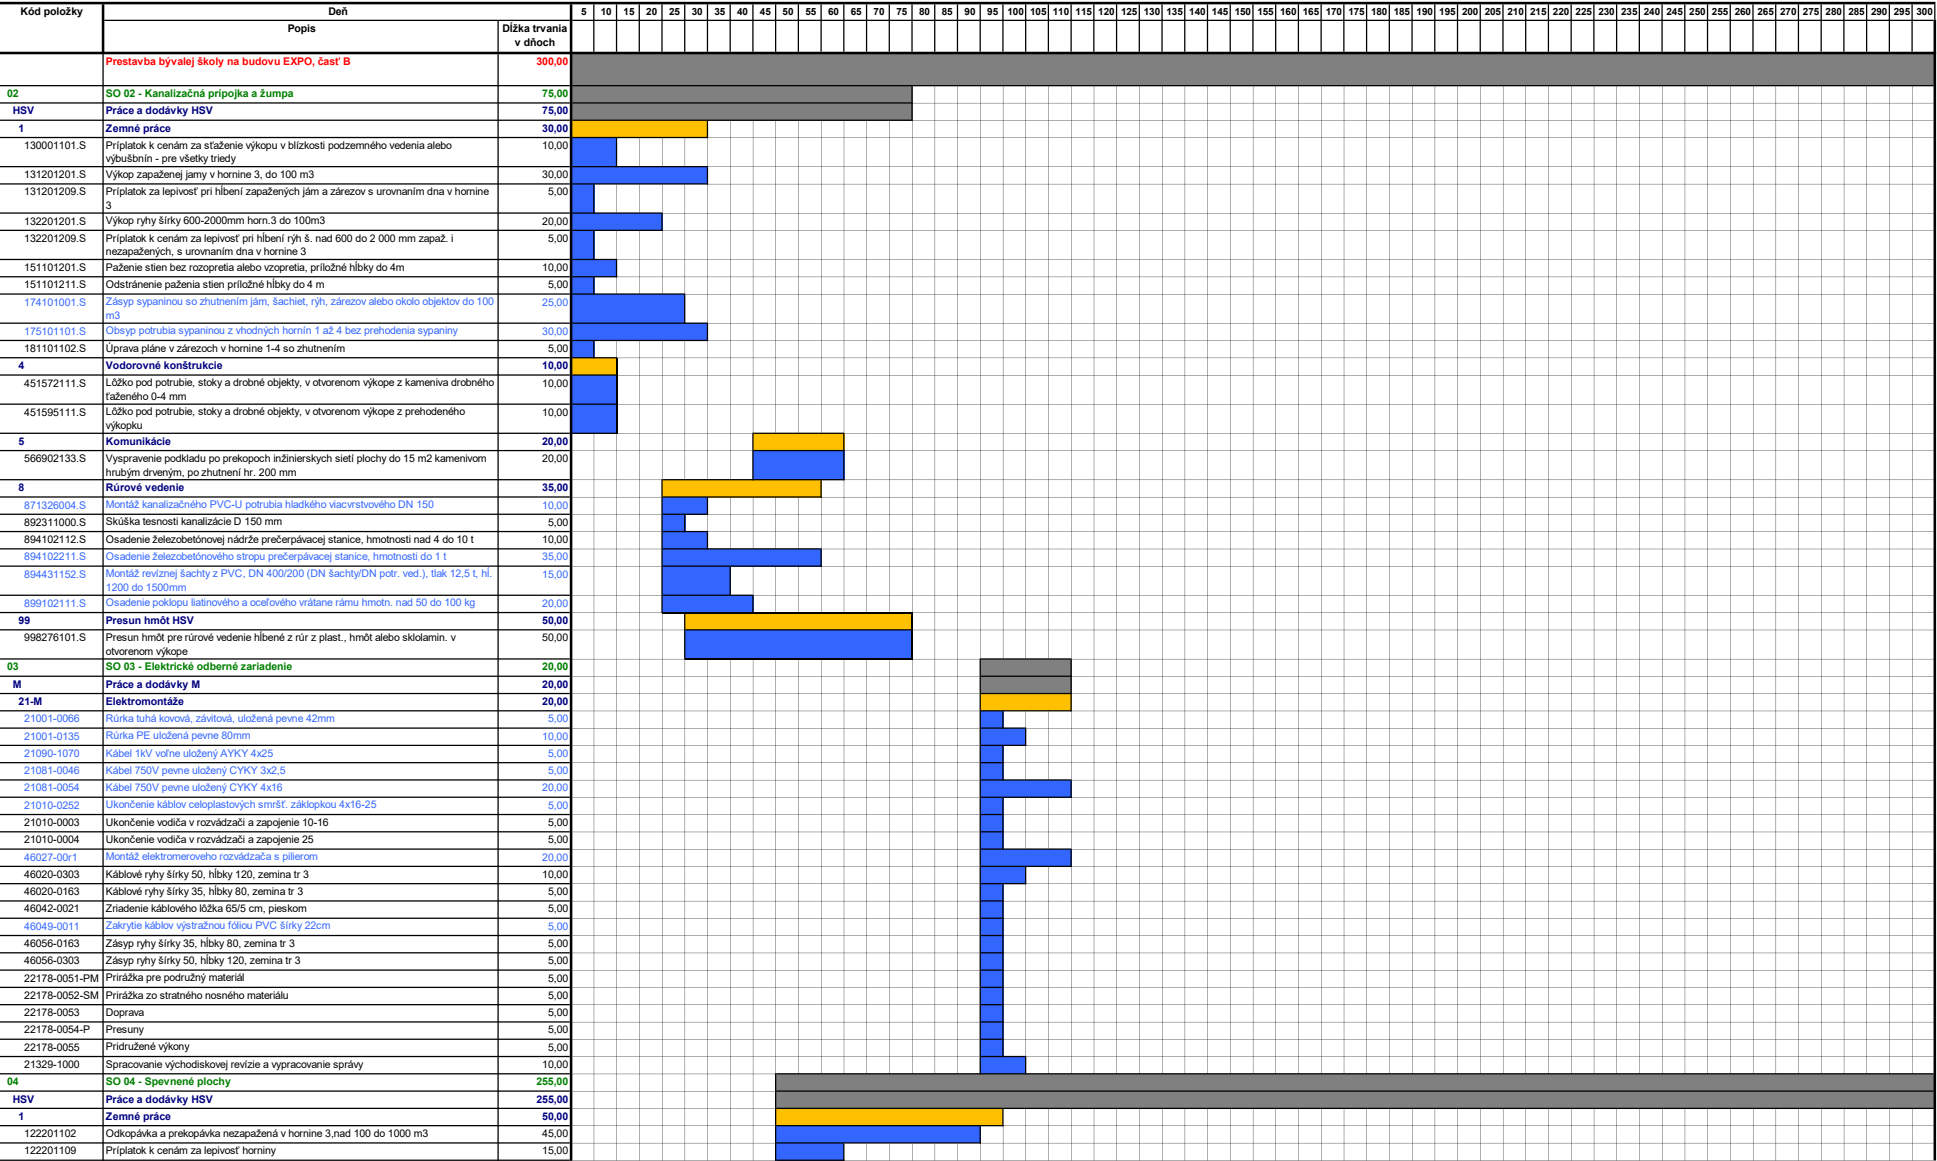
