# Rekonštrukcia, moderznizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

**Časový a vecný harmonogram**

| Identifik | Názov úlohy | Trvanie | Začiatok | Dokončenie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba SNG v Bratislave** | **1095 dni** | **Po 28.12.15** | **Str 26.12.18** |
| 2 | **Podpis ZoD** | **1 deň** | **Po 28.12.15** | **Po 28.12.15** |
| 3 | **Prevzatie staveniska** | **1 deň** | **Po 18.1.16** | **Po 18.1.16** |
| 4 | **Blok A ( 1 095 dní )** | **1095 dni** | **Po 28.12.15** | **Str 26.12.18** |
| 5 | **Premostenie** | **1067 dni** | **Po 25.1.16** | **Str 26.12.18** |
| 6 | **Hlavný objekt - architektúra** | **1067 dni** | **Po 25.1.16** | **Str 26.12.18** |
| 7 | Búracie práce | 383 dni | Po 15.2.16 | Pi 3.3.17 |
| 8 | Nový stav | 927 dni | Po 13.6.16 | Str 26.12.18 |
| 9 | Zdravotechnika | 695 dni | Po 3.10.16 | Ut 28.8.18 |
| 10 | Ústredné vykurovanie | 230 dni | Po 13.2.17 | So 30.9.17 |
| 11 | Vzduchotechnika | 535 dni | Po 7.11.16 | Str 25.4.18 |
| 12 | Chladenie | 350 dni | Ut 7.3.17 | Po 19.2.18 |
| 13 | Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody | 680 dni | Po 17.10.16 | Po 27.8.18 |
| 14 | Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody | 380 dni | Po 19.6.17 | Ut 3.7.18 |
| 15 | Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 340 dni | Po 2.10.17 | Št 6.9.18 |
| 16 | Poplachový systém narušenia - PSN | 330 dni | Po 2.10.17 | Po 27.8.18 |
| 17 | Hlasová signalizácia požiaru - PR | 355 dni | Po 6.11.17 | Pi 26.10.18 |
| 18 | Meranie a regulácia - MaR | 205 dni | Ut 3.4.18 | Str 24.10.18 |
| 19 | Príprava staveniska | 97 dni | Po 25.1.16 | So 30.4.16 |
| 20 | Komunikácie, spevnené plochy a chodníky | 120 dni | So 2.6.18 | So 29.9.18 |
| 21 | Dopravné značenie | 60 dni | Po 6.8.18 | Št 4.10.18 |
| 22 | Preložka trolejového vedenia | 61 dni | Po 7.5.18 | Pi 6.7.18 |
| 23 | Preložka napájacieho vedenia DP | 61 dni | Po 7.5.18 | Pi 6.7.18 |
| 24 | Preložka ovládacieho kábla DP | 61 dni | Po 7.5.18 | Pi 6.7.18 |
| 25 | Preložka káblového vedenia NN | 61 dni | Po 7.5.18 | Pi 6.7.18 |
| 26 | Preložka verejného osvetlenia | 61 dni | Po 7.5.18 | Pi 6.7.18 |
| 27 | **Blok B ( 974 dní )** | **974 dni** | **Po 28.12.15** | **Po 27.8.18** |
| 28 | **Vodné kasárne** | **944 dni** | **Str 27.1.16** | **Po 27.8.18** |
| 29 | **Hlavný objekt - architektúra** | **944 dni** | **Str 27.1.16** | **Po 27.8.18** |
| 30 | Búracie práce | 429 dni | Str 27.1.16 | Št 30.3.17 |
| 31 | Nový stav | 848 dni | Po 2.5.16 | Po 27.8.18 |
| 32 | Zdravotechnika | 605 dni | Št 1.9.16 | So 28.4.18 |
| 33 | Ústredné vykurovanie | 237 dni | Po 6.2.17 | So 30.9.17 |
| 34 | Kotoľňa | 160 dni | Ut 4.4.17 | Ne 10.9.17 |
| 35 | Plynofikácia kotolne | 55 dni | Po 29.5.17 | So 22.7.17 |
| 36 | Vzduchotechnika | 438 dni | Po 10.4.17 | Št 21.6.18 |
| 37 | Chladenie | 240 dni | Ut 1.8.17 | Str 28.3.18 |
| 38 | Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody | 330 dni | Po 15.5.17 | Po 9.4.18 |
| 39 | Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody | 190 dni | Po 5.6.17 | Po 11.12.17 |
| 40 | Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 150 dni | Ut 1.8.17 | Št 28.12.17 |
| 41 | Poplachový systém narušenia - PSN | 150 dni | Po 14.8.17 | Str 10.1.18 |
| 42 | Hlasová signalizácia požiaru - PR | 150 dni | Po 14.8.17 | Str 10.1.18 |
| 43 | Ozvučenie | 95 dni | Po 11.9.17 | Št 14.12.17 |
| 44 | Meranie a regulácia - MaR | 55 dni | Ut 1.8.17 | Ne 24.9.17 |
| 45 | **Nádvorie vodných kasární** | **295 dni** | **Po 6.11.17** | **Po 27.8.18** |
| 46 | Hlavný objekt - architektúra | 83 dni | Str 6.6.18 | Po 27.8.18 |
| 47 | Vodovod | 50 dni | Po 12.3.18 | Po 30.4.18 |
| 48 | Kanalizácia | 75 dni | Št 15.2.18 | Po 30.4.18 |
| 49 | Hong - Kongská ulička | 205 dni | Po 8.5.17 | Ut 28.11.17 |
| 50 | Plynová prípojka | 60 dni | Št 1.9.16 | Ne 30.10.16 |
| 51 | Vonkajšie rozvody VN | 63 dni | Po 7.11.16 | Ne 8.1.17 |
| 52 | Prečerpacia šachta ZT | 73 dni | Po 20.2.17 | Str 3.5.17 |
| 53 | Prečerpávacia šachta | 68 dni | Po 13.2.17 | Pi 21.4.17 |
| 54 | Distribučná trafostanica TS č. 440 | 120 dni | Po 13.2.17 | Po 12.6.17 |
| 55 | **Blok C ( 1 074 dní )** | **1074 dni** | **Po 28.12.15** | **Str 5.12.18** |
| 56 | **Administratívna budova** | **1044 dni** | **Str 27.1.16** | **Str 5.12.18** |
| 57 | **Hlavný objekt - architektúra** | **1044 dni** | **Str 27.1.16** | **Str 5.12.18** |
| 58 | Búracie práce | 402 dni | Str 27.1.16 | Pi 3.3.17 |
| 59 | Nový stav | 918 dni | Str 1.6.16 | Str 5.12.18 |
| 60 | Zdravotechnika | 281 dni | Po 24.10.16 | Po 31.7.17 |
| 61 | Ústredné vykurovanie | 230 dni | Str 1.2.17 | Po 18.9.17 |
| 62 | Demontáž vykurovania | 178 dni | Po 6.6.16 | Str 30.11.16 |
| 63 | Vzduchotechnika | 265 dni | Po 9.1.17 | So 30.9.17 |
| 64 | Chladenie | 235 dni | Str 22.3.17 | So 11.11.17 |
| 65 | Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody | 485 dni | Str 1.2.17 | Št 31.5.18 |
| 66 | Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody | 150 dni | Str 1.3.17 | Pi 28.7.17 |
| 67 | Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 150 dni | Ut 2.5.17 | Št 28.9.17 |
| 68 | Poplachový systém narušenia - PSN | 150 dni | Ut 2.5.17 | Št 28.9.17 |
| 69 | Hlasová signalizácia požiaru - PR | 150 dni | Ut 2.5.17 | Št 28.9.17 |
| 70 | Meranie a regulácia - MaR | 89 dni | Ut 4.7.17 | So 30.9.17 |
| 71 | Dopravné značenie - garáže | 68 dni | So 7.4.18 | Str 13.6.18 |
| 72 | **Nové expozície** | **1025 dni** | **Po 15.2.16** | **Str 5.12.18** |

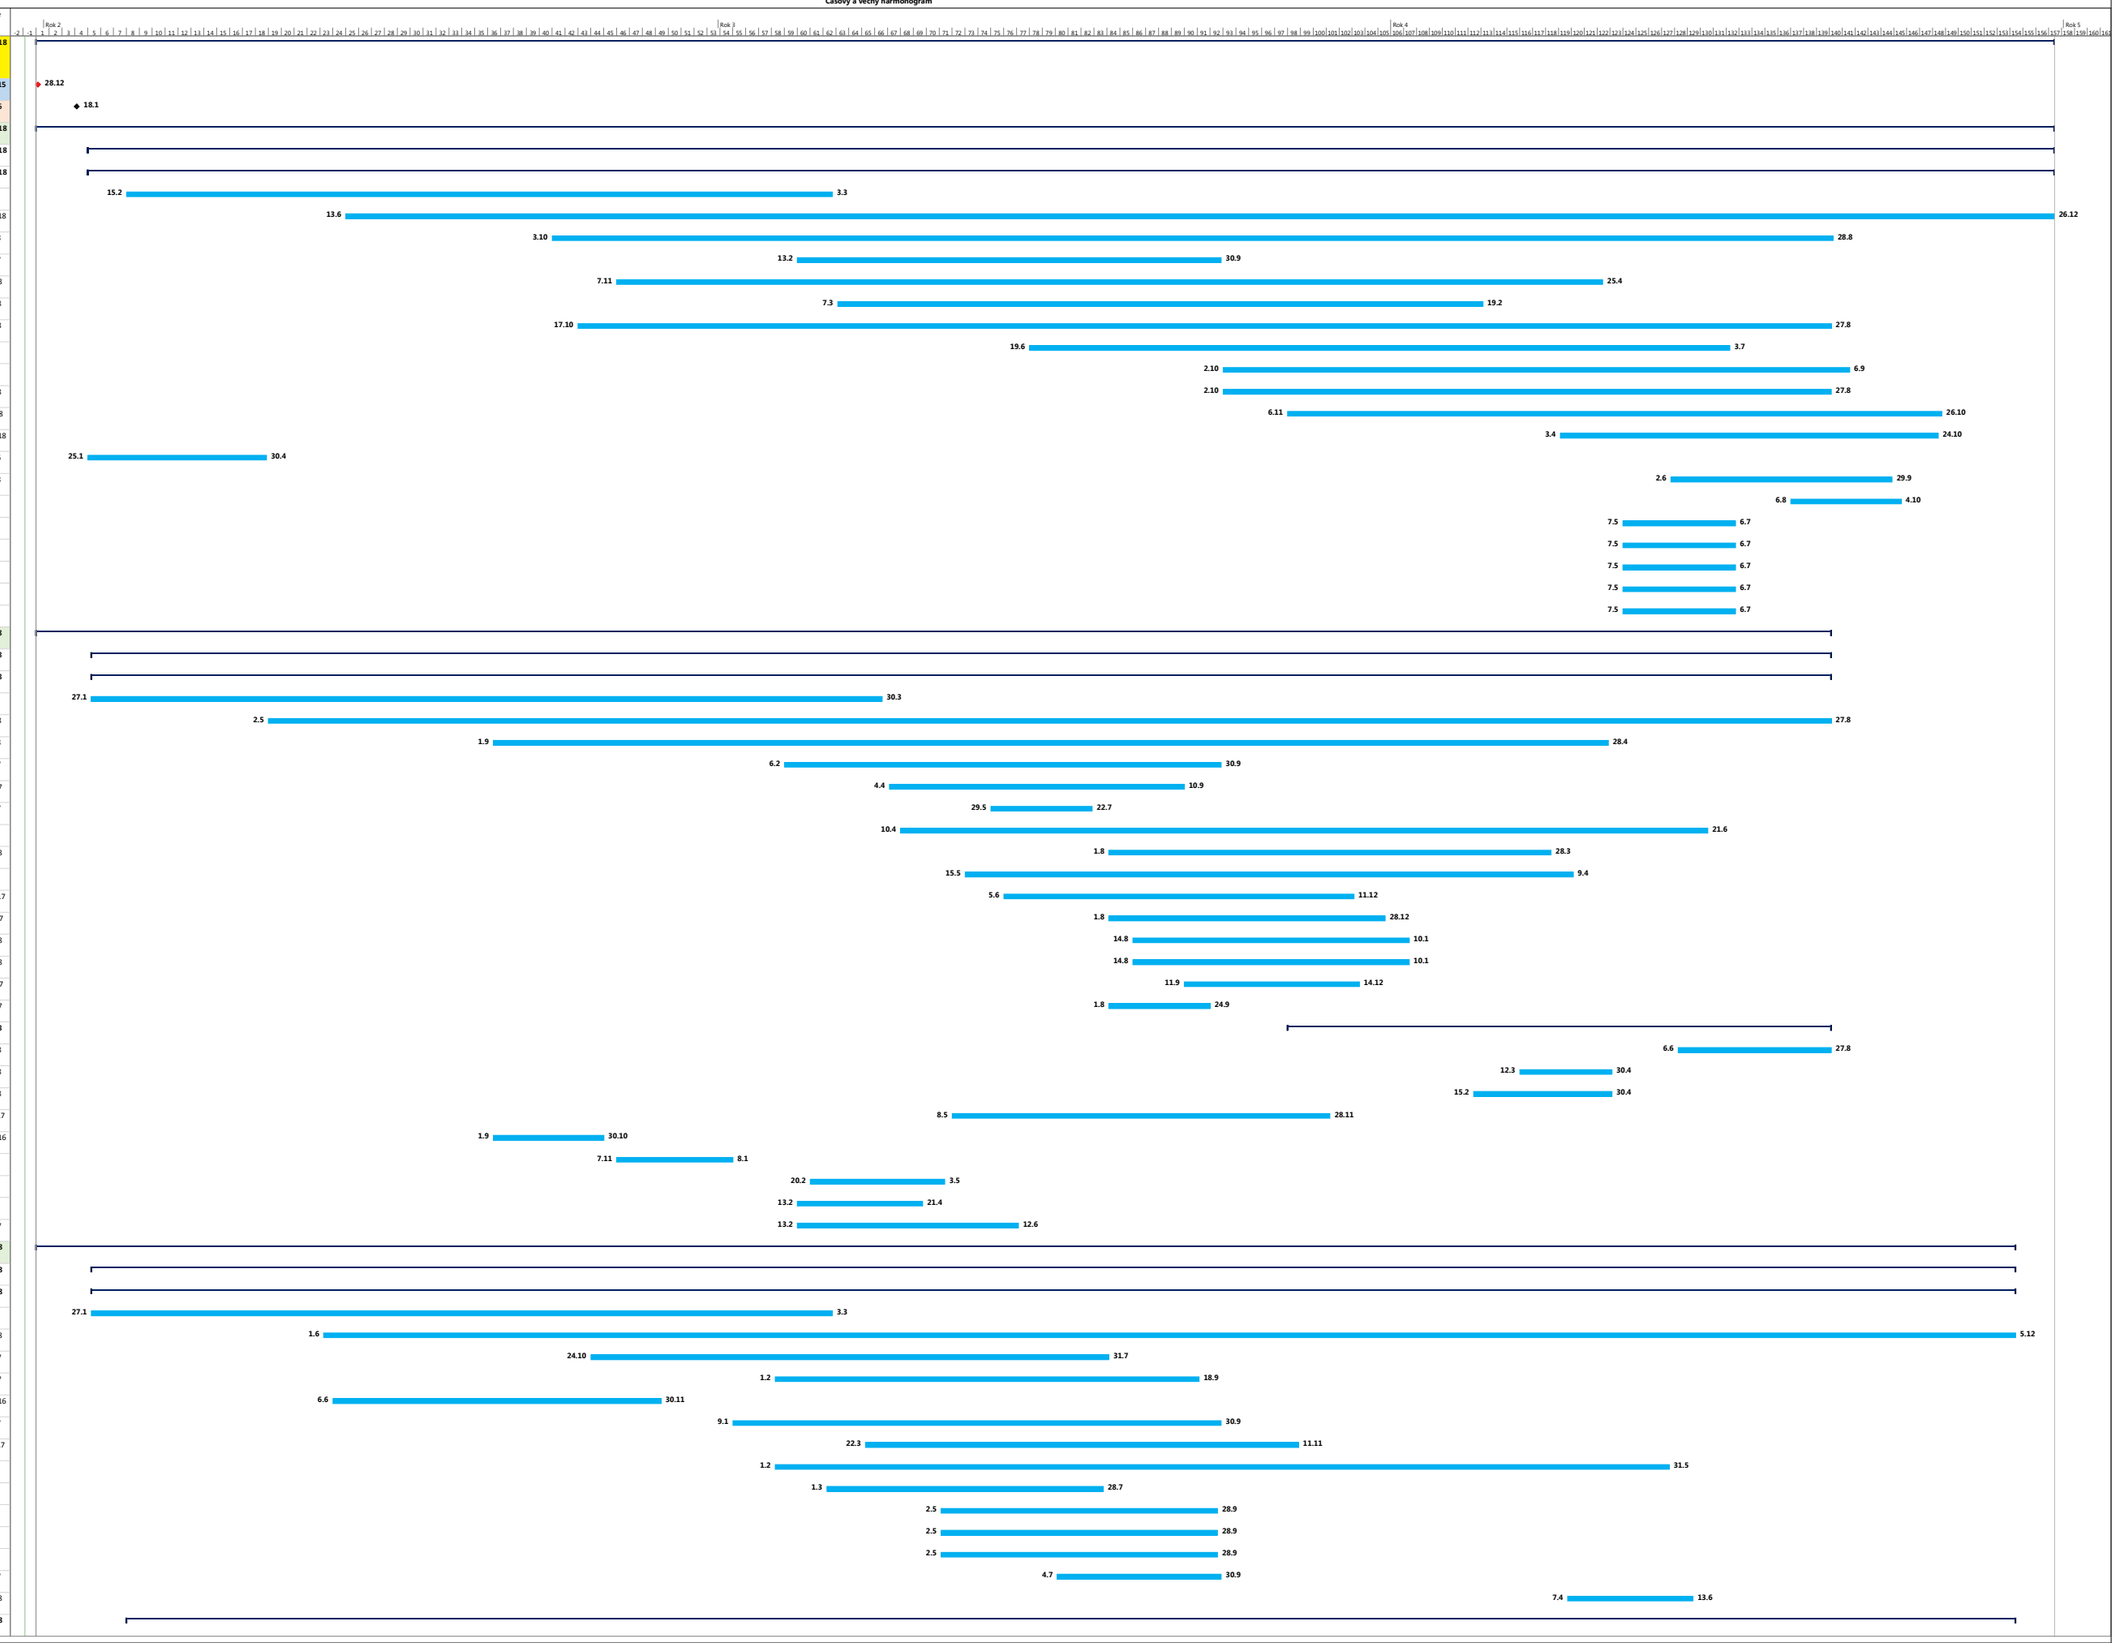


V Bratislave 28.12.2015

Úloha | Rozdelíť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh

# Rekonštrukcia, moderznizácia a dostavba areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave

## Časový a vecný harmonogram

| Identifik | Názov úlohy | Trvanie | Začiatok | Dokončenie |
|---|---|---|---|---|
| 73 | **Hlavný objekt - architektúra** | **1025 dni** | **Po 15.2.16** | **Str 5.12.18** |
| 74 | Búracie práce | 260 dni | Po 15.2.16 | Po 31.10.16 |
| 75 | Nový stav | 948 dni | Po 2.5.16 | Str 5.12.18 |
| 76 | Zdravotechnika | 331 dni | Po 5.9.16 | Ut 1.8.17 |
| 77 | Ústredné vykurovanie | 150 dni | Ut 2.5.17 | Št 28.9.17 |
| 78 | Vzduchotechnika | 210 dni | Po 1.5.17 | Ne 26.11.17 |
| 79 | Chladenie | 175 dni | Po 5.6.17 | Ne 26.11.17 |
| 80 | Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody | 380 dni | Ut 3.1.17 | Str 17.1.18 |
| 81 | Ústredné a vnútorné slaboprúdové rozvody | 290 dni | Po 6.2.17 | Str 22.11.17 |
| 82 | Elektrická požiarna signalizácia - EPS | 135 dni | So 9.9.17 | Ne 21.1.18 |
| 83 | Poplachový sytém narušenia - PSN | 125 dni | Pi 6.10.17 | Str 7.2.18 |
| 84 | Hlasová signalizácia požiaru - PR | 136 dni | Št 14.9.17 | So 27.1.18 |
| 85 | Meranie a regulácia - MaR | 55 dni | Št 16.11.17 | Ut 9.1.18 |
| 86 | **Nový depozitár** | **948 dni** | **Po 2.5.16** | **Str 5.12.18** |
| 87 | Hlavný objekt - architektúra | 899 dni | Po 20.6.16 | Str 5.12.18 |
| 88 | Ústredné vykurovanie | 181 dni | Po 3.4.17 | So 30.9.17 |
| 89 | Plynofikácia kotolne | 118 dni | Po 5.6.17 | So 30.9.17 |
| 90 | Kotoľňa | 118 dni | Po 5.6.17 | So 30.9.17 |
| 91 | Vzduchotechnika | 464 dni | Po 24.4.17 | Ut 31.7.18 |
| 92 | Chladenie | 297 dni | Po 8.1.18 | Str 31.10.18 |
| 93 | Bleskozvod a uzemnenie | 156 dni | Po 29.5.17 | Ut 31.10.17 |
| 94 | Meranie a regulácia - MaR | 321 dni | Po 14.8.17 | So 30.6.18 |
| 95 | Stabilné hasiace zariadenie - SHZ | 359 dni | Ut 6.6.17 | Str 30.5.18 |
| 96 | Ochrana stavebnej jamy + čerpanie podzemnej vody | 115 dni | Po 2.5.16 | Str 24.8.16 |
| 97 | Komunikácie, spevnené plochy a chodníky | 150 dni | Št 1.3.18 | So 28.7.18 |
| 98 | Dopravné značenie | 68 dni | Po 23.7.18 | Pi 28.9.18 |
| 99 | Kanalizačná prípojka | 58 dni | So 10.9.16 | Ne 6.11.16 |
| 100 | Čerpacia studňa ČS.3 | 60 dni | Po 2.5.16 | Št 30.6.16 |
| 101 | Vsakovacia studňa ČS.2 | 60 dni | Po 2.5.16 | Št 30.6.16 |
| 102 | Čerpacia studňa ČS.1 | 45 dni | Po 2.5.16 | Str 15.6.16 |
| 103 | **Čerpacie studne** | **53 dni** | **Po 2.5.16** | **Št 23.6.16** |
| 104 | Hlavný objekt - stavebná časť | 50 dni | Po 2.5.16 | Po 20.6.16 |
| 105 | Elektroinštalácia | 20 dni | Str 25.5.16 | Po 13.6.16 |
| 106 | Meranie a regulácia - MaR | 30 dni | Str 25.5.16 | Št 23.6.16 |
| 107 | Vysunutá trafostanica | 70 dni | Št 18.5.17 | Str 26.7.17 |
| 108 | Náhradný zdroj elektro | 68 dni | Po 7.5.18 | Pi 13.7.18 |
| 109 | Centrálny riadiaci systém | 140 dni | Po 19.2.18 | Ne 8.7.18 |
| 110 | Audio - video | 208 dni | Po 5.2.18 | Pi 31.8.18 |
| 111 | Zdroj chladu | 146 dni | Po 5.2.18 | So 30.6.18 |
| 112 | **Dodatok č.1** | **800 dni** | **Po 2.5.16** | **Ut 10.7.18** |
| 113 | Blok A, B, C - architektúra | 800 dni | Po 2.5.16 | Ut 10.7.18 |
| 114 | VZT v Esterházyho paláci | 60 dni | Ne 5.2.17 | Str 5.4.17 |
| 115 | **Odovzdanie diela** | **1 deň** | **Str 26.12.18** | **Str 26.12.18** |

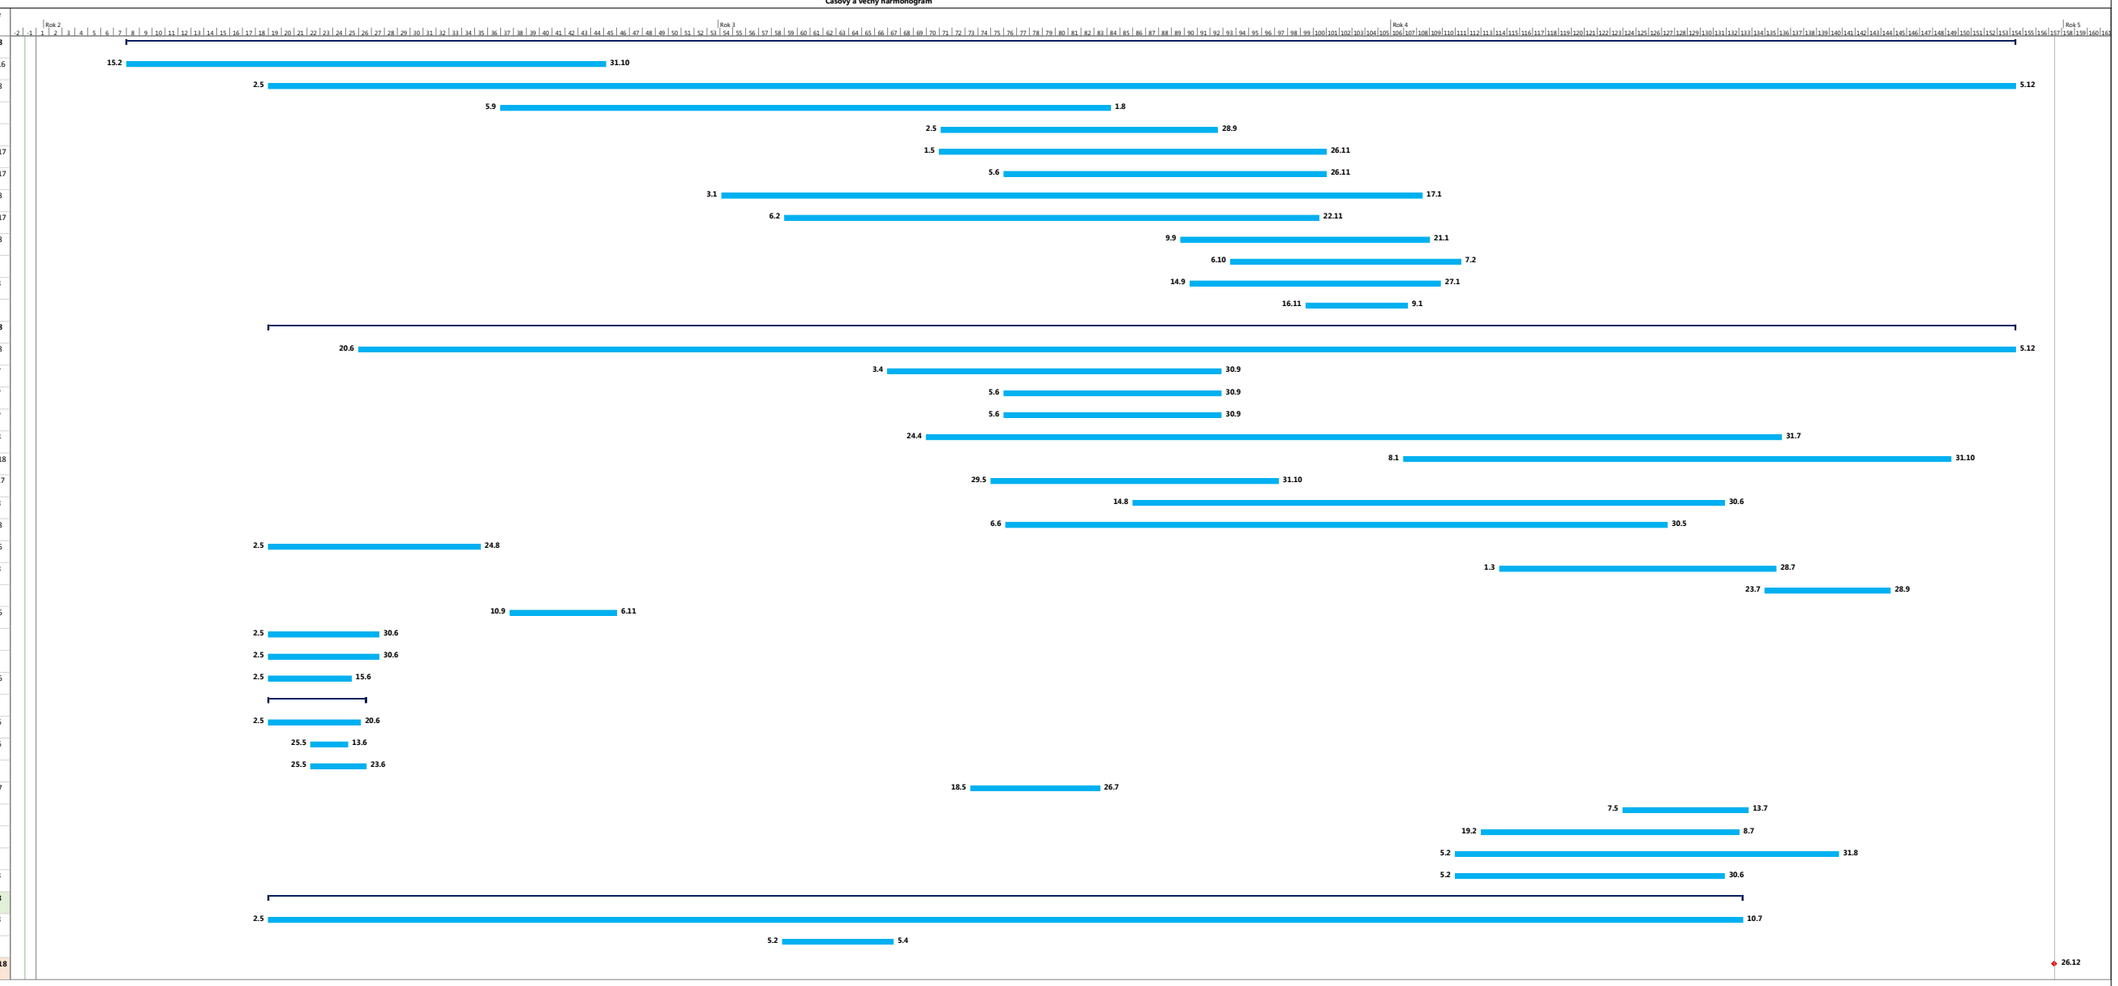


V Bratislave 28.12.2015

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh
