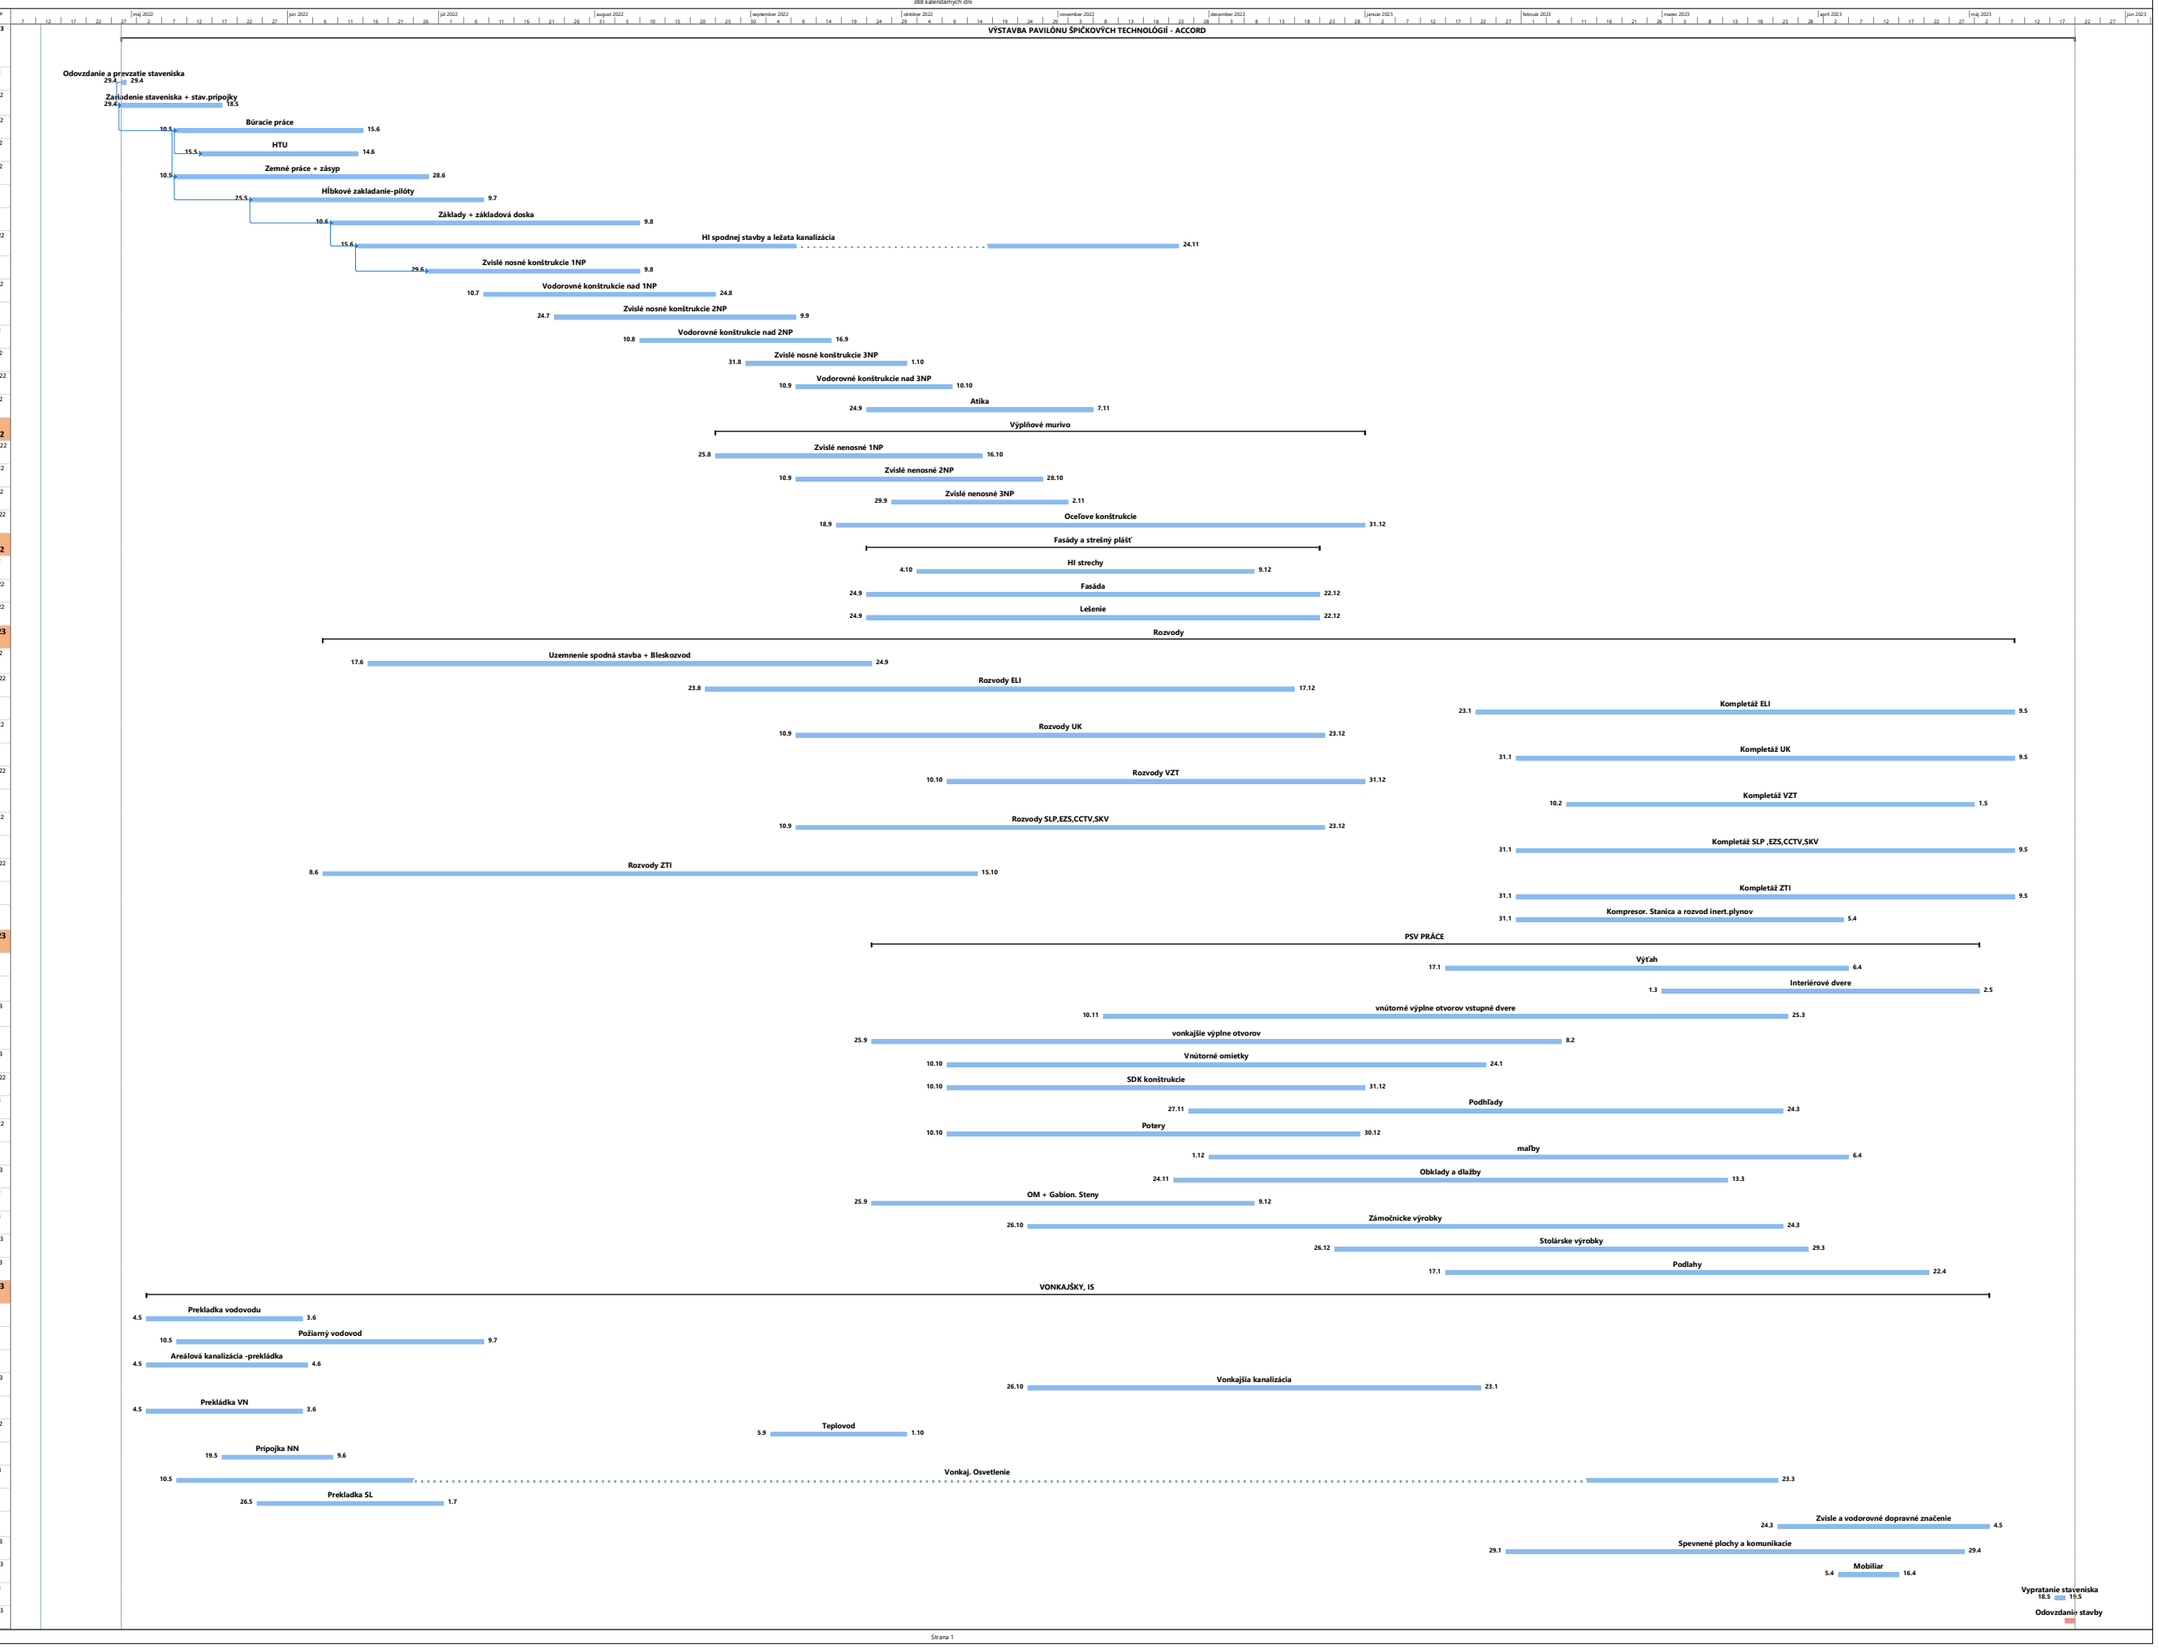Identifik	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	**VÝSTAVBA PAVILÓNU ŠPIČKOVÝCH TECHNOLÓGIÍ - ACCORD**	**388 dni**	**Pi 29.4.22**	**Ne 21.5.23**
2	Odovzdanie a prevzatie staveniska	1 deň	Pi 29.4.22	Pi 29.4.22
3	Zariadenie staveniska + stav.prípojky	20 dni	Pi 29.4.22	Str 18.5.22
4	Búracie práce	37 dni	Ut 10.5.22	Str 15.6.22
5	HTU	31 dni	Ne 15.5.22	Ut 14.6.22
6	Zemné práce + zásyp	50 dni	Ut 10.5.22	Ut 28.6.22
7	Hĺbkové zakladanie-piloty	46 dni	Str 25.5.22	So 9.7.22
8	Základy + základová doska	61 dni	Pi 10.6.22	Ut 9.8.22
9	HI spodnej stavby a ležata kanalizácia	125 dni	Str 15.6.22	Št 24.11.22
10	Zvislé nosné konštrukcie 1NP	42 dni	Str 29.6.22	Ut 9.8.22
11	Vodorovné konštrukcie nad 1NP	46 dni	Ne 10.7.22	Str 24.8.22
12	Zvislé nosné konštrukcie 2NP	48 dni	Ne 24.7.22	Pi 9.9.22
13	Vodorovné konštrukcie nad 2NP	38 dni	Str 10.8.22	Pi 16.9.22
14	Zvislé nosné konštrukcie 3NP	32 dni	Str 31.8.22	So 1.10.22
15	Vodorovné konštrukcie nad 3NP	31 dni	So 10.9.22	Po 10.10.22
16	Atika	45 dni	So 24.9.22	Po 7.11.22
17	**Výplňové murivo**	**129 dni**	**Št 25.8.22**	**So 31.12.22**
18	Zvislé nenosné 1NP	53 dni	Št 25.8.22	Ne 16.10.22
19	Zvislé nenosné 2NP	49 dni	So 10.9.22	Pi 28.10.22
20	Zvislé nenosné 3NP	35 dni	Št 29.9.22	Str 2.11.22
21	Oceľove konštrukcie	105 dni	Ne 18.9.22	So 31.12.22
22	**Fasády a strešný plášť**	**90 dni**	**So 24.9.22**	**Št 22.12.22**
23	HI strechy	67 dni	Ut 4.10.22	Pi 9.12.22
24	Fasáda	90 dni	So 24.9.22	Št 22.12.22
25	Lešenie	90 dni	So 24.9.22	Št 22.12.22
26	**Rozvody**	**336 dni**	**Str 8.6.22**	**Ut 9.5.23**
27	Uzemnenie spodná stavba + Bleskozvod	100 dni	Pi 17.6.22	So 24.9.22
28	Rozvody ELI	117 dni	Ut 23.8.22	So 17.12.22
29	Kompletáž ELI	107 dni	Po 23.1.23	Ut 9.5.23
30	Rozvody UK	105 dni	So 10.9.22	Pi 23.12.22
31	Kompletáž UK	99 dni	Ut 31.1.23	Ut 9.5.23
32	Rozvody VZT	83 dni	Po 10.10.22	So 31.12.22
33	Kompletáž VZT	81 dni	Pi 10.2.23	Po 1.5.23
34	Rozvody SLP,EZS,CCTV,SKV	105 dni	So 10.9.22	Pi 23.12.22
35	Kompletáž SLP ,EZS,CCTV,SKV	99 dni	Ut 31.1.23	Ut 9.5.23
36	Rozvody ZTI	130 dni	Str 8.6.22	So 15.10.22
37	Kompletáž ZTI	99 dni	Ut 31.1.23	Ut 9.5.23
38	Kompresor. Stanica a rozvod inert.plynov	65 dni	Ut 31.1.23	Str 5.4.23
39	**PSV PRÁCE**	**220 dni**	**Ne 25.9.22**	**Ut 2.5.23**
40	Výťah	80 dni	Ut 17.1.23	Št 6.4.23
41	Interiérové dvere	63 dni	Str 1.3.23	Ut 2.5.23
42	vnútorné výplne otvorov vstupné dvere	136 dni	Št 10.11.22	So 25.3.23
43	vonkajšie výplne otvorov	137 dni	Ne 25.9.22	Str 8.2.23
44	Vnútorné omietky	107 dni	Po 10.10.22	Ut 24.1.23
45	SDK konštrukcie	83 dni	Po 10.10.22	So 31.12.22
46	Podhľady	118 dni	Ne 27.11.22	Pi 24.3.23
47	Potery	82 dni	Po 10.10.22	Pi 30.12.22
48	maľby	127 dni	Št 1.12.22	Št 6.4.23
49	Obklady a dlažby	110 dni	Št 24.11.22	Po 13.3.23
50	OM + Gabion. Steny	76 dni	Ne 25.9.22	Pi 9.12.22
51	Zámočnícke výrobky	150 dni	Str 26.10.22	Pi 24.3.23
52	Stolárske výrobky	94 dni	Po 26.12.22	Str 29.3.23
53	Podlahy	96 dni	Ut 17.1.23	So 22.4.23
54	**VONKAJŠKY, IS**	**366 dni**	**Str 4.5.22**	**Št 4.5.23**
55	Prekladka vodovodu	31 dni	Str 4.5.22	Pi 3.6.22
56	Požiarný vodovod	61 dni	Ut 10.5.22	So 9.7.22
57	Areálová kanalizácia -prekládka	32 dni	Str 4.5.22	So 4.6.22
58	Vonkajšia kanalizácia	90 dni	Str 26.10.22	Po 23.1.23
59	Prekládka VN	31 dni	Str 4.5.22	Pi 3.6.22
60	Teplovod	27 dni	Po 5.9.22	So 1.10.22
61	Prípojka NN	22 dni	Št 19.5.22	Št 9.6.22
62	Vonkaj. Osvetlenie	85 dni	Ut 10.5.22	Št 23.3.23
63	Prekladka SL	37 dni	Št 26.5.22	Pi 1.7.22
64	Zvisle a vodorovné dopravné značenie	42 dni	Pi 24.3.23	Št 4.5.23
65	Spevnené plochy a komunikacie	91 dni	Ne 29.1.23	So 29.4.23
66	Mobiliar	12 dni	Str 5.4.23	Ne 16.4.23
67	Vypratanie staveniska	2 dni	Št 18.5.23	Pi 19.5.23
68	Odovzdanie stavby	2 dni	So 20.5.23	Ne 21.5.23
