ntifikátor	Změna postupu prác	Název úkolu	MJ	Nh/MJ	Množstvo
1		**DSS ANIMA**		**0**	**0**
2		**Preberanie staveniska a prípravné práce**		0	0
3		**Zateplenie fasády**		**0**	**0**
4		Montáž lešenia	m2	0,15	297,6
5		Demontáž zábradlia, rebrikov, lemovaní a oplechovania	súb	6	1
6		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	0,08	29,42
7		Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	0,32	235,26
8		Kontaktný zateplovací systém a vonkajšia omietka	m2	1,67	265,69
9		Oplechovanie parapetov	bm	1,5	21,6
10		Montáž zábradlia	m	0,86	6,98
11		Výroba a montáž rebrikov	m	9,3	4,3
12		Montáž krycej mriežky	ks	0,27	2
13		Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,66	6,1
14		Montáž hromozvodu	súb	16	1
15		Demontáž lešenia	m2	0,1	297,6
16		**Zateplenie strechy**		**0**	**0**
17		Demontáž žľabov	m	0,06	59,2
18		Demontáž odpadových rúr	m	0,07	23,58
19		Demontáž krytiny	m2	0,1	300,22
20		Demontáž latovania striech	m2	0,06	300,22
21		Odvoz sutiny a vybúraných	t	1,29	4,66
22		Montáž tepelnej izolácie	m2	0,24	466
23		Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30st. fóliou zosilnením spojov	m2	0,08	225,58
24		Záklop stropov ríms z dosiek OSB	m2	0,22	321,85
25		Debnenie ríms z dosiek CETRIS	m2	0,21	36
26		Oddelovacia štruktúrovaná rohož	m2	0,14	299,39
27		Žľaby	m	0,89	60
28		Montáž krytiny vrátane lemovania, oplechovania a snehovej zábrany	m2	2,71	299,39
29		Zvodový systém	ks	4,8	5
30		Montáž bleskozvodu	súb	24	1
31		Odovzdanie diela		0	0

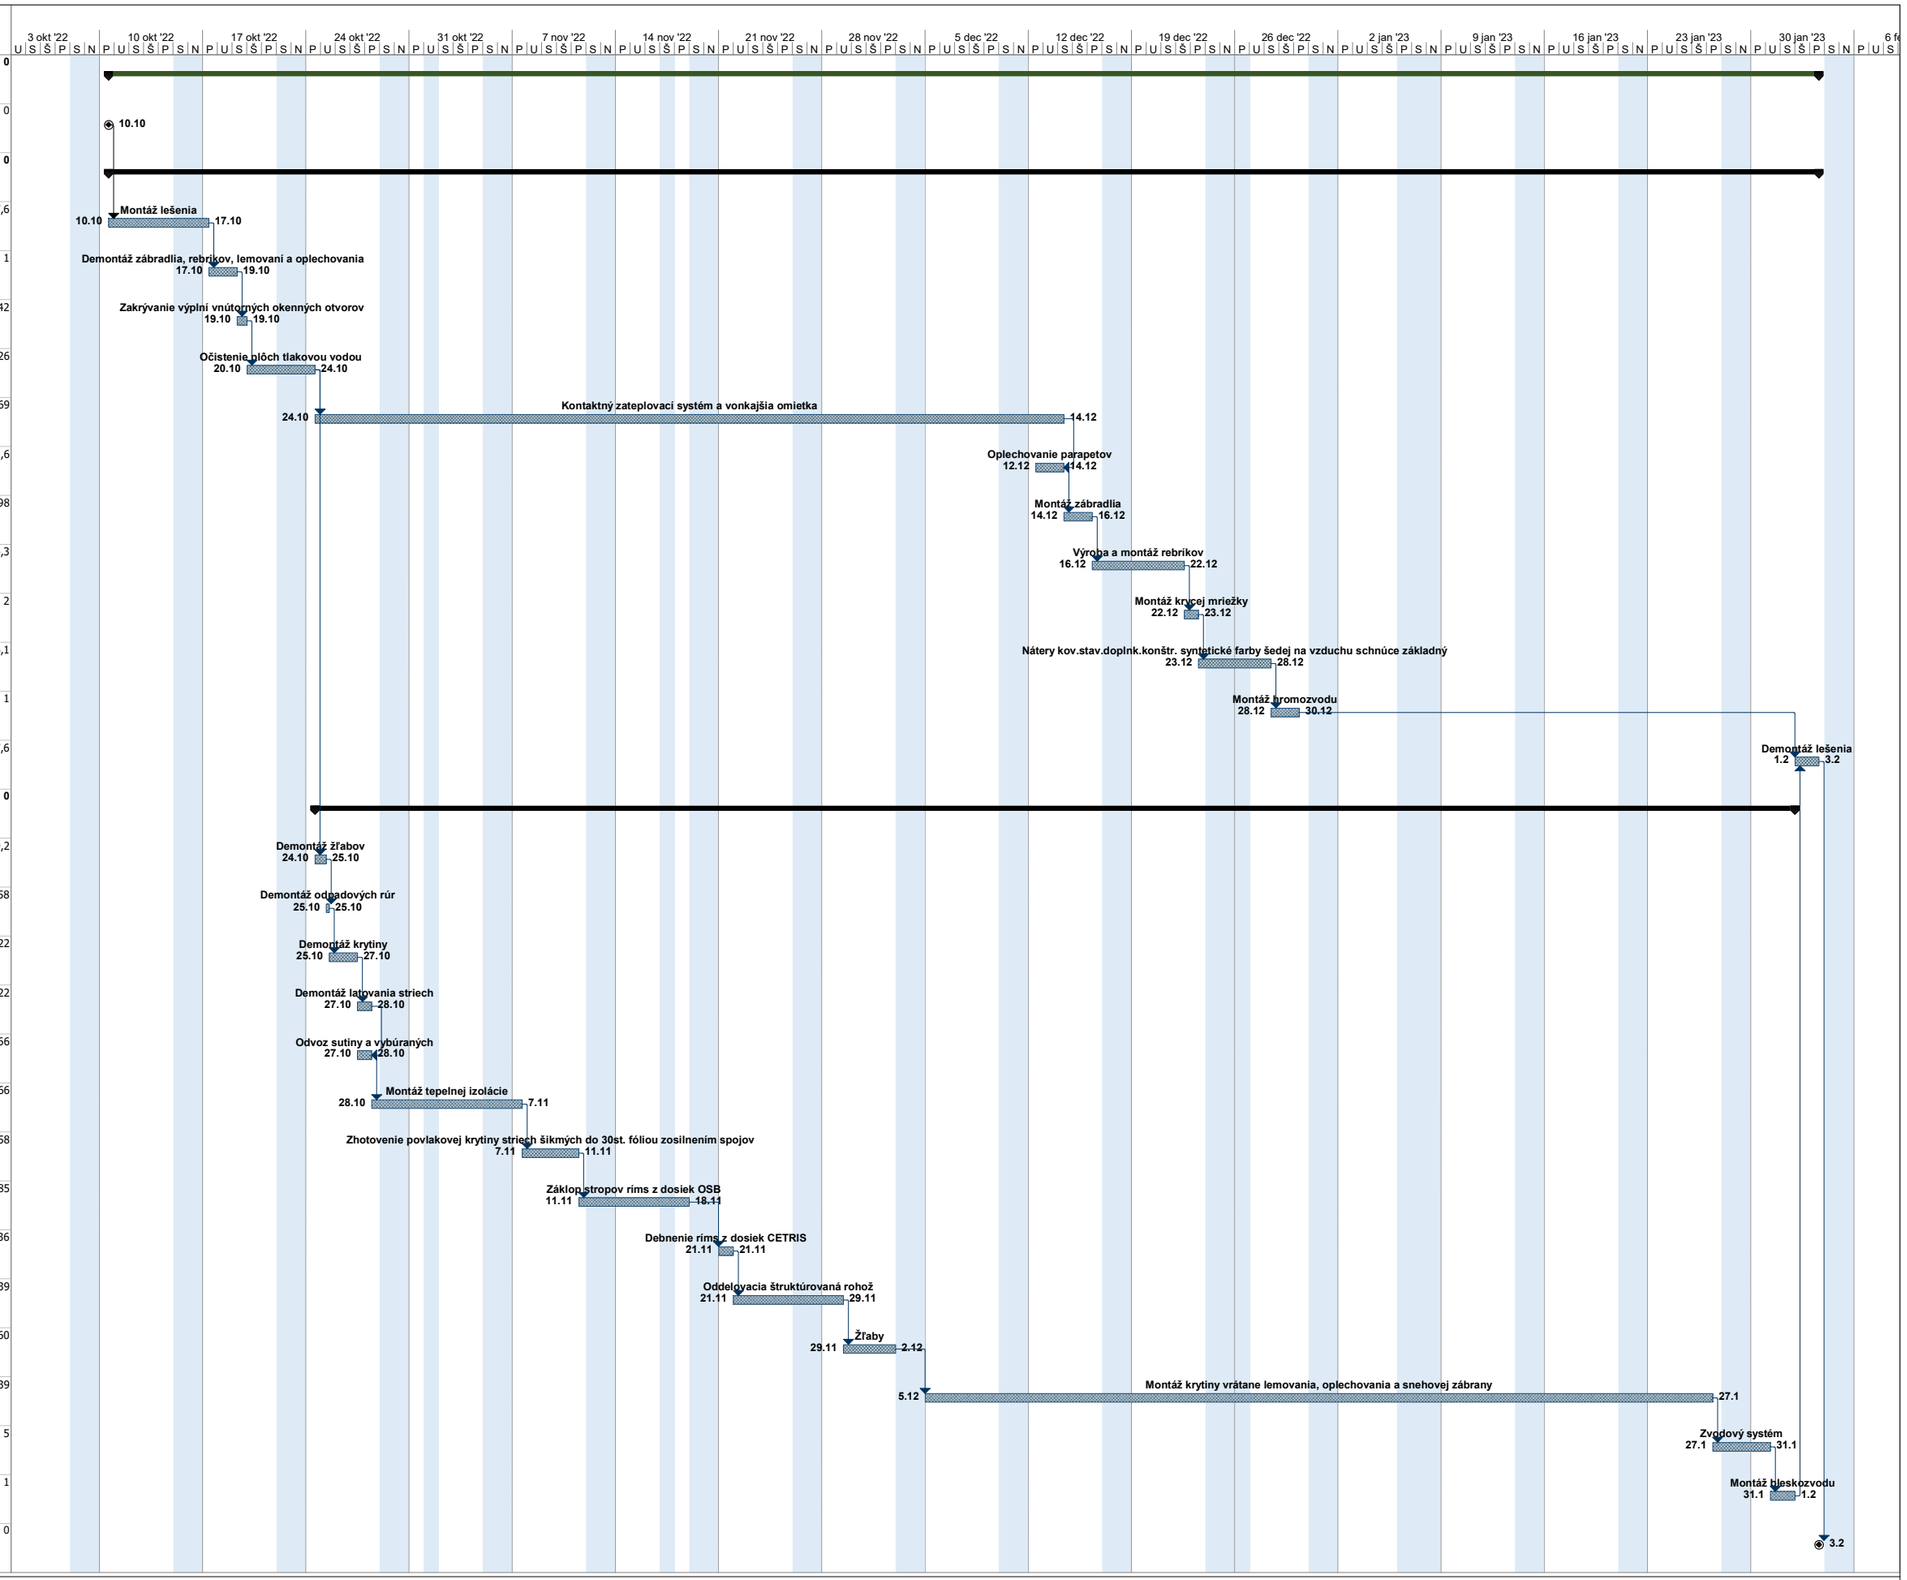

Projekt: DSS ANIMA
Datum: Str 14.9.22

Úkol	Souhrnný	Zahrnutý průběh	Souhrn projektu	Neaktivní úkol	Ruční úkol	Ruční souhrn		
Průběh	Zahrnutý úkol	Rozdělení	Seskupit podle souhrnu	Neaktivní milník	Pouze s dobou trvání	Pouze zahájení		
Milník	Zahrnutý milník	Vnější úkoly	Konečný termín	Neaktivní souhrn	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Pouze s datem dokončení		
