Číslo činnosti	Číslo úrovne činnosti	Názov úlohy	MJ	Náklad	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		**Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu - Plešivec**		**0**	**0 Sa 29.8.22**	**Pi 30.6.23**
2		Prevzatie staveniska		0	0 Sa 29.8.22	Sa 29.8.22
3		**Zateplenie fasády, strechy a výmena okien**		**0**	**0 Pi 30.8.22**	**Pu 6.3.23**
4		Montáž lešenia fasád, ladového a podlahové 6, do 1,2 m v. do 10 m	m2	0	1335 Pi 30.8.22	Ne 5.10.22
5		Klamp. dekorat. tem. mozno na ploch. strech.	m	0	307,35 Sa 5.10.22	Su 6.10.22
6		Odstránenie pod. krytiny strech do 10°	m2	0	1894,77 Su 6.10.22	Ut 11.10.22
7		Demontáž strešných oblúkov	kus	0	4 Ut 12.10.22	Sa 12.10.22
8		Montáž lep. izolácie strech, prílepenie	m2	0	1537,44 Sa 12.10.22	Su 30.10.22
9		Zhotovenie parotesnej krytiny strech do 10° fóliou na zvaranie spojov	m2	0	1537,17 Su 30.10.22	Ne 30.10.22
10		Strešné vikny monolitické	kus	0	4 Ne 30.10.22	Pi 31.10.22
11		Nadstrešnik strešných oblúkov	kus	0	8 Pi 31.10.22	Ne 2.11.22
12		Oprava strešného chodníka	kus	0	10 Ne 2.11.22	Sa 5.11.22
13		Montáž krytiny strech plechom tvarovaným protiskrutkami	m2	0	307,6 Sa 5.11.22	Ut 8.11.22
14		Klamp. tem. mozno a tvr. kryt	m	0	60,2 Ut 8.11.22	Su 9.11.22
15		Klamp. pojaz. tem. mozno tvr. kryt.-vrcnyl pl. rš 650	m	0	307,35 Ne 9.11.22	Su 12.11.22
16		Klamp. dekorat. Perapedos a ornati	m	0	61,35 Pi 5.10.22	Sa 8.10.22
17		Očistenie vonkajš.omietky vysokotlak.vápenou WAP	m2	0	1868,36 Sa 8.10.22	Pi 10.10.22
18		Pretmetenie pur tmelom	m	0	241 Pi 10.10.22	Sa 12.10.22
19		Vyloženie rámov okien	m2	0	135,98 Sa 12.10.22	Su 15.10.22
20		Osadenie rámov okien z plastov v montážnou penou	kus	0	30 Su 15.10.22	Ne 16.10.22
21		Montáž okien plastových	m	0	301,75 Ne 16.10.22	Pu 28.10.22
22		Montáž dver, stien plastových, hliníkových	kus	0	37 Pu 28.10.22	Ut 25.10.22
23		Zakrývanie otvorných stavbu, predmetov a konštrukcií	m2	0	115,85 Ut 25.10.22	Ne 26.10.22
24		Murivo pravid.porobet.tehlovice - nadmurovanie otv. s akutherm	m3	0	24,42 Ne 26.10.22	Ne 2.11.22
25		Sokliky profil.betónobet	m	0	407,6 Ne 2.11.22	Pi 4.11.22
26		Zatepl. vonk. stien omietka do such. zmesi a min. strut hr.150 mm (odrazná silikónová omietka)	m2	0	1412,85 Pi 4.11.22	Pi 12.12.22
27		Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a lep. dosky hr.60 mm bez omietky	m2	0	342,8 Pi 12.12.22	Pu 12.12.22
28		Oplechovanie parapetov	m	0	91,35 Pu 12.12.22	Sa 15.12.22
29		Omietka vonk. stien mozaika bez tepelnej izolácie	m2	0	377,56 Sa 15.12.22	Ut 27.12.22
30		Montáž mreží pevných zvárania	m2	0	28,8 Ut 27.12.22	Pi 30.12.22
31		Montáž + dodávka poliamerho nátěru (odlišne spoj.materiálu)	kus	0	1 Pi 30.12.22	Su 31.12.22
32		Ležatá tehlová pras. pomocné cpl. podlahy do 1,9 m	m2	0	126,35 2.2.23	Su 4.2.23
33		Vyloženie dverných zárubní	m	0	17,87 Su 4.2.23	Pu 9.2.23
34		Vyrovnanie krídiel okien a dverí	kus	0	30 Pu 9.2.23	Ut 7.2.23
35		Omietka vnút. sokiel.okien, dver. otvp. tlakovou	m2	0	113,33 Ut 7.2.23	Su 11.2.23
36		Osadenie dverných zárubní z plastov v montážnou penou	kus	0	3 Su 11.2.23	Pu 13.2.23
37		Osadenie parapetných dosiek z plastových hmôt	m	0	61,35 Pu 13.2.23	Ut 14.2.23
38		Zavesenie krídel.okien a dverí	kus	0	31 Ut 14.2.23	Sa 18.2.23
39		Montáž lep. izolácie strojov mocných spojkom, prilepením	m2	0	32,88 Sa 18.2.23	Pi 17.2.23
40		Malba za zmesi tekut. Emral 1Far. dvojnás. v mieri do 3,8m	m2	0	1339,51 Pi 6.2.23	Sa 18.8.23
41		Vyloženie bodov kyl. sieto obižan. výstavby pri výške podlaha do 4 m	m2	0	220,55 Ne 6.2.23	Su 10.6.23
42		**Obvodný chodník**		**0**	**0 Pi 20.1.23**	**Sa 5.2.23**
43		Odkopovej chodník z betónových dlaždíc hr. 60 mm na MC 10 (cement.pieska,kompl.vrátaný, obrubník - doplnenie)	m2	0	20 Pi 20.1.23	Ut 24.1.23
44		Odkopovej chodník z betónových dlaždíc - očistenie chodníka	m2	0	135,88 Ut 24.1.23	Sa 2.2.23
45		**Zateplenie podlahy**		**0**	**0 Pi 30.6.22**	**Sa 5.1.23**
46		Búranie betóg.sokiely	m3	0	21,36 Pi 30.6.22	Pi 7.10.22
47		Búranie otvorov v stropoch pre VZT a vypúšťanie	kus	0	4 Pi 7.10.22	Pu 10.10.22
48		Vyrovnanie podlahy po bočných prekopch	m2	0	348 Pi 13.1.23	Su 21.1.23
49		Montáž lep. izolácie podláh 2 x polúdenie	m2	0	348 Su 21.1.23	Ut 25.1.23
50		Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	m3	0	34,36 Ut 25.1.23	Sr 2.2.23
51		Nivelačná stierka podlahová	m2	0	348 Pi 17.2.23	Ne 22.2.23
52		Podlahe lata epoxidová s penetráciou	m2	0	348 Sr 23.2.23	Ut 7.3.23
53		Oprava dverí	odver	0	1 Ut 7.3.23	Ne 8.3.23
54		Vyloženie bodov kyl. sieto obižan. výstavby pri výške podlaha do 4 m	m2	0	348 Ne 8.3.23	Pi 10.3.23
55		**Architektonické - stavebné riešenie interiéru**		**0**	**0 Pu 15.10.22**	**Ut 13.6.23**
56		Vyrovnanie stieno zavesenie dren. krídel dver do 2 m2	kus	0	7 Pu 15.10.22	Ut 11.10.22
57		Demontáž sceliteov stieno 300 pomocných stieno plastových	m	0	20 Ut 11.10.22	Ut 11.10.22
58		Odstránenie povrchových podlah laminátu s podložkou	m2	0	12,7 Ut 12.10.22	Sr 12.10.22
59		Vyloženie obklaciev vnút. z obkladačiek	m2	0	174,71 Sr 12.10.22	Sr 26.10.22
60		Búranie dlažieb sýrobk. sieto tuhom hr. do 1 cm	m2	0	46,46 Sr 26.10.22	Su 29.10.22
61		Ležatá tehlová pras. pomocné cpl. podlahy do 1,9 m	m2	0	108,14 Ut 7.2.23	Sr 10.2.23
62		Oprava vnútorných vápenných omietok stien a stropov tlakovým 10-30%	m2	0	386,46 Pi 10.2.23	Sr 22.2.23
63		Vyrovnanie podlah po bočných prekopch	m2	0	86,4 Sr 22.2.23	Sr 25.2.23
64		Nivelačná stierka podlahová	m2	0	86,4 Sr 25.2.23	Sr 28.2.23
65		Odstránenie nátěrov z kov. stav. dopln. kontin. opálením	m2	0	7,7 Sr 28.2.23	Sr 28.2.23
66		Nátery kov. stav. dopln. kontin. syntet.základné	m2	0	7,7 Sr 28.2.23	Sr 28.2.23
67		Nátery kov. stav. dopln. kontin. syntet. dvojnás. v ts email	m2	0	7,7 Sr 28.2.23	Pi 3.3.23
68		Montáž obkladov vnút. z obkład. pórovín	m2	0	174,71 Pi 3.3.23	Sr 29.4.23
69		Montáž podláh z dlaždíc teraac. než hlad.	m2	0	86,46 Sr 29.4.23	Ut 25.4.23
70		Malba za zmesi tekut. 1far. dvojnás. v mieri do 3,8m	m2	0	386,46 Ut 25.4.23	Sr 3.5.23
71		Lepenie pontexových podlah plastových pásov	m2	0	12,7 Sr 3.5.23	Sr 4.5.23
72		Lepenie podlahových soklikov sieto 100 gumených	m	0	20 Sr 4.5.23	Pi 5.5.23
73		Vyloženie bodov kyl. sieto obižan. výstavby pri výške podlaha do 4 m	m2	0	126,14 Sr 10.6.23	Pu 12.6.23
74		Montáž dver kompl. otvor. do obvodne 1-krídl. do 0,8m	kus	0	7 Ut 13.6.23	Ut 13.6.23
75		**Architektonické - stavebné riešenie - rampa**		**0**	**0 Su 31.12.22**	**Pi 20.1.23**
76		Odkopávky a prekopávky nezapaž. v hor. V. 4 do 100 m3	m3	0	8,8 Su 31.12.22	Su 31.12.22
77		Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hor. V. 4 do 100 m3	m3	0	11,36 Su 31.12.22	Pu 2.1.23
78		Vankúš pod základy z kamenivá hrubého drveného 63/125 mm	m3	0	1,17 Pu 2.1.23	Ut 3.1.23
79		Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	0	4,68 Ut 3.1.23	Sr 4.1.23
80		Murivo nosné z betónových tvárnic STZ0 hr. 200mm s výplňou	m2	0	3,41 Sr 4.1.23	Sr 7.1.23
81		Murivo nosné z betónových tvárnic STZ0 hr. 300mm s výplňou	m2	0	5,64 Sr 7.1.23	Sr 12.1.23
82		Rampa, masívna a schodišťové konštrukcie vo železobetónu, tr. C25/30	m3	0	10,36 Sr 12.1.23	Pu 16.1.23
83		Poklesnutá omít. okien stĺporadovou mriežkou	m2	0	12,5 Pu 16.1.23	Ut 17.1.23
84		Omietka vonk. stien tlakové, vrátane penetračného nátery	m2	0	12,5 Ut 17.1.23	Sr 18.1.23
85		Montáž a výroba zábradlia rovného z nerezových rúrok	m	0	16,75 Sr 18.1.23	Pi 20.1.23
86		**TNS - Elektroinštalácia a uzemnenie**		**0**	**0 Su 12.11.22**	**Pu 21.11.22**
87		Zhotovenie vedenie na povrchu AlFe 6 35mm	m	0	416 Su 12.11.22	Ut 15.11.22
88		Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm šírokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	0	121 Ut 15.11.22	Sr 16.11.22
89		Zásyp káblového lôžka z piesku vrstva 10 cm, bet. doskami 50 x 10 x 6 cm kladenými v smere kábla	m	0	121 Sr 16.11.22	Sr 16.11.22
90		Uzemňovacie vodiče z ocele FeZn	m	0	108 Pi 16.11.22	Pi 18.11.22
91		Ručný zásyp rasap. káblovej rýhy bez dosiek, zemina, 35 cm šírokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	0	121 Pi 18.11.22	Pu 21.11.22
92		**TTSK - Výmena svietidiel za LED svietidlá**		**0**	**0 Su 29.10.22**	**Pi 19.5.23**
93		Demontáž svietidla	ks	0	243 Su 29.10.22	Pi 4.11.22
94		Zapojenie svietidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	0	243 Pi 5.5.23	Pi 19.5.23
95		Výmena (s lineárnej Žiarovky za LED trubicu vo svietidle nástennom, stropnom, IP 20	ks	0	20 Pi 19.5.23	Pi 19.5.23
96		**Ústredná kúrenie**		**0**	**0 Su 5.11.22**	**Sr 31.5.23**
97		Demontážne práce	sub	0	1 Su 5.11.22	Ut 15.11.22
98		Potrubie z oceľ.rúrok.ocele spájané lisovaním DN 15	m	0	14 Ut 30.11.22	Ut 20.12.22
99		Montáž trubíc z PE	m	0	130 Ut 20.12.22	Sr 28.12.22
100		Montáž podlahového vykurovania	m2	0	430 Sr 28.12.22	Pu 9.1.23
101		Montáž Geopaska	SUB	0	4 Su 20.5.23	Pu 22.5.23
102		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0	14 Pu 22.5.23	Sr 24.5.23
103		Montáž vykurovacieho telesa	ks	0	31 Sr 24.5.23	Ut 30.5.23
104		Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a termostatických ovládačov	KUS	0	31 Ut 30.5.23	Sr 31.5.23
105		Nátery kov.potr.a armatúr syntet	m	0	16 Sr 1.6.23	Sr 1.6.23
106		**VZT - Klimatizácia kuchyne a zasadačky**		**0**	**0 Pu 9.1.23**	**Sr 22.6.23**
107		Montaž chladiaceho potrubia	m	0	40 Pu 9.1.23	Sr 11.1.23
108		Premoc rúra DN50 na odvod kondenzátu	m	0	40 Sr 11.1.23	Pi 13.1.23
109		Klimatizačný systém	ks	0	3 Ut 13.6.23	Pi 16.6.23
110		Vonkajšia jednotka	ks	0	3 Pi 16.6.23	Sr 21.6.23
111		Vnútorná nástenná jednotka	ks	0	3 Sr 21.6.23	Sr 22.6.23
112		**Zdravotnotechnická inštalácia**		**0**	**0 Ut 15.11.22**	**Sr 29.6.23**
113		Demontážne práce	sub	0	1 Ut 15.11.22	Pu 21.11.22
114		Potrubie z PVC - U	m	0	24 Pu 21.11.22	Sr 23.11.22
115		Potrubie z plastových rúr PP-R	m	0	46 Sr 23.11.22	Pu 28.11.22
116		Montáž trubíc z PE	m	0	46 Pu 28.11.22	Ut 29.11.22
117		Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	0	46 Ut 30.11.22	Sr 30.11.22
118		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0	46 Sr 23.6.23	Pi 23.6.23
119		Montáž zariaďovacích predmetov ZTI	ks	0	17 Pi 23.6.23	Sr 29.6.23
120		Odovzdanie diela		0	0 Pi 30.6.23	Pi 30.6.23

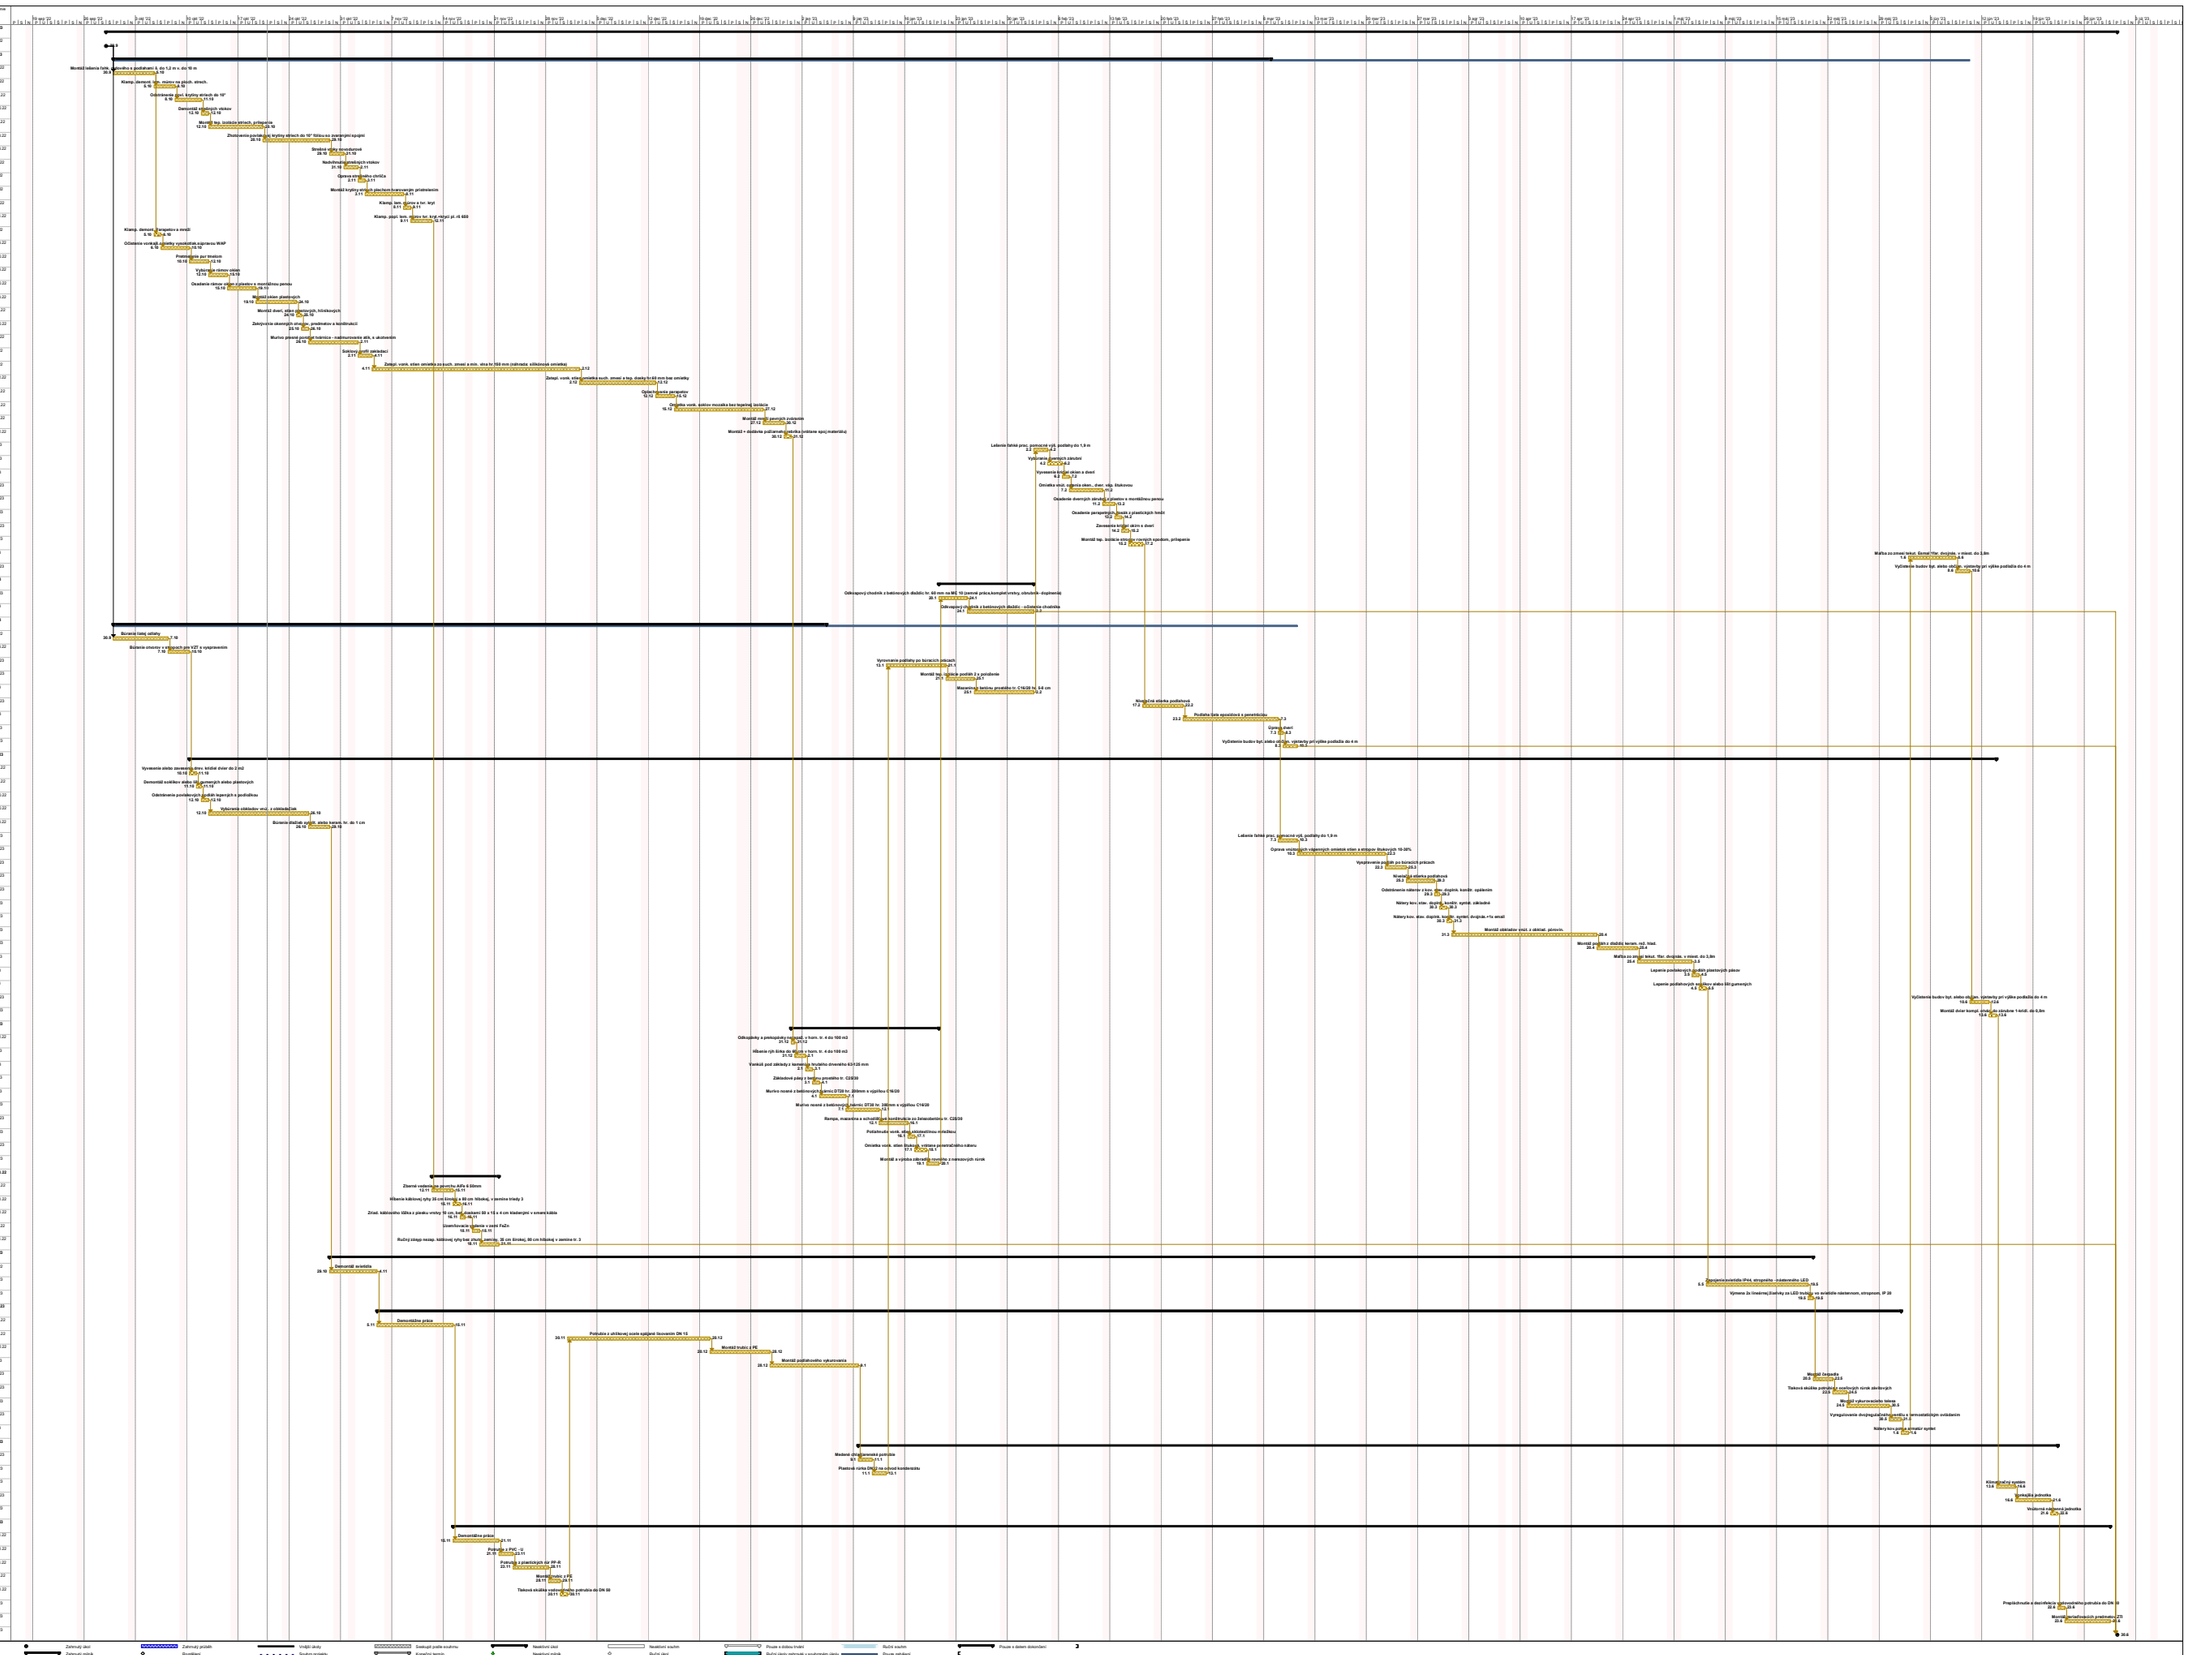

Projekt: Zvýšenie energetickej účinnosti
Dátum: Pi 21.10.22

Úloha | Míľnik | Zatvorený úsek | Zatvorený pohľad | Vnútri úsky | Existujúi podie soukromu | Neaktívni úsek | Neaktívni soukrom | Pouze s dobou trvání | Ručné soukrom | Pouze s dělem dokončení
Projekt | Súhrnný | Zatvorený mílník | Rozdělení | Súhrn projektu | Kritický termín | Neaktívni mílník | Ručné úsek | Ručné úsky zatrvoukrom úseku | Pouze zahájení

Strana 1
