Časový harmonogram výstavby

STAVBA: **Rekonštrukcia mosta č. M 3759, cez potok Rovinka pred obcou V. Slavkov**

Objednávateľ: **Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja**

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava**

STRABAG

	Popis prác	Doba trvania prác
	Rekonštrukcia mosta č. M 3759, cez potok Rovinka pred obcou V. Slavkov	
1.	**Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí**	**1 týždeň**
2.	**Príprava územia**	**1 týždeň**
3.	**Zhotovenie obchádzkovej trasy a DDZ**	**2 týždeň**
	podklad zo ŠD pod cestné panely	1 týždeň
	pokládka cestných panelov	1 týždeň
	pokládka rámových priepustov	1 týždeň
4.	**Odfrézovanie vozovky**	**1 týždeň**
5.	**Búracie práce**	**5 týždeň**
	demontáž zábradlia a súčastí	1 týždeň
	vybúranie ríms spádového betónu	1 týždeň
	demontáž nosníkov	1 týždeň
	vybúranie opôr a základov	2 týždeň
6.	**Provizórne zatrubenie potoka**	**1 týždeň**
7.	**Výkopové práce do úrovne základovej škáry**	**1 týždeň**
8.	**Zhotovenie štrkového vankúša pod opory**	**1 týždeň**
9.	**Zhotovenie podkladového betónu**	**1 týždeň**
10.	**Zhotovenie monolitického základu rámovej konštrukcie**	**2 týždeň**
	výstuž základov	1 týždeň
	Montáž debnenia	1 týždeň
	betonáž, odstránenie debnenia	1 týždeň
11.	**Zhotovenie rámovej konštrukcie steny**	**3 týždeň**
	výstuž stien a krídiel	2 týždeň
	Montáž debnenia	2 týždeň
	betonáž, odstránenie debnenia	2 týždeň
12.	**Zhotovenie dosky rámovej konštrukcie**	**4 týždeň**
	Montáž podpery a debnenia	2 týždeň
	Výstuž dosky	1 týždeň
	betonáž, odstránenie debnenia	1 týždeň
13.	**Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti**	**3 týždeň**
14.	**Zhotovenie plošnej a priečnej drenáže**	**1 týždeň**
15.	**Zhotovenie zásypu základov a stien**	**3 týždeň**
16.	**Zhotovenie izolácie**	**1 týždeň**
18.	**Zhotovenie ríms**	**2 týždeň**
	Montáž prefabrikovaných ríms	1 týždeň
	Výstuž ríms	1 týždeň
	betonáž, odstránenie debnenia	1 týždeň
17	**Zhotovenie prechodovej oblasti mosta**	**2 týždeň**
	vrstva ŠD + CBGM	1 týždeň
	Asfaltové vrstvy AC 16 P	1 týždeň
	Asfaltové vrstvy AC 16 L, AC 11 O	1 týždeň
18.	**Úprava koryta, sanačné práce**	**5 týždeň**
	Výkop betonáž zaisťovacieho prahu	2 týždeň
	Bet. Žľaby TBM + obrubníky	1 týždeň
	Dlažba z lomového kameňa	3 týždeň
19.	**Dokončovacie práce a terénne úpravy.**	**3 týždeň**
	Odstránenie obchádzkovej trasy + zatrubenia toku	2 týždeň
	Terénne úpravy	1 týždeň
	Montáž ZBZ	1 týždeň
	VDZ + ZDZ	1 týždeň
OST	**OST - Ostatné náklady - Projektové práce**	**2 týždeň**

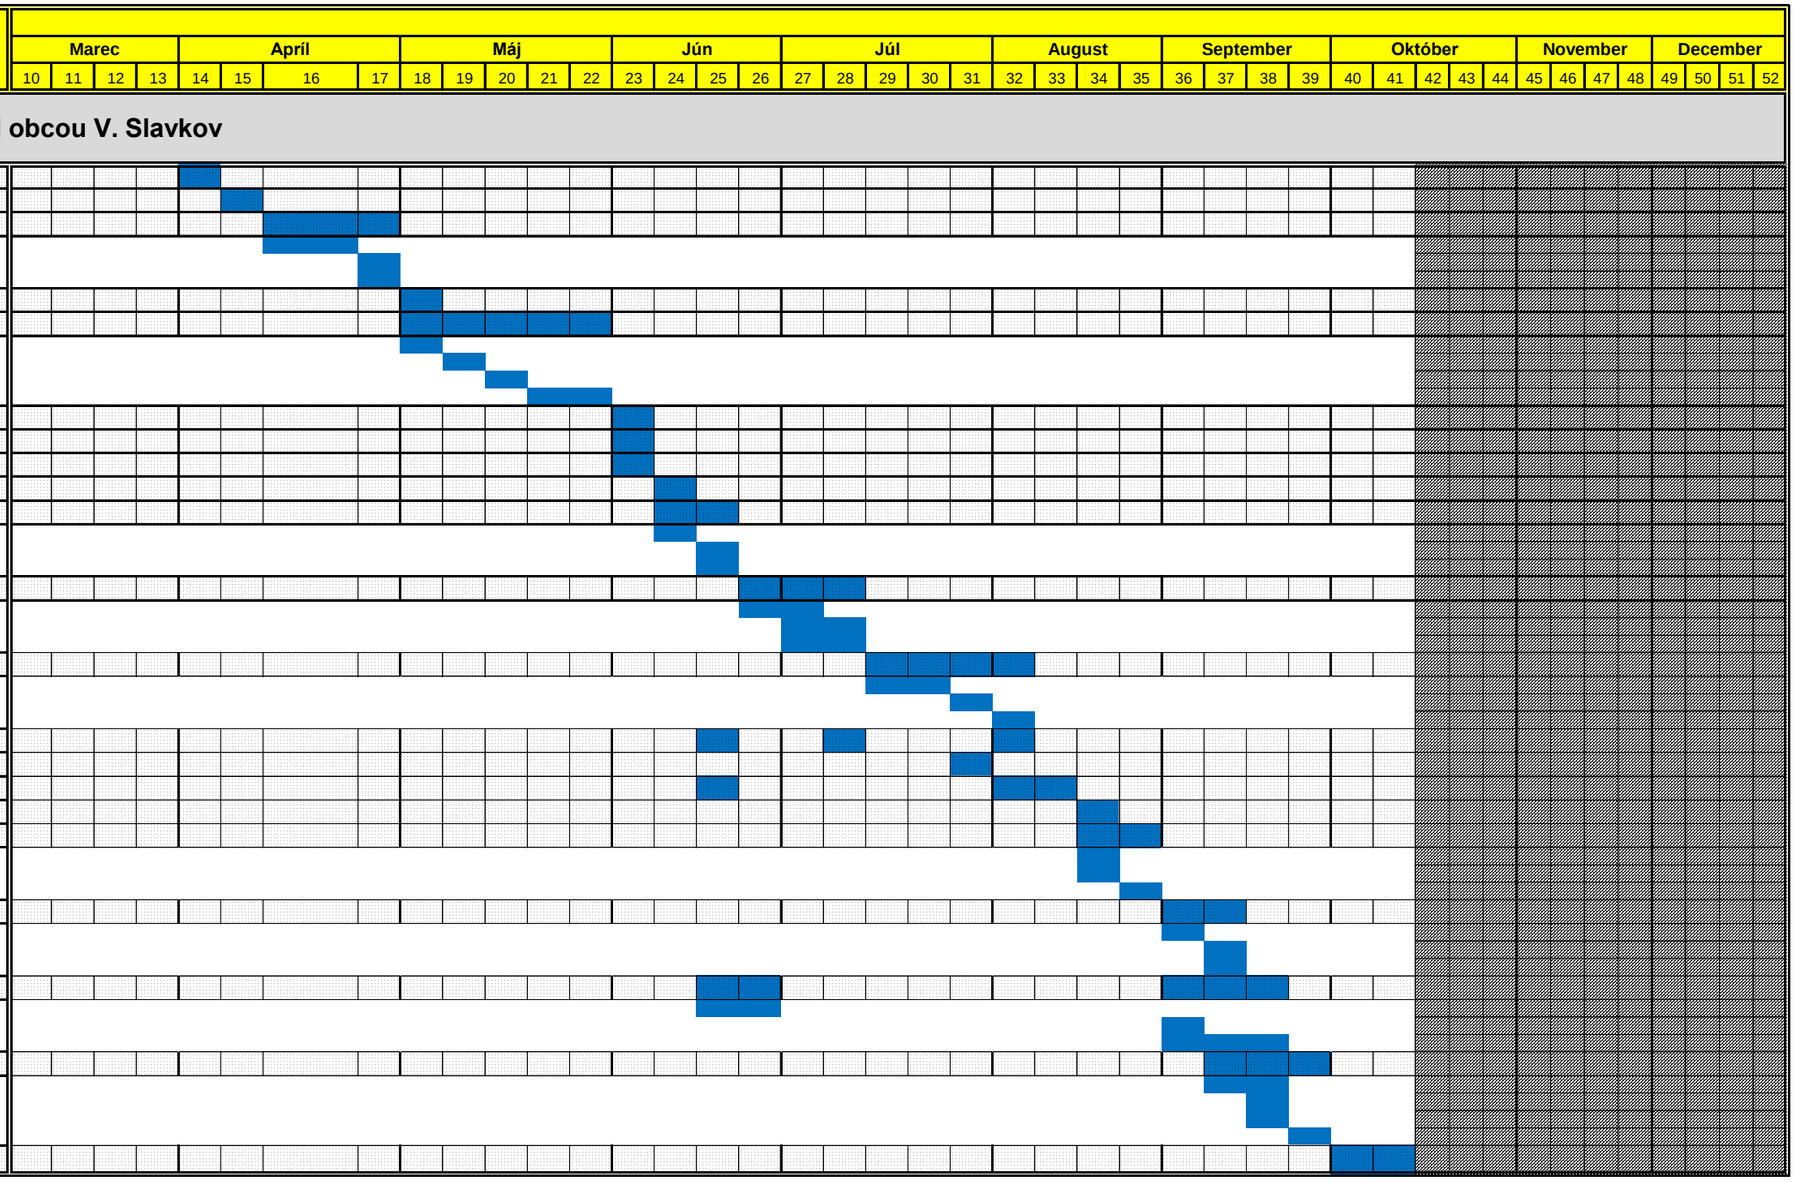

Plánovaný termín zahájenia prác: ***01.04.2024***

Plánovaný termín ukončenia prác: ***13.10.2024***

Plánovaná lehota výstavby: ***195 dní***

dňa..... *.....*

Ing. Viktor Kanda

vedúci PJ Poprad
