HMG Dodatok č.3 - revidovaný

TSS GRADE, a.s.

ID	Názov úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
0	**DPMK II. HMG Dodatok č. 3**	**506 dny**	**7.11. 22**	**30.4. 25**
1	**Prevzatie staveniska**	**0 dny**	**7.11. 22**	**7.11. 22**
2	**PS 00-25-01 Depo DPMK, Technológia haly falkých opráv**	**421 dny**	**7.8. 23**	**30.9. 24**
3	**PS 00-25-01.1 - Technické prehliadky električiek**	**427 dny**	**1.10. 23**	**30.11. 24**
4	Stĺpový otočný žeriav nosnosť 1 000 kg, vyloženie ramena 5,3 m	370 dny	27.11. 23	30.11. 24
5	Stĺpový otočný žeriav 3 ks - dodanie + montáž	62 dny	1.12. 23	31.1. 24
6	ELI Montáž	309 dny	27.11. 23	30.9. 24
7	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
8	Stĺpový otočný žeriav 3 ks - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
9	Stĺpový otočný žeriav 3 ks - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
10	Poloportálový jednonosníkový mostový žeriav	427 dny	1.10. 23	30.11. 24
11	Poloportálový jednonosníkový žeriav - dodanie + montáž	265 dny	1.10. 23	21.6. 24
12	ELI Montáž	309 dny	27.11. 23	30.9. 24
13	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
14	Poloportálový jednonosníkový žeriav - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
15	Poloportálový žeriav - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
16	**PS 00-25-01.2 - Opravy karosérií**	**364 dny**	**1.12. 23**	**28.11. 24**
17	Realizácia PS	305 dny	1.12. 23	30.9. 24
18	Dodanie a montáž rozvádzača	229 dny	15.1. 24	30.8. 24
19	ELI - montáž	225 dny	19.2. 24	30.9. 24
20	ELI - Revízie + Protokoly	23 dny	7.10. 24	29.10. 24
21	Technológia mimo ZoD (kúpne zmluvy KZ 714 04/001; KZ 514/2023)	170 dny	12.6. 24	28.11. 24
22	Hydraulické nožnice s elektrickým pohonom - Metallkraft HTBS BASIC S 2010 + zaškolení	2 dny	12.6. 24	13.6. 24
23	Motorický ohýbací stroj - MSBM 2020-80 PRO + zaškolenie	2 dny	12.6. 24	13.6. 24
24	Kombinovaný päť operačný drevo obrábací stroj KPSN 300A+ zaškolenie	16 dny	12.6. 24	27.6. 24
25	Pásová brúska na drevo - Basset 250 + odsávaní RLA 125 + zaškolenie	1 den	26.6. 24	26.6. 24
26	Hydraulické nožnice Metallkraft HTBS BASIC S 2010 - Revízia + Protokol (30 dňová lehota	30 dny	30.10. 24	28.11. 24
27	Motorický ohýbací stroj - MSBM 2020-80 PRO - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	30 dny	30.10. 24	28.11. 24
28	Kombinovaný drevo obrábací stroj KPSN 300A - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	30 dny	30.10. 24	28.11. 24
29	Pásová brúska na drevo - Basset 250 + odsávaní RLA 125 - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	30 dny	30.10. 24	28.11. 24
30	**PS 00-25-01.3 - Povrchová úprava**	**240 dny**	**1.6. 24**	**26.1. 25**
31	Lakovacia a sušiaca kabína	240 dny	1.6. 24	26.1. 25
32	Lakovacia kabína - dodanie + montáž	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
33	ELI - Montáž	15 dny	16.9. 24	30.9. 24
34	ELI - Revízie + Protokoly	31 dny	4.10. 24	3.11. 24
35	prípojka plynu	3 dny	8.11. 24	10.11. 24
36	skúšanie kabíny	3 dny	11.11. 24	13.11. 24
37	Horáky napojenie + nastavenie	3 dny	11.11. 24	13.11. 24
38	Prípojka plynu + revízia	7 dny	14.11. 24	20.11. 24
39	Komplexné - odskúšanie	14 dny	21.11. 24	4.12. 24
40	Protokol o určení vonkajších vplyvov	2 dny	5.12. 24	6.12. 24
41	Vyjadrenie Technickej inšpekcie	19 dny	9.12. 24	27.12. 24
42	Skúšobná prevádzka 30 dní	30 dny	28.12. 24	26.1. 25
43	Súprava 4 stĺpových zdvihákov do výbušného prostredia	185 dny	1.6. 24	2.12. 24
44	Dodanie a montáž zdvihákov	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
45	ELI - Montáž	15 dny	16.9. 24	30.9. 24
46	ELI - Protokol (30 dňová lehota)	30 dny	4.10. 24	2.11. 24
47	Úradná skúška zdvihákov + protokol (30 dňová lehota)	30 dny	3.11. 24	2.12. 24
48	Centrálny odsávací systém prachu od brúsok	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
49	Centrálna odsávacia jednotka	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
50	Zariadenie na umývanie striekacej techniky	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
51	Kompletné striekacie zariadenie s vozíkom a tryskou	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
52	Striekacia pištoľ bez podpory vzduchu	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
53	Zariadenie na miešanie farieb	122 dny	1.6. 24	30.9. 24
54	**PS 00-25-01.4 - Sústruženie dvojkolies**	**104 dny**	**1.9. 24**	**13.12. 24**
55	Podúrovňový sústruh na opracovanie dvojkolies električiek s NC riadením, náhradnými dielmi pre dvojpoľnú prevádzku	104 dny	1.9. 24	13.12. 24
56	Sústruh TUP650 - dodanie + montáž	13 dny	1.9. 24	13.9. 24
57	ELI - Montáž	15 dny	16.9. 24	30.9. 24
58	ELI - Revízie + Protokoly	47 dny	30.9. 24	15.11. 24
59	Sústruh TUP650 - zaškolenie	4 dny	8.10. 24	11.10. 24
60	Sústruh TUP650 - el. revízia + protokol	29 dny	15.11. 24	13.12. 24
61	**PS 00-25-01.5 - Odpraľovanie električiek**	**351 dny**	**1.12. 23**	**15.11. 24**
62	Dodanie a montáž technológie	275 dny	1.12. 23	31.8. 24
63	ELI - Montáž	18 dny	13.9. 24	30.9. 24
64	ELI - Revízie + Protokoly	47 dny	30.9. 24	15.11. 24
65	**PS 00-25-01.6 - Opravy podvozkov**	**427 dny**	**1.10. 23**	**30.11. 24**
66	Otočná plošina - točňa	213 dny	1.2. 24	31.8. 24
67	Mostový žeriav jednonosníkový, nosnosť 8 t, rozpätie 14,7 m, vrátane žeriavovej dráhy a troleje	427 dny	1.10. 23	30.11. 24
68	Mostový žeriav 2 ks - dodávka + montáž	274 dny	1.10. 23	30.6. 24
69	ELI - Montáž	155 dny	29.4. 24	30.9. 24
70	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
71	Mostový žeriav 2 ks - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
72	Mostový žeriav 2 ks - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
73	Zvislý sústruh s čítačovým riadením	215 dny	29.4. 24	29.11. 24
74	Zvislý sústruh VLC 1600 ECO - dodávka + montáž	30 dny	1.9. 24	30.9. 24
75	ELI - Montáž	155 dny	29.4. 24	30.9. 24
76	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
77	Zvislý sústruh VLC 1600 ECO - zaškolenie 2 dni	2 dny	30.9. 24	1.10. 24
78	Zvislý sústruh VLC 1600 ECO - revízia + protokol	29 dny	1.11. 24	29.11. 24
79	Otočný stĺpový konzolový žeriav nosnosť 1 000 kg, vyloženie ramena 8,5 m	366 dny	1.12. 23	30.11. 24
80	Stĺpový otočný žeriav - dodávka a montáž	62 dny	1.12. 23	31.1. 24
81	ELI - Montáž	155 dny	29.4. 24	30.9. 24
82	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
83	Stĺpový otočný žeriav - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
84	Stĺpový otočný žeriav - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
85	Technológia mimo ZoD (kúpne zmluvy KZ 714 04/001; KZ 514/2023)	216 dny	29.4. 24	30.11. 24
86	Radiálna vŕtačka VR3080	215 dny	29.4. 24	29.11. 24
87	Radiálna vŕtačka VR3080 - montáž	2 dny	17.9. 24	18.9. 24
88	Radiálna vŕtačka VR3080 - zaškolenie	2 dny	18.9. 24	19.9. 24
89	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	155 dny	29.4. 24	30.9. 24
90	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	34 dny	1.10. 24	3.11. 24
91	Radiálna vŕtačka VR3080 - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	26 dny	4.11. 24	29.11. 24
92	ZMM CU 1250/3000	215 dny	29.4. 24	29.11. 24
93	ZMM CU 1250/3000 - montáž	9 dny	23.9. 24	1.10. 24
94	ZMM CU 1250/3000 - zaškolenie	2 dny	30.9. 24	1.10. 24
95	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	155 dny	29.4. 24	30.9. 24
96	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	34 dny	1.10. 24	3.11. 24
97	ZMM CU 1250/3000 - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	26 dny	4.11. 24	29.11. 24
98	CDRA 500	216 dny	29.4. 24	30.11. 24
99	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	155 dny	29.4. 24	30.9. 24
100	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	34 dny	1.10. 24	3.11. 24
101	CDRA 500 - Montáž + preskúšanie + zaškolenie	44 dny	18.10. 24	30.11. 24
102	**PS 00-25-01.7 - Opravárenské dielne**	**366 dny**	**1.12. 23**	**30.11. 24**
103	Stĺpový konzolový žeriav, nosnosť 1 000 kg, vyloženie ramena 3 500 mm	366 dny	1.12. 23	30.11. 24
104	Dodávka žeriava + montáž	62 dny	1.12. 23	31.1. 24
105	ELI - Montáž	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
106	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
107	Stĺpový otočný žeriav 5ks - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
108	Stĺpový otočný žeriav 5ks - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
109	Stĺpový konzolový žeriav, nosnosť 1 000 kg, vyloženie ramena 6 500 mm	366 dny	1.12. 23	30.11. 24
110	Dodávka žeriava + montáž	62 dny	1.12. 23	31.1. 24
111	ELI - Montáž	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
112	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
113	Stĺpový otočný žeriav 5ks - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
114	Stĺpový otočný žeriav 5ks - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
115	Stĺpový konzolový žeriav, nosnosť 1 000 kg, vyloženie ramena 5 500 mm	366 dny	1.12. 23	30.11. 24
116	Dodávka žeriava + montáž	62 dny	1.12. 23	31.1. 24
117	ELI - Montáž	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
118	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
119	Stĺpový otočný žeriav 5ks - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
120	Stĺpový otočný žeriav 5ks - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
121	Technológia mimo ZoD (kúpne zmluvy KZ 714 04/001; KZ 514/2023)	280 dny	21.2. 24	26.11. 24
122	Univerzálny hrotový sústruh OPTImill TH 8030 D	280 dny	21.2. 24	26.11. 24
123	Univerzálny hrotový sústruh OPTImill TH 8030 D - montáž	2 dny	17.9. 24	18.9. 24
124	Univerzálny hrotový sústruh OPTImill TH 8030 D - Zaškolenie	2 dny	18.9. 24	19.9. 24
125	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
126	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
127	Univerzálny hrotový sústruh OPTImill TH 8030 D - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	30 dny	28.10. 24	26.11. 24
128	Sústruh hrotový OPTImill TH 5620 D	280 dny	21.2. 24	26.11. 24
129	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
130	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
131	Sústruh hrotový OPTImill TH 5620 D - Montáž	2 dny	17.9. 24	18.9. 24
132	Sústruh hrotový OPTImill TH 5620 D - Zaškolenie	2 dny	18.9. 24	19.9. 24
133	Sústruh hrotový OPTImill TH 5620 D - Revízia + Protokol (30 dňová lehota)	30 dny	28.10. 24	26.11. 24
134	Univerzálna konzolová frézka KNUTH KB 2100	280 dny	21.2. 24	26.11. 24
135	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
136	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
137	Univerzálna konzolová frézka KNUTH KB 2100 - montáž	2 dny	12.9. 24	13.9. 24
138	Univerzálna konzolová frézka KNUTH KB 2100 - zaškolenie	1 den	13.9. 24	13.9. 24
139	Univerzálna konzolová frézka KNUTH KB 2100 - revízia + dokumentácia	30 dny	28.10. 24	26.11. 24
140	CNC sústružnícke obrábacie centrum LTC-20D	277 dny	21.2. 24	23.11. 24
141	ELI - montáž (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	223 dny	21.2. 24	30.9. 24
142	ELI - Revízie + Protokoly (nie je predmetom kúpnych zmlúv)	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
143	CNC sústružnícke obrábacie centrum LTC-20D - montáž	5 dny	16.9. 24	20.9. 24
144	CNC sústružnícke obrábacie centrum LTC-20D - zaškolenie	1 den	20.9. 24	20.9. 24
145	CNC sústružnícke obrábacie centrum LTC-20D - revízia + dokumentácia	27 dny	28.10. 24	23.11. 24
146	**PS 00-25-01.8 - Rozvod stlačeného vzduchu**	**316 dny**	**1.12. 23**	**11.10. 24**
147	Dodanie a montáž potrubia	305 dny	1.12. 23	30.9. 24
148	Tlaková skúška + protokol	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
149	**PS 00-25-01.9 - Skúšobňa motorov**	**366 dny**	**1.12. 23**	**30.11. 24**
150	**Stĺpový konzolový otočný žeriav, nosnosť 1000 kg, vyloženie ramena 3000 mm**	**366 dny**	**1.12. 23**	**30.11. 24**
151	Dodávka žeriava + montáž	305 dny	1.12. 23	30.9. 24
152	ELI - Montáž	43 dny	19.8. 24	30.9. 24
153	ELI - Revízie + Protokoly	25 dny	1.10. 24	25.10. 24
154	Stĺpový otočný žeriav - montážna skúška, revízia , úradná skúška	4 dny	28.10. 24	31.10. 24
155	Stĺpový otočný žeriav - protokol + sprievodný technická dokumentácia (+30 dní)	30 dny	1.11. 24	30.11. 24
156	**PS 00-25-01.10 - Hlavné napájacie rozvody silnoprúdu**	**380 dny**	**18.10. 23**	**31.10. 24**
157	dodávka rozvádzača a vývodných skríň	91 dny	1.12. 23	29.2. 24
158	ELI - Montáž	349 dny	18.10. 23	30.9. 24
159	ELI - Revízie + Protokoly	31 dny	1.10. 24	31.10. 24
160	**PS 00-25-05.2 Depo DPMK, Kompresorovňa (technologická časť), 2. etapa**	**391 dny**	**7.8. 23**	**31.8. 24**
161	zemné práce a montáž	391 dny	7.8. 23	31.8. 24
162	dodanie vzdušníka	122 dny	1.12. 23	31.3. 24
163	**PS 00-25-06.2 Depo DPMK, Rozvody stlačeného vzduchu, 2. etapa**	**299 dny**	**7.8. 23**	**31.5. 24**
164	**SO 00-04-01.2 Depo DPMK, Kofajový spodok, 2. etapa**	**151 dny**	**12.9. 24**	**9.2. 25**
165	**SO 00-05-01.2 Depo DPMK, Kofajový zvršok, 2. etapa**	**301 dny**	**1.7. 24**	**27.4. 25**
166	montáž kofajníc	301 dny	1.7. 24	27.4. 25
167	ostatné práce(zváranie ,brúsenie,bokovnice)	244 dny	12.8. 24	12.4. 25
168	**SO 00-07-31.2 Depo DPMK, Spevnené plochy a chodníky, 2. etapa**	**168 dny**	**11.11. 24**	**27.4. 25**
169	odstránenie pôvodných povrchov	28 dny	11.11. 24	8.12. 24
170	budovanie nových konštrukcií	168 dny	11.11. 24	27.4. 25
171	**SO 00-07-41.2 Depo DPMK, Úprava oplotenia, 2. etapa**	**32 dny**	**15.8. 24**	**15.9. 24**
172	**SO 00-08-01.2 Depo DPMK, Prípojka vody, 2. etapa**	**344 dny**	**7.8. 23**	**15.7. 24**
173	**SO 00-08-02.2 Depo DPMK, Požiarny vodovod, 2. etapa**	**344 dny**	**7.8. 23**	**15.7. 24**
174	**SO 00-08-03 Depo DPMK, Preložka vodovodu VVS**	**59 dny**	**1.2. 23**	**31.3. 23**
175	**SO 00-08-11 Depo DPMK, Prípojka plynu**	**421 dny**	**15.9. 23**	**8.11. 24**
176	Realizácia	382 dny	15.9. 23	30.9. 24
177	Úradná skúška, revízna skúška	4 dny	1.10. 24	4.10. 24
178	Osvedčenie o Úradnej skúške	10 dny	7.10. 24	16.10. 24
179	Žiadosť DPMK na SPP o prípojke plynu	1 den	17.10. 24	17.10. 24
180	Spustené pripojenie plynu od SPP (podľa štandardov SPP 3 týždne)	22 dny	18.10. 24	8.11. 24
181	**SO 00-08-21 Depo DPMK, Prípojka teplovodu**	**457 dny**	**31.7. 23**	**29.10. 24**
182	dodanie a montáž	428 dny	31.7. 23	30.9. 24
183	Ostrý prepoj oslovíť TEKO (termín závisí od TEKO)	6 dny	1.10. 24	6.10. 24
184	Úradná skúška	8 dny	7.10. 24	14.10. 24
185	Osvedčenie o ÚS	15 dny	15.10. 24	29.10. 24
186	**SO 00-09-01.2 Depo DPMK, Areálová dažďová a splašková kanalizácia, 2. etapa**	**366 dny**	**1.7. 23**	**30.6. 24**
187	**SO 00-09-02.2 Depo DPMK, Areálová priemyselná kanalizácia, 2. etapa**	**336 dny**	**31.7. 23**	**30.6. 24**
188	**SO 00-10-01 Depo DPMK, Vegetačné úpravy**	**731 dny**	**1.5. 23**	**30.4. 25**
189	**SO 00-20-01 Depo DPMK, Hala ťažkých opráv**	**755 dny**	**7.11. 22**	**30.11. 24**
190	dodanie PD k technologickým základom	113 dny	24.1. 24	15.5. 24
191	dodanie PD k technologickým základom	83 dny	24.1. 24	15.4. 24
192	výkopy,izolácia,betonáž základov a podlahy v technologickej časti B-Cx2-6	182 dny	18.3. 24	15.9. 24
193	**SO 00-20-01.1 Stavebné riešenie a statika**	**684 dny**	**7.11. 22**	**20.9. 24**
194	**SO 00-20-01.3 Elektroinštalácia**	**626 dny**	**1.3. 23**	**15.11. 24**
195	Realizácia SO	519 dny	1.5. 23	30.9. 24
196	ELI - Montáž	580 dny	1.3. 23	30.9. 24
197	ELI - Revízie + Protokoly	46 dny	1.10. 24	15.11. 24
198	Osvetlenie 1.NP - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
199	Osvetlenie 2.NP - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
200	Núdzové osvetlenie 1.NP - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
201	Núdzové osvetlenie 2.NP - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
202	Zásuvky a TZB 1.NP - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
203	Zásuvky a TZB 2.NP - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
204	Zásuvky a TZB strecha - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
205	Protipožiarne zariadenie - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
206	Central Stop - funkčné vyskúšanie	14 dny	1.10. 24	14.10. 24
207	**SO 00-20-01.4 Zdravotechnika**	**439 dny**	**31.7. 23**	**11.10. 24**
208	Realizácia SO	428 dny	31.7. 23	30.9. 24
209	Dažďová kanalizácia - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
210	Splašková kanalizácia - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
211	Kanalizácia do sedimentačnej nádrže - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
212	Kanalizácia do neutralizačnej nádrže - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
213	SV - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
214	TÚV (nutné zapojenie OST) - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
215	Požiarny vodovod - dokončenie + tlaková skúška	428 dny	31.7. 23	30.9. 24
216	Požiarny vodovod - funkčné vyskúšanie	11 dny	1.10. 24	11.10. 24
217	**SO 00-20-01.5 Vykurovanie**	**517 dny**	**3.7. 23**	**30.11. 24**
218	Realizácia SO	456 dny	3.7. 23	30.9. 24
219	OST - funkčné vyskúšanie	6 dny	30.10. 24	4.11. 24
220	Vykurovacia skúška 72 hodín (v závislosti od poveternostných podmienok)	3 dny	19.11. 24	21.11. 24
221	Doklad o vykonaní skúšky	9 dny	22.11. 24	30.11. 24
222	**SO 00-20-01.6 Vzduchotechnika**	**487 dny**	**11.7. 23**	**8.11. 24**
223	Realizácia SO	448 dny	11.7. 23	30.9. 24
224	ELI - realizácia	448 dny	11.7. 23	30.9. 24
225	ELI - Revízie + Protokoly	31 dny	1.10. 24	31.10. 24
226	Funkčné skúšky + zaškolenie	8 dny	1.11. 24	8.11. 24
227	**SO 00-20-01.8 Vnútorný plyn**	**570 dny**	**1.5. 23**	**20.11. 24**
228	Montáž rozvodov vnútorného plynu	519 dny	1.5. 23	30.9. 24
229	Tlaková skúška + revízia	7 dny	14.11. 24	20.11. 24
230	**SO 00-20-01.9 Meranie a regulácia**	**508 dny**	**11.7. 23**	**29.11. 24**
231	Realizácia SO	448 dny	11.7. 23	30.9. 24
232	Vzduchotechnika, rozvádzač MaR DT1 - funkčné vyskúšanie	9 dny	21.11. 24	29.11. 24
233	Vzduchotechnika, rozvádzač MaR DT2 - funkčné vyskúšanie	9 dny	21.11. 24	29.11. 24
234	Vzduchotechnika, rozvádzač MaR DT3 - funkčné vyskúšanie	9 dny	21.11. 24	29.11. 24
235	Vykurovanie objektu OST, rozvádzač MaR DT OST - funkčné vyskúšanie	9 dny	21.11. 24	29.11. 24
236	**SO 00-20-01 Ukončenie stavebnej časti pre začatie legislatívneho konania na Predčasné užívanie stavby**	**72 dny**	**20.4. 24**	**30.6. 24**
237	**SO 00-25-03.1 Depo DPMK, Úpravy VN vedení DPMK - Napojenie meniarne "E",2. etapa**	**278 dny**	**9.1. 23**	**30.4. 24**
238	**SO 00-26-01.2 Depo DPMK, Trakčné vedenie, 2. etapa**	**255 dny**	**20.2. 24**	**31.10. 24**
239	Realizácia SO	192 dny	20.2. 24	29.8. 24
240	Revízia + protokol	8 dny	23.9. 24	30.9. 24
241	Úradná skúška	1 den	1.10. 24	1.10. 24
242	Protokol v lehote 30 dní	30 dny	2.10. 24	31.10. 24
243	**SO 00-27-01 Depo DPMK, Oznamovacie vedenia Slovak Telekom**	**28 dny**	**1.2. 23**	**28.2. 23**
244	**Demontáž teplovodného kanála**	**54 dny**	**9.12. 22**	**31.1. 23**
245	**Prekládka NN káblov v majetku DPMK**	**69 dny**	**11.1. 23**	**20.3. 23**
246	Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie	49 dny	11.1. 23	28.2. 23
247	Realizácia prekládky	20 dny	1.3. 23	20.3. 23
248	**Komplexné - odskúšanie**	**62 dny**	**1.12. 24**	**31.1. 25**
249	**Odovzdanie DSPRS**	**91 dny**	**1.1. 25**	**31.1. 25**

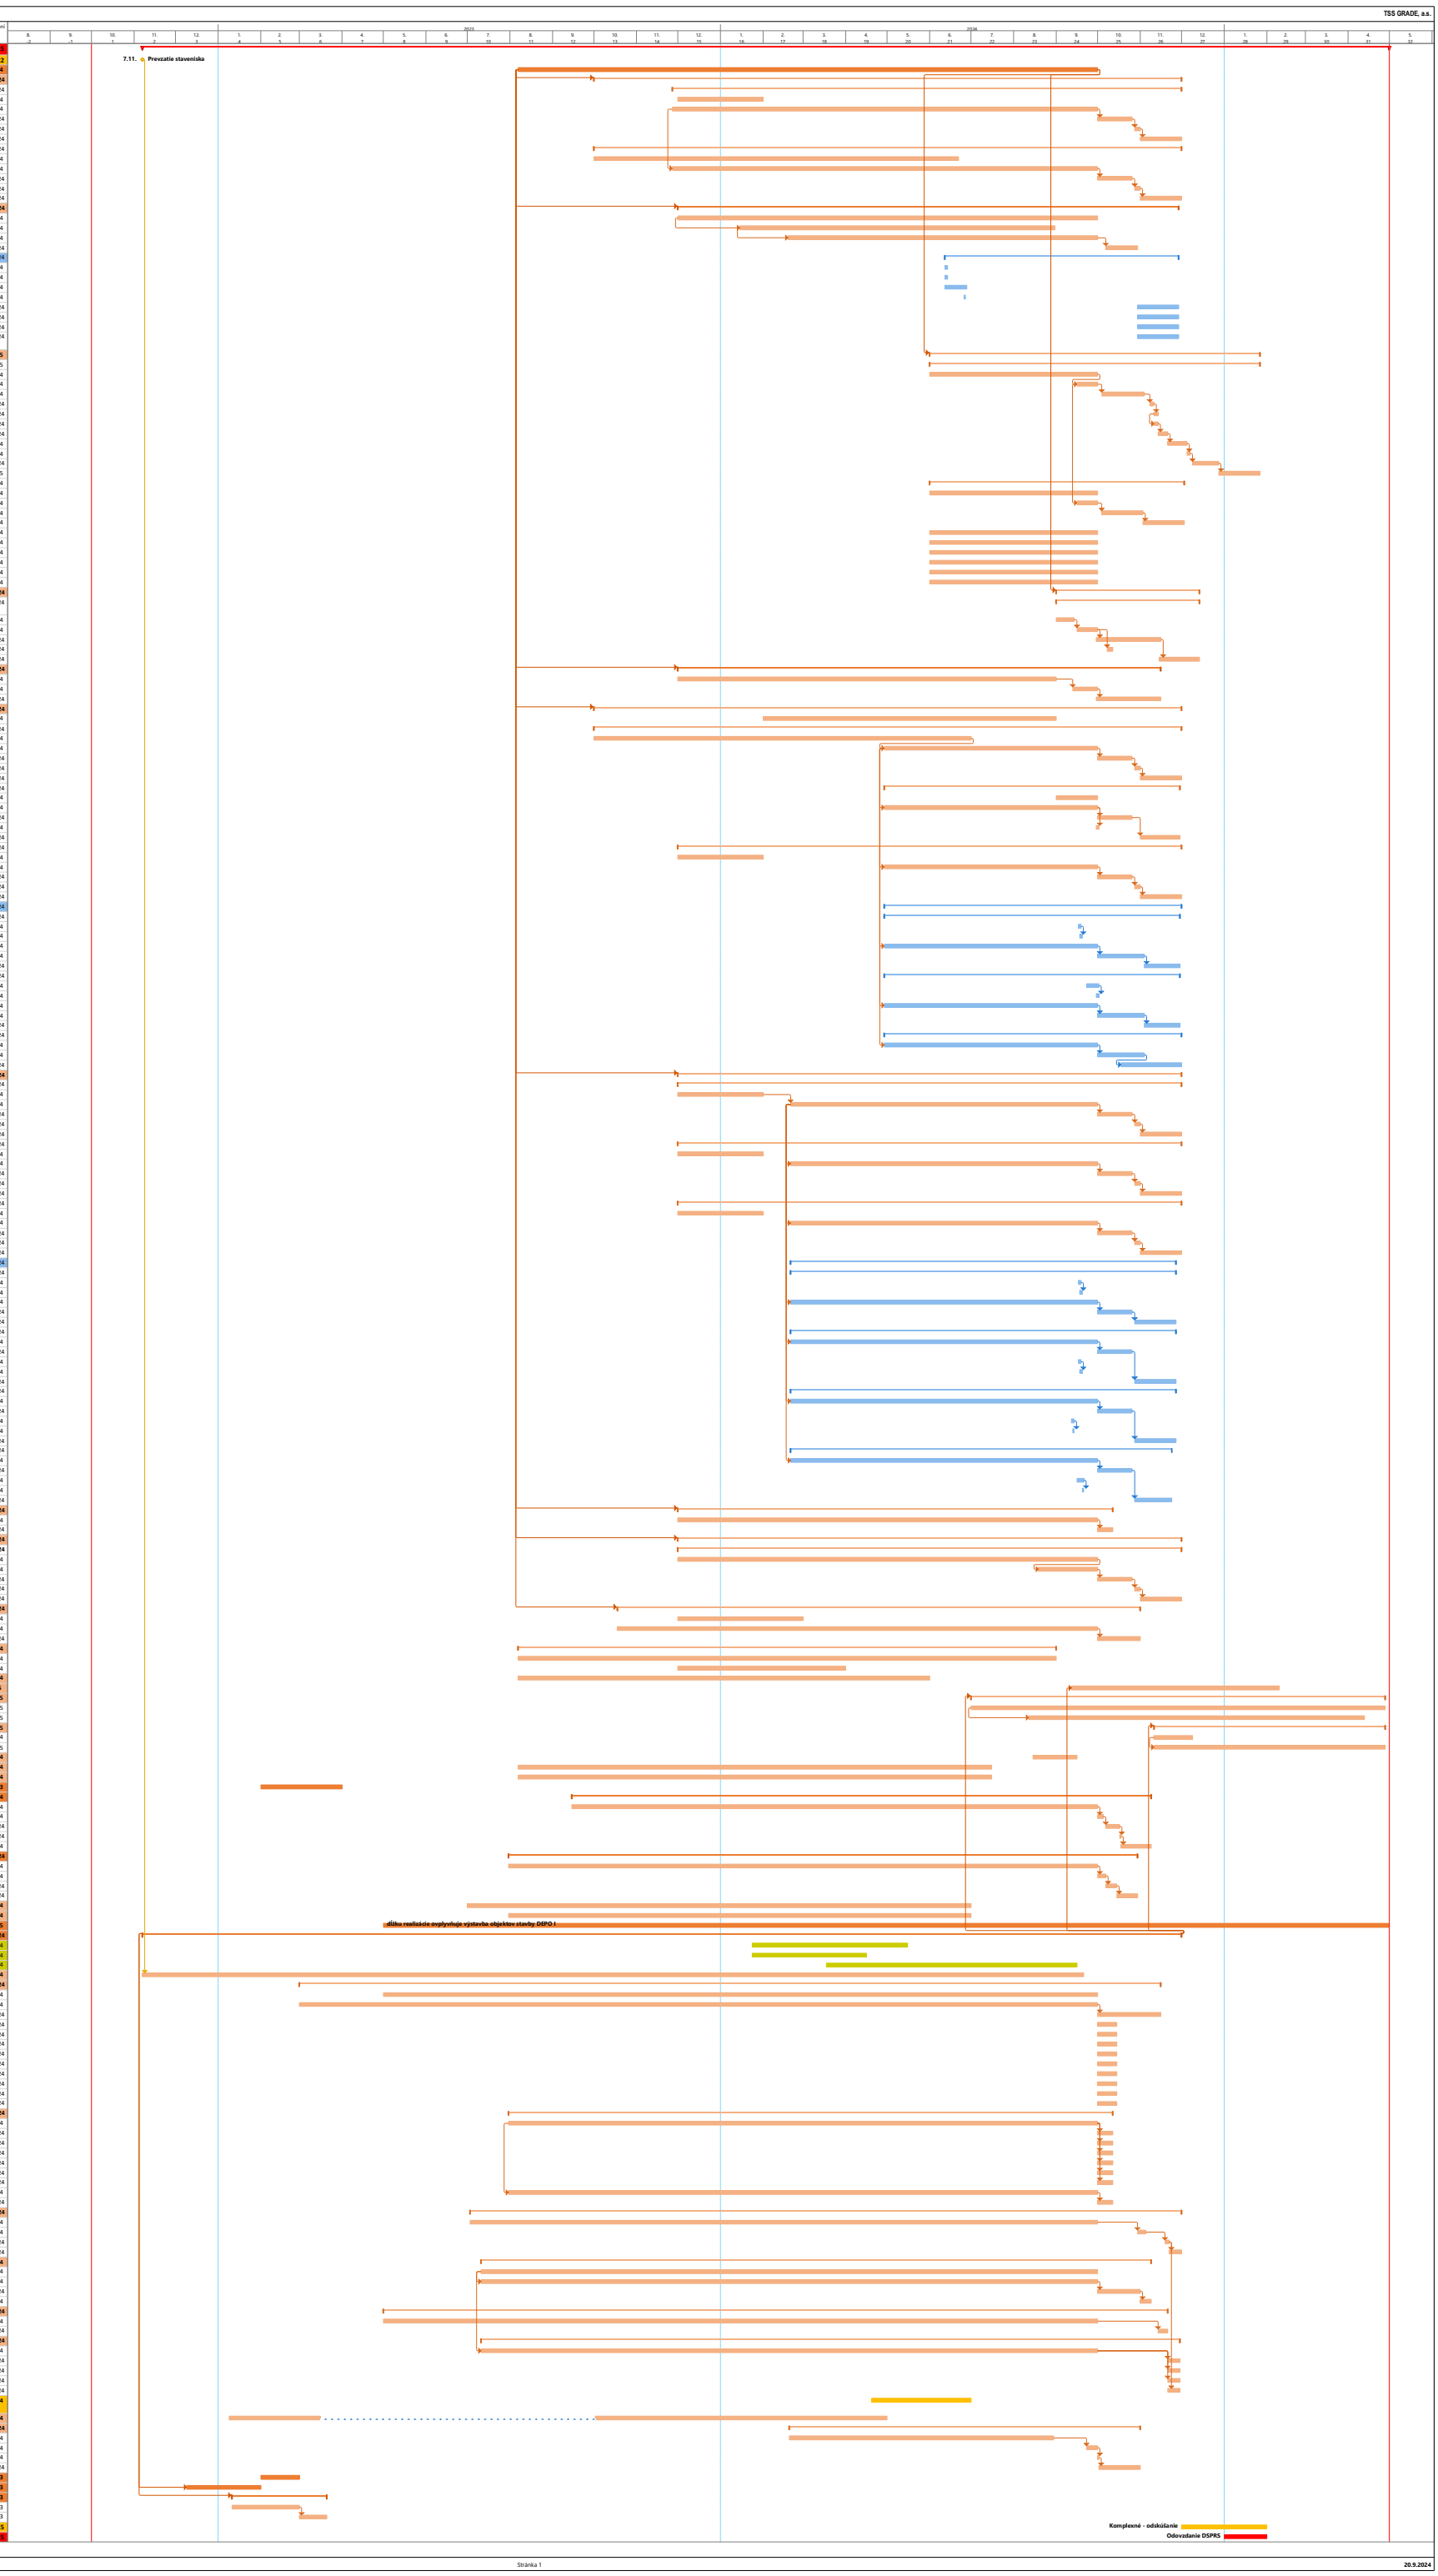

20.9.2024
