HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

Kanalizačná prípojka pre objekt referátu verejnej zelene a odvod dažďovej vody

Objednávateľ: Obec Ivanka pri Dunaji

Zhotoviteľ: PRO EXTERIÉR Stavebná spoločnosť

P.Č.	Popis / deň	Množstvo
1	Zriadenie staveniska - DDZ, kontajner, WC	1
2	Búracie práce - búranie krytov z betónu a kameniva	39 m2
3	Zemné práce - vykop rýh	24,9 m3
4	Odvoz vzniknutého odpadu	22 t
5	Pieskové lôžko dna	4,3 m3
6	Montáž potrubia PVC 125-200 mm splaškovej a dažďovej kanalizácie	83 bm
7	Spätný zasyp rýh : štrk, kamenivo	22,32 m3
8	Podkladové vrstvy CB krytu z betónu CBGM C12/15	39 m2
9	Vytúž cementobetoveho krytu z ocele B500	39 m2
10	Kryt cement betónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	39 m2
11	Dilatačne škáry v CB kryte rezane z asfaltkou zálievkou	570,35m2
12	Odstránenie zariadenia staveniska, vypratávanie priestoru	570,35m3

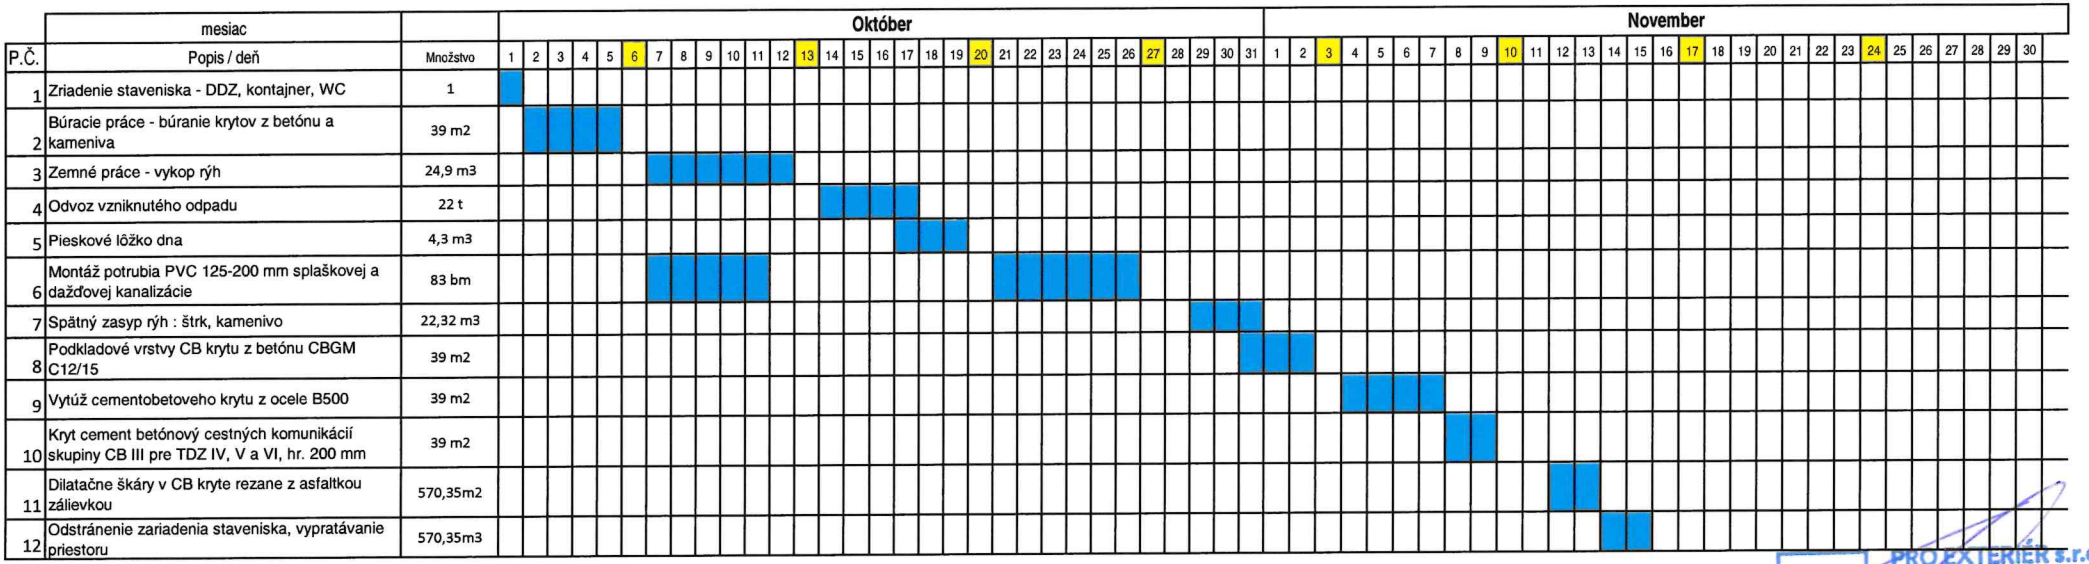

PRO EXTERIÉR s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava
IČO:52157164
PRO EXTERIÉR IČ DPH:SK2120915808

V Bratislave, dňa: 16.09.2024

Pavlo Bidzilia
konateľ - PRO EXTERIÉR s.r.o.
