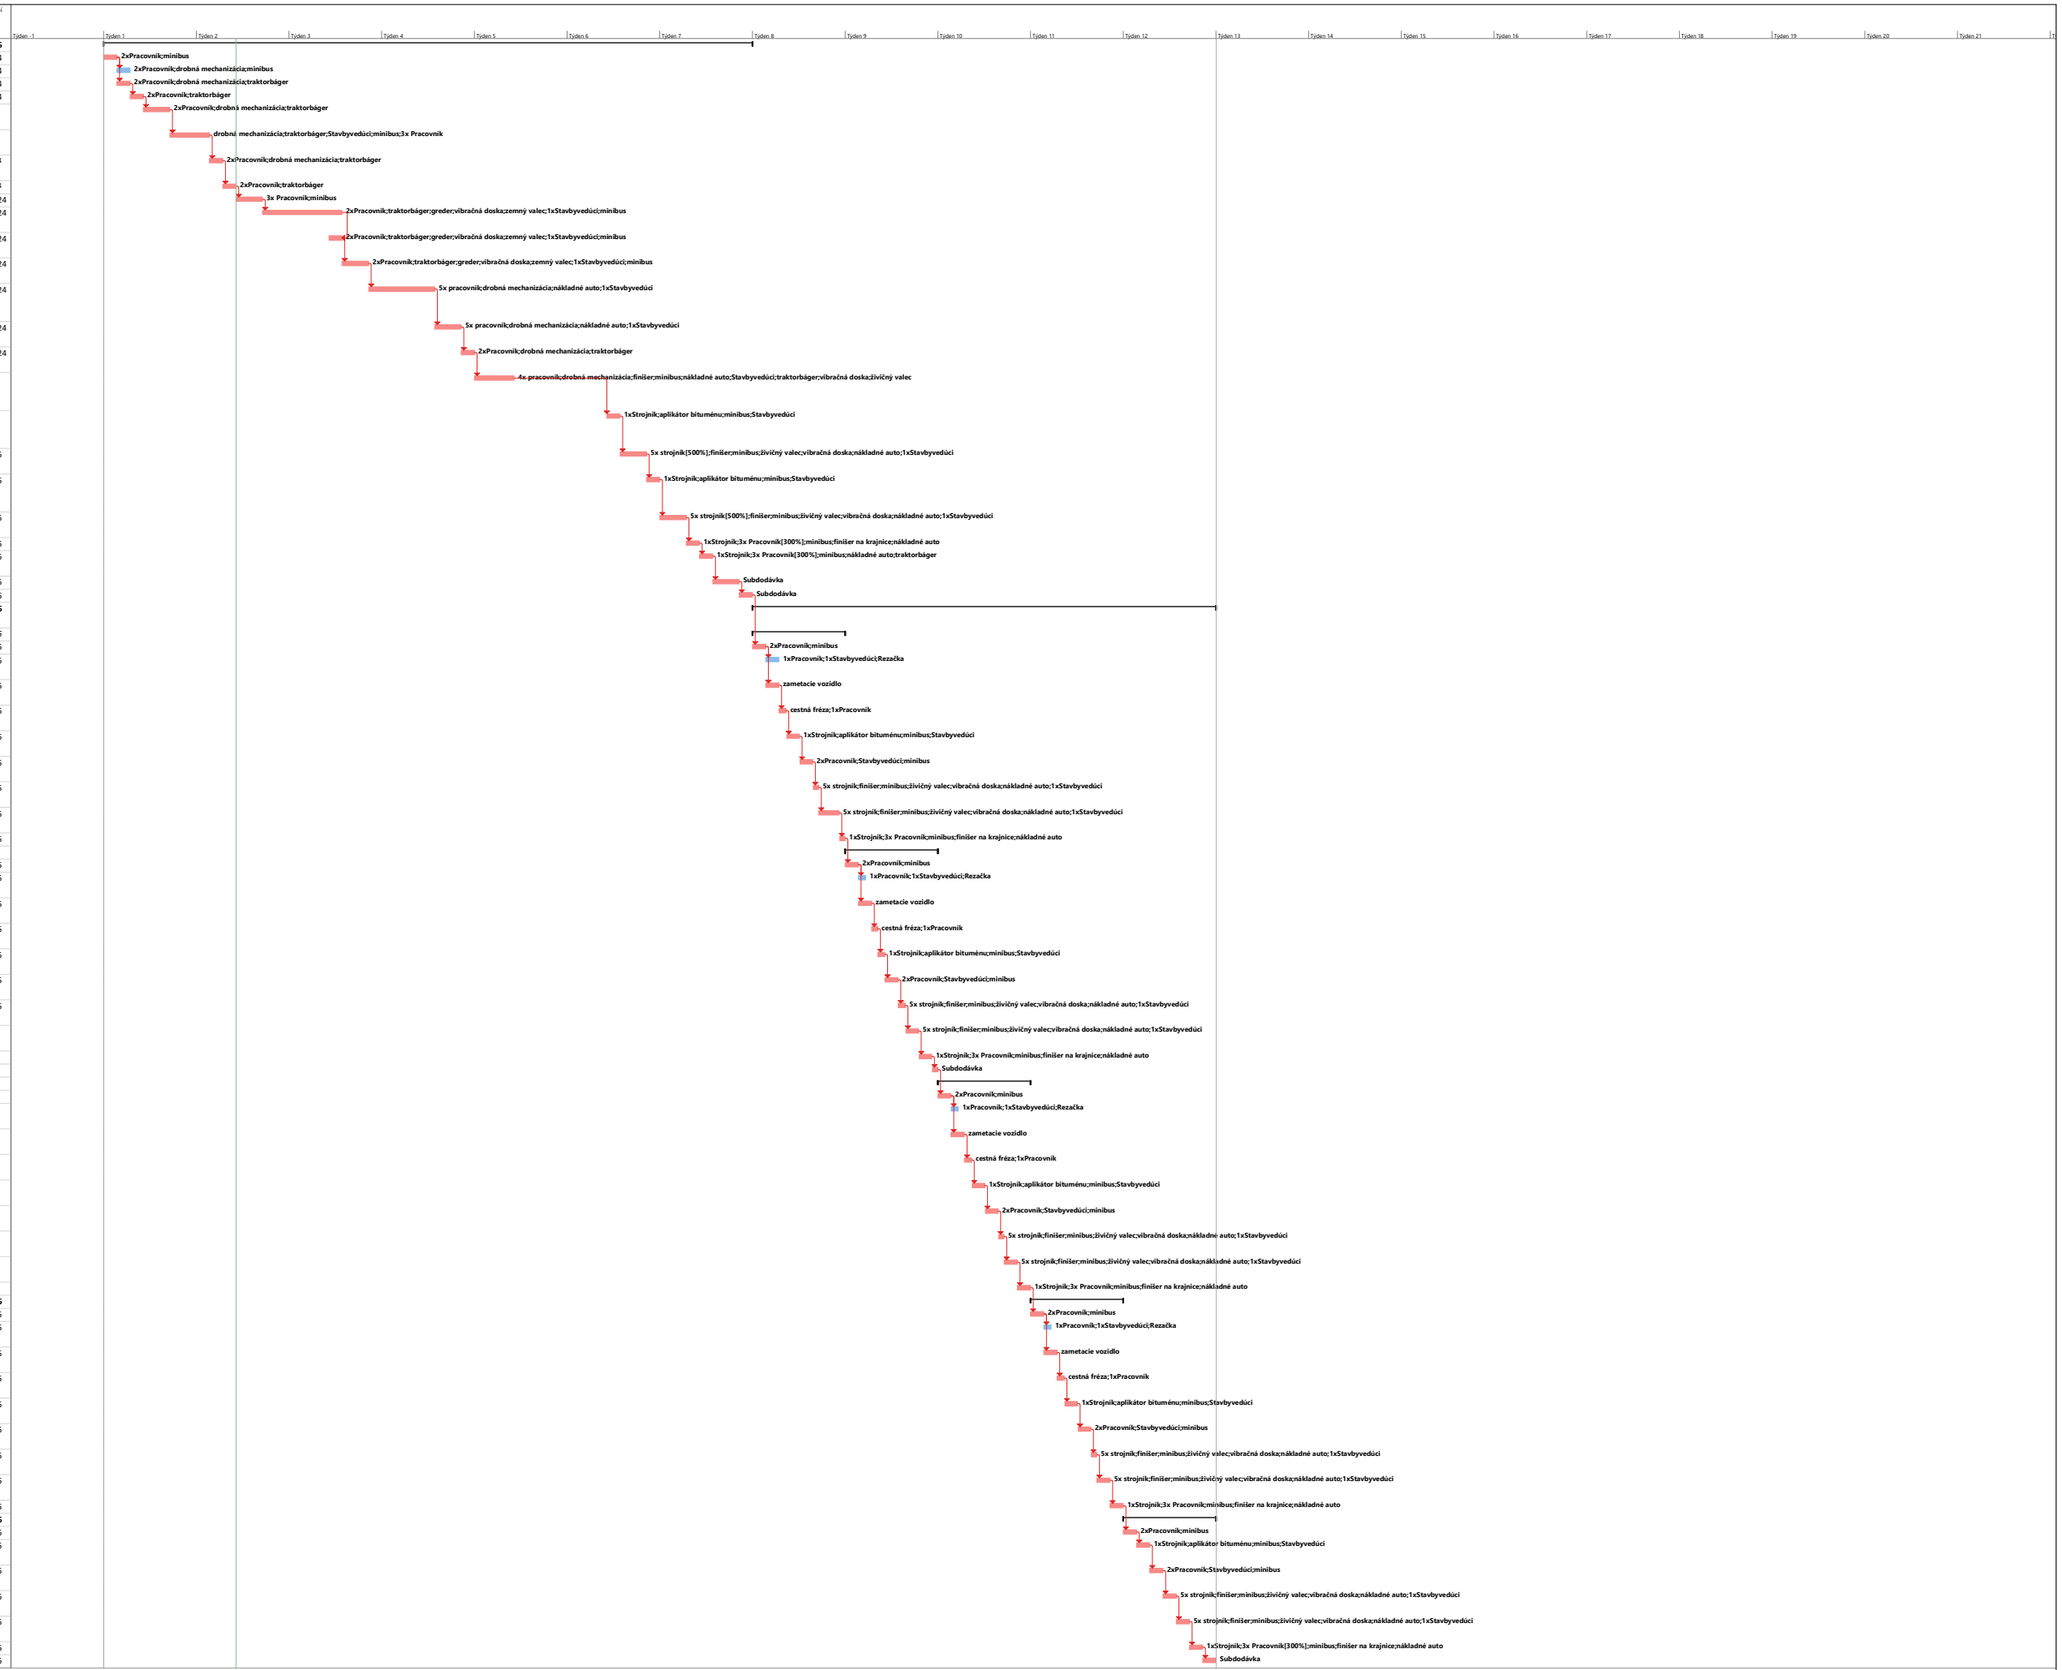ID	Režim úloh	Názov úlohy	MJ	Množstvo	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1		**Technická infraštruktúra pre IBV**			**49 dny**	**2.12. 24**	**19.1. 25**
2		Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	1	1 den	2.12. 24	2.12. 24
3		Búranie konštrukcií z betónu a dlažby	m3	20,3	1 den	3.12. 24	3.12. 24
4		Búranie rúrového priepustu	m	5,5	1 den	3.12. 24	3.12. 24
5		Výkopy jám a rýh	m3	57	1 den	4.12. 24	4.12. 24
6		Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 600 mm	m	9	2 dny	5.12. 24	6.12. 24
7		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	58	3 dny	7.12. 24	9.12. 24
8		Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	1	1 den	10.12. 24	10.12. 24
9		Násyp zeminy pod chodníky	t	58,48	1 den	11.12. 24	11.12. 24
10		Zhotovenie vrstvy z geotextílie	m2	2614,4	2 dny	12.12. 24	13.12. 24
11		Podklad zo štrkodrvy fr. 0/63 s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	1766,7	6 dny	14.12. 24	19.12. 24
12		Podklad zo štrkodrvy fr. 0/32 s rozprestrením a zhutnením hr. 150 mm	m2	165	1 den	19.12. 24	19.12. 24
13		Podklad zo štrkodrvy fr. 0/32 s rozprestrením a zhutnením hr. 200 mm	m2	314	2 dny	20.12. 24	21.12. 24
14		Osadenie cest. Obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 12/15 do lôžka z betónu hr. 100 mm	m	519	5 dny	22.12. 24	26.12. 24
15		Osadenie park. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	236	2 dny	27.12. 24	28.12. 24
16		Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN , š. do 20 cm, do bet. lôžka C 20/25, vrátane betónu	m	11	1 den	29.12. 24	29.12. 24
17		Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM C5/6,po zhutnení hr. 180 mm	m2	1385,8	3 dny	30.12. 24	1.1. 25
18		Postrek asfaltový infiltračný PI s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1385,8	1 den	9.1. 25	9.1. 25
19		Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. hrubozrnný AC 16 L, CA 50/70, II hr. 70mm	m2	1282,5	2 dny	10.1. 25	11.1. 25
20		Postrek asfaltový spojovací modifikovaný PSE bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	1282,5	1 den	12.1. 25	12.1. 25
21		Betón asfaltový nemodifikovaný po zhutnení I.tr. stredznozrnný AC 11 O, CA 50/70, II hr. 50mm	m2	1282,5	2 dny	13.1. 25	14.1. 25
22		Zhotovenie zemných krajníc	m3	20,6	1 den	15.1. 25	15.1. 25
23		Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m; výsev trávniku	m2	570,6	1 den	16.1. 25	16.1. 25
24		Zábradlie oceľové v= 1,1 m, (materiál+ montáž)	m	9	2 dny	17.1. 25	18.1. 25
25		Osadenie trvalého dopravného značenia	kpl	1	1 den	19.1. 25	19.1. 25
26		**Modernizácia a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov**			**35 dny**	**19.1. 25**	**23.2. 25**
27		**1A - Úsek č.1**			***7 dny***	*19.1. 25*	*26.1. 25*
28		Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	1	1 den	19.1. 25	20.1. 25
29		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100mm	m	17,5	1 den	20.1. 25	21.1. 25
30		Odstránenie blata, prachu a nánosu z povrchu podkladu	m2	335	1 den	21.1. 25	21.1. 25
31		Frézovanie asf. Podkladu alebo krytu bez prek. Plochy do 500 m2 s odvozom na skládku	m2	35	0,5 dny	22.1. 25	22.1. 25
32		Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	335	1 den	22.1. 25	23.1. 25
33		Geomreža pre vystuženie asfaltových vlákien komunikácii zo sklených vlákien	m2	335	1 den	23.1. 25	24.1. 25
34		Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. Nad 40 do 50 mm	m2	34	0,5 dny	24.1. 25	24.1. 25
35		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modif. Asfaltu tr. I, hr. 60 mm	m2	335	1,5 dny	25.1. 25	26.1. 25
36		Zhotovenie zemných krajníc	m3	3,24	0,5 dny	26.1. 25	26.1. 25
37		**1A - Úsek č.2**			**7 dny**	**26.1. 25**	**2.2. 25**
38		Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	1	1 den	26.1. 25	27.1. 25
39		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100mm	m	7,7	0,5 dny	27.1. 25	28.1. 25
40		Odstránenie blata, prachu a nánosu z povrchu podkladu	m2	1793	1 den	28.1. 25	28.1. 25
41		Frézovanie asf. Podkladu alebo krytu bez prek. Plochy do 500 m2 s odvozom na skládku	m2	15,4	0,25 dny	29.1. 25	29.1. 25
42		Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	1793	0,75 dny	29.1. 25	29.1. 25
43		Geomreža pre vystuženie asfaltových vlákien komunikácii zo sklených vlákien	m2	1793	1 den	30.1. 25	30.1. 25
44		Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. Nad 40 do 50 mm	m2	179,3	0,5 dny	31.1. 25	31.1. 25
45		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modif. Asfaltu tr. I, hr. 60 mm	m2	1793	1 den	31.1. 25	1.2. 25
46		Zhotovenie zemných krajníc	m3	16,68	1 den	1.2. 25	2.2. 25
47		Osadenie trvalého dopravného značenia	kpl	1	0,5 dny	2.2. 25	2.2. 25
48		**1A - Úsek č.3**			**7 dny**	**2.2. 25**	**9.2. 25**
49		Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	1	1 den	2.2. 25	3.2. 25
50		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100mm	m	6,7	0,5 dny	3.2. 25	4.2. 25
51		Odstránenie blata, prachu a nánosu z povrchu podkladu	m2	774	1 den	4.2. 25	4.2. 25
52		Frézovanie asf. Podkladu alebo krytu bez prek. Plochy do 500 m2 s odvozom na skládku	m2	13,4	0,5 dny	5.2. 25	5.2. 25
53		Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	774	1 den	5.2. 25	6.2. 25
54		Geomreža pre vystuženie asfaltových vlákien komunikácii zo sklených vlákien	m2	774	1 den	6.2. 25	7.2. 25
55		Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. Nad 40 do 50 mm	m2	77,4	0,5 dny	7.2. 25	7.2. 25
56		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modif. Asfaltu tr. I, hr. 60 mm	m2	774	1 den	8.2. 25	8.2. 25
57		Zhotovenie zemných krajníc	m3	6,144	1 den	9.2. 25	9.2. 25
58		**1A - Úsek č.4**			**7 dny**	**10.2. 25**	**16.2. 25**
59		Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	1	1 den	10.2. 25	10.2. 25
60		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100mm	m	9,2	0,5 dny	11.2. 25	11.2. 25
61		Odstránenie blata, prachu a nánosu z povrchu podkladu	m2	457,5	1 den	11.2. 25	11.2. 25
62		Frézovanie asf. Podkladu alebo krytu bez prek. Plochy do 500 m2 s odvozom na skládku	m2	18,3	0,5 dny	12.2. 25	12.2. 25
63		Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	457,5	1 den	12.2. 25	13.2. 25
64		Geomreža pre vystuženie asfaltových vlákien komunikácii zo sklených vlákien	m2	457,5	1 den	13.2. 25	14.2. 25
65		Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. Nad 40 do 50 mm	m2	45,8	0,5 dny	14.2. 25	14.2. 25
66		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modif. Asfaltu tr. I, hr. 60 mm	m2	457,5	1 den	15.2. 25	15.2. 25
67		Zhotovenie zemných krajníc	m3	6,534	1 den	16.2. 25	16.2. 25
68		**1A - Úsek č.5**			**7 dny**	**17.2. 25**	**23.2. 25**
69		Osadenie dočasného dopravného značenia	ks	1	1 den	17.2. 25	17.2. 25
70		Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	824	1 den	18.2. 25	18.2. 25
71		Geomreža pre vystuženie asfaltových vlákien komunikácii zo sklených vlákien	m2	824	1 den	19.2. 25	19.2. 25
72		Vyspravenie výtlkov asfaltovým betónom AC hr. Nad 40 do 50 mm	m2	82,4	1 den	20.2. 25	20.2. 25
73		Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modif. Asfaltu tr. I, hr. 60 mm	m2	824	1 den	21.2. 25	21.2. 25
74		Zhotovenie zemných krajníc	m3	12,03	1 den	22.2. 25	22.2. 25
75		Osadenie trvalého dopravného značenia	kpl	1	1 den	23.2. 25	23.2. 25
