Identifik		Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodcovia	Názvy zdrojov
1			**Prístavba MŠ a doplnenie obalových konštrukcií pôvodnej budovy MŠ v Pohronskej Polhore**	**109 dni**	**Po 3.4.23**	**Št 31.8.23**		
2			**Prístavba MŠ**	**106 dni**	**Po 3.4.23**	**Po 28.8.23**		
3			Zemné práce	3 dni	Po 3.4.23	Str 5.4.23		
4			Zakladanie	5 dni	Št 6.4.23	Str 12.4.23	3	
5			Zvislé konštrukcie	20 dni	Št 13.4.23	Str 10.5.23	4	
6			Vodorovné konštrukcie	20 dni	Št 11.5.23	Str 7.6.23	5	
7			Úpravy povrchov	20 dni	Št 29.6.23	Str 26.7.23	8	
8			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 dni	Št 8.6.23	Str 28.6.23	6	
9			Izolácie proti vode a vlhkosti	3 dni	Št 13.4.23	Po 17.4.23	4	
10			Izolácie tepelné	5 dni	Št 11.5.23	Str 17.5.23	16	
11			Zdravotechnika	5 dni	Št 18.5.23	Str 24.5.23	18	
12			Ústredné vykurovanie	5 dni	Št 18.5.23	Str 24.5.23	18	
13			Tesárske konštrukcie	15 dni	Ut 18.4.23	Po 8.5.23	9	
14			Drevostavby	10 dni	Št 25.5.23	Str 7.6.23	15	
15			Klampiarske konštrukcie	10 dni	Št 11.5.23	Str 24.5.23	16	
16			Krytiny tvrdé	2 dni	Ut 9.5.23	Str 10.5.23	13	
17			Stolárske konštrukcie	3 dni	Ut 9.5.23	Št 11.5.23	13	
18			Konštrukcie kovové doplnkové	5 dni	Št 11.5.23	Str 17.5.23	16	
19			Podlahy z dlaždíc	5 dni	Št 27.7.23	Str 2.8.23	7	
20			Podlahy vlysové a parketové	3 dni	Št 3.8.23	Po 7.8.23	19	
21			Podlahy povlakové	2 dni	Ut 8.8.23	Str 9.8.23	20	
22			Dokončovacie práce a obklady	8 dni	Št 10.8.23	Po 21.8.23	21	
23			Nátery	5 dni	Št 8.6.23	Str 14.6.23	14	
24			Maľby	5 dni	Ut 22.8.23	Po 28.8.23	22	
25			Elektromontáže	15 dni	Št 18.5.23	Str 7.6.23	18	
26			**Vylepšenie energetických vlastností pôvodnej budovy MŠ v Pohronskej Polhore**	**46 dni**	**Št 29.6.23**	**Št 31.8.23**		
27			Zemné práce	5 dni	Št 29.6.23	Str 5.7.23	7SS	
28			Zakladanie	3 dni	Št 29.6.23	Po 3.7.23	7SS	
29			Komunikácie	5 dni	Ut 25.7.23	Po 31.7.23	38	
30			Úpravy povrchov	25 dni	Ut 11.7.23	Po 14.8.23	32	
31			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 dni	Ut 11.7.23	Po 14.8.23	32	
32			Izolácie proti vode a vlhkosti	5 dni	Ut 4.7.23	Po 10.7.23	28	
33			Izolácie striech , povlakové krytiny	5 dni	Ut 11.7.23	Po 17.7.23	32	
34			Izolácie tepelné	10 dni	Ut 18.7.23	Po 31.7.23	33	
35			Zdravotechnika	2 dni	Str 9.8.23	Št 10.8.23	37	
36			Konštrukcie tesárske	5 dni	Ut 1.8.23	Po 7.8.23	34	
37			Drevostavby	1 deň	Ut 8.8.23	Ut 8.8.23	36	
38			Konštrukcie klampiarske	5 dni	Ut 18.7.23	Po 24.7.23	33	
39			Krytiny tvrdé	5 dni	Ut 11.7.23	Po 17.7.23	32	
40			Konštrukcie stolárske	3 dni	Ut 15.8.23	Št 17.8.23	31	
41			Konštrukcie kovové doplnkové	3 dni	Pi 18.8.23	Ut 22.8.23	40	
42			Montáž vzduchotechnických zariadení	1 deň	Ut 15.8.23	Ut 15.8.23	30	
43			Nátery	1 deň	Ut 25.7.23	Ut 25.7.23	38	
44			Maľby	1 deň	Str 26.7.23	Str 26.7.23	43	
45			Elektromontáže	7 dni	Str 23.8.23	Št 31.8.23	41	

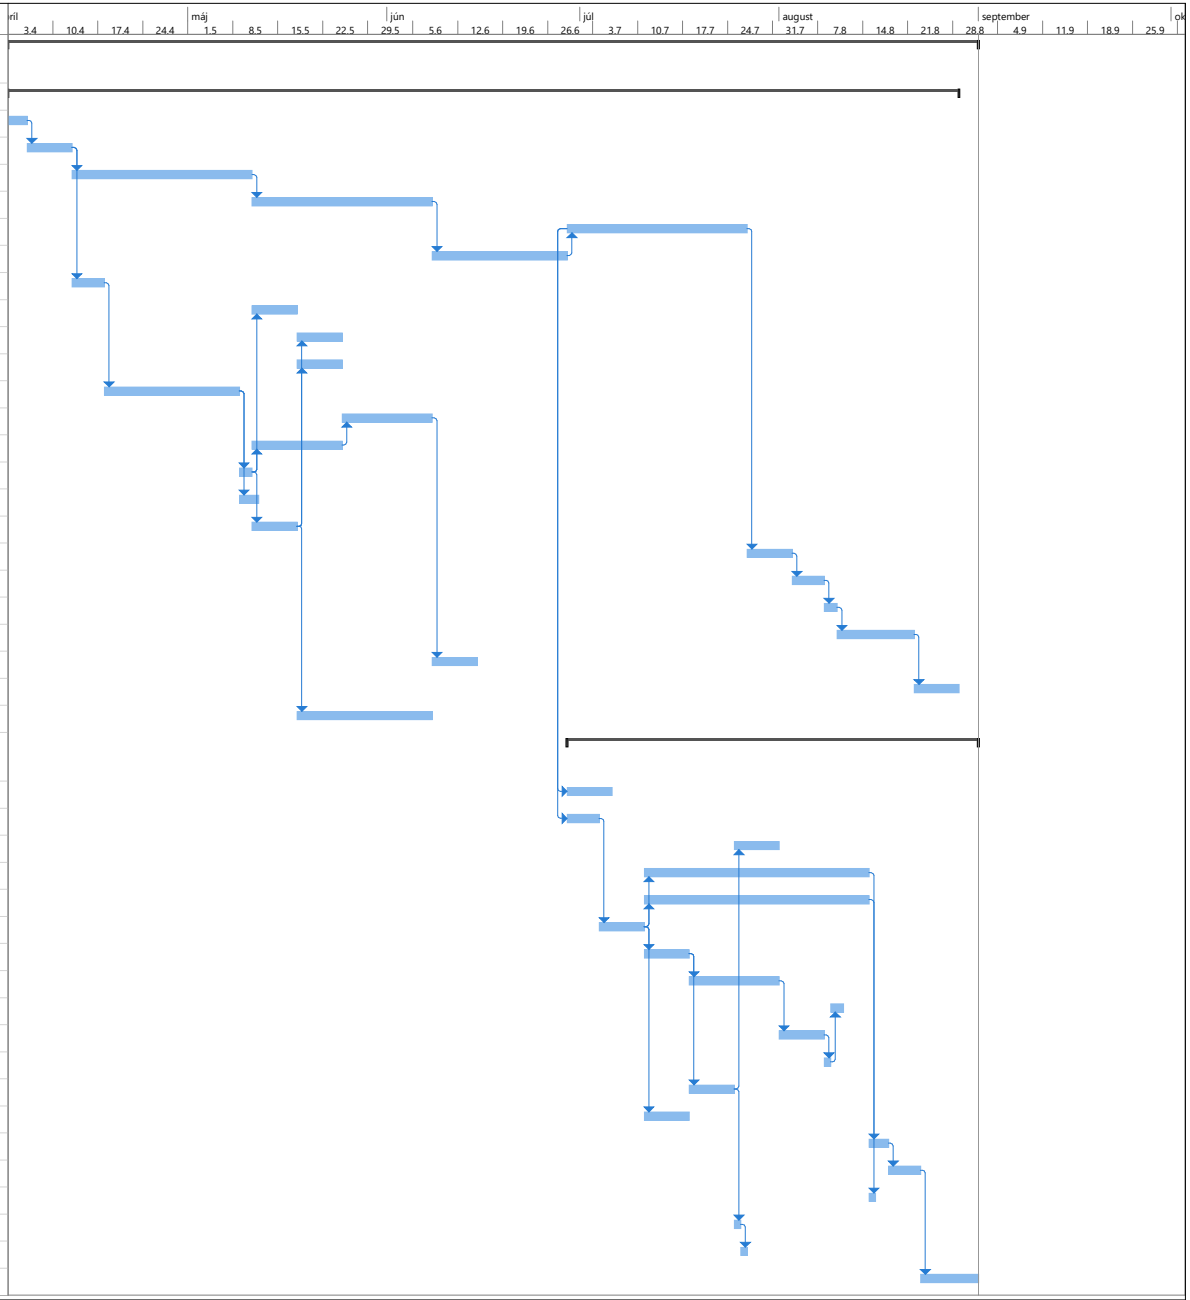

Harmonogram Prístavba MŠ v Pohronskej Polhore
Trvanie 109 pracovných dní bez sviatkov,sobôt
a nedieľ Pracovné dni v trvaní 8 hodín denne

Úloha | Súhrn | Neaktívny medzník | Iba trvanie | Iba začiatok | Externý medzník | Manuálny priebeh
Rozdeliť | Súhrn projektu | Neaktívny súhrn | Manuálny súhrn | Iba dokončiť | Termín
Medzník | Neaktívna úloha | Manuálna úloha | Manuálny súhrn | Externé úlohy | Priebeh
