Identifik	Názov	Trvanie (dni)	Trvanie (týždne)	Začiatok	Koniec
1	**Lesná cesta KOPANÁ s odbočkou - rekonštrukcia**	68 dní	14,6 týždne	Po 20.1.25	Str 30.4.25
2	Prevzatie staveniska a prípravné práce	0 týždne?		Po 20.1.25	
3	- Zriadenie ZS a vytyčovacie práce	5 dní	1 týždeň	Po 20.1.25	Pi 24.1.25
4	Zemné práce	50 dní	10 týždne	Po 27.1.25	Pi 4.4.25
5	- Odstraňovanie stromov, koreňov a krovín	16 dní	3 týždne	Po 27.1.25	Pi 14.2.25
6	- Odkopávky a prekopávky, vrátane odvozu na skládku	46 dní	9 týždne	Po 10.2.25	Pi 11.4.25
7	- Úprava pláne	46 dní	9 týždne	Po 10.2.25	Pi 11.4.25
8	- Terénne úpravy a svahovanie	44 dní	9 týždne	Št 27.2.25	Str 30.4.25
9	Realizácia priepustov	50 dní	10 týždne	Po 17.2.25	Pi 25.4.25
10	- Búranie starých priepustov	50 dní	10 týždne	Po 17.2.25	Pi 25.4.25
11	- Realizácia priepustov (montáž potrubia z PP rúr korugovaných)	50 dní	10 týždne	Po 17.2.25	Pi 25.4.25
12	Spevnené plochy	48 dní	10 týždne	Št 20.2.25	Str 30.4.25
13	- Reprofilizácia starého asfaltového krytu	0 týždne	8 týždne	Št 20.2.25	Str 16.4.25
14	- Podklad zo štrkodrvy	48 dní	9 týždne	Št 20.2.25	Str 23.4.25
15	- Stabilizácia hydraulickým spojivom	43 dní	9 týždne	Št 20.2.25	Str 23.4.25
16	- Realizácia konštrukčných vrstiev vozovky (penetračný makadam + náter)	38 dní	8 týždne	Št 6.3.25	Str 30.4.25
17	Dokončovacie práce	13 dní	2 týždne	Št 17.4.25	Str 30.4.25
18	- Osadenie smerových kolov	13 dní	2 týždne	Št 17.4.25	Str 30.4.25
19	- Zrušenie ZS	0 týždne?		Str 30.4.25	

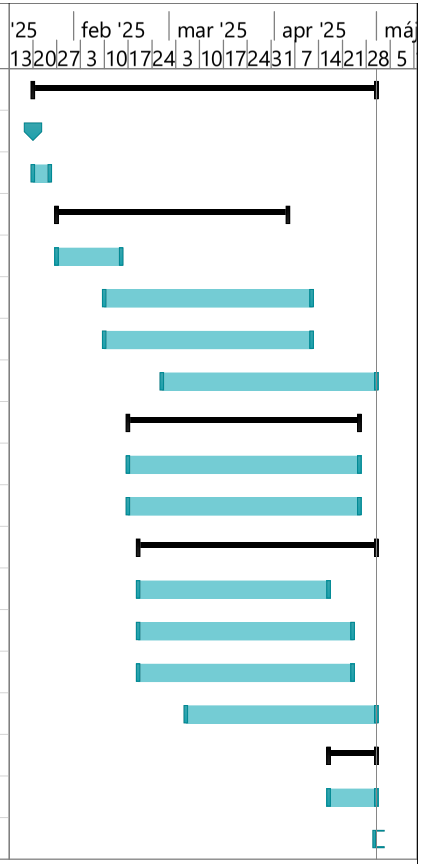

Harmonogram
Strabag s.r.o.

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

HMG je uvažovaný pri odovzdaní staveniska 20.1.2025. Postup prác závisí od vhodných klimatických a poveternostných podmienok.
