



**DODATOK č. 6**

(ďalej tiež len „Dodatok“ alebo „Dodatok č. 6“)

ktorým sa mení Zmluva o dielo:  
evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2015/0134  
evidenčné číslo Zhotoviteľa:

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na základe výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania  
**„Zhotovenie stavby Diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“**  
v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“  
(ďalej tiež len „Zmluva“ alebo „Zmluva o Dielo“)

**medzi zmluvnými stranami:**

**Objednávateľ:**

**Obchodné Meno:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT(BIC) kód:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax:

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava Slovenská republika

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné Meno:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT(BIC) kód:

IČO:

IČ DPH:

Tel./Fax:

**PORR s.r.o.**

Mlynské Nivy 49, 821 09 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzením, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 42018/B

Ing. Martin Hanáček, MBA – konateľ

Ing. Pavel Zuzula - konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné Strany“)

## Preambula

- a) Zmluvné Strany uzavreli dňa 07.04.2015 Zmluvu o Dielo evidovanú pod číslom Objednávateľa ZM/2015/0134 na predmet obstarávania „Zhotovenie stavby Diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina“ v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „červená kniha“.
- b) Zmluvné Strany uzavreli dňa 25.06.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je zmena kľúčových odborníkov Zhotoviteľa na pozíciách: riaditeľ stavby, hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci na mosty a autorizovaný geodet.
- c) Zmluvné Strany uzavreli dňa 11.02.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je úprava prvého časového a fakturačného mífniku Objednávateľa.
- d) Zmluvné Strany uzavreli dňa 08.08.2016 Dodatok č. 3 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je zmena kľúčových odborníkov Zhotoviteľa na pozíciách: hlavný stavbyvedúci a pracovník zodpovedný za kontrolu kvality.
- e) Zmluvné Strany uzavreli dňa 09.05.2017 Dodatok č. 4 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je úprava mífnikov Objednávateľa a predĺženie Lehoty výstavby.
- f) Zmluvné Strany uzavreli dňa 18.10.2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je:
1. Vytvorenie novej položky „Všeobecné položky - Staveniskové náklady zhotoviteľa - Zariadenie staveniska – Prevádzka – po pôvodnom ukončení Lehoty výstavby dohodnutej pri uzavretí Zmluvy o Dielo“ a navýšenie merného množstva v položke „Všeobecné položky – Zmluvné požiadavky – Poistenie“ a v položke „Všeobecné položky – Požiadavky Objednávateľa – Priestory a vybavenie Objednávateľa – prevádzka“
  2. Zhrnutie Stavebným dozorum vydaných pokynov na Zmenu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 a ich dopad na čerpanie položky pre Rezervu.
  3. Zmena kľúčového odborníka Zhotoviteľa na pozícií: stavbyvedúci na mosty.

Stavebný dozor vydal dňa 30.03.2022 Rozhodnutie Stavebného dozoru o predĺžení Lehoty výstavby listom č. 2285/21617/30921/2022, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 6. Na základe uvedeného zmluvné Strany uzatvárajú tento Dodatok č. 6.

Tento Dodatok č. 6 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO“).

## Článok I. Úvodné ustanovenia

Zmluvné Strany sa v zmysle bodu 14 Zmluvy o Dielo dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 6 k Zmluve o Dielo, predmetom ktorého je **potvrdenie** predĺženia Lehoty výstavby.

## Článok II. Predĺženie Lehoty výstavby

1. Na základe Rozhodnutia Stavebného dozoru o predĺžení Lehoty výstavby listom č. 2285/21617/30921/2022, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 6 dochádza k predĺženiu Lehoty výstavby z nasledovných dôvodov:

- **Zmena zmluvy podľa ust. § 18 ods. 1 písm. c) ZVO**

Zmena Lehoty výstavby ako dôsledok zmeny technického riešenia na základe Pokynu Stavebného dozora č. 1 zo dňa 26.05.2015, kedy sa Objednávateľ v Dodatku č. 4 zaviazal do 15.08.2017 zabezpečiť platné stavebné povolenie, resp. zmenu stavby pred dokončením, ktorá najmä z dôvodov dlhotrvajúcich konaní na príslušných správnych orgánoch nebola zo strany Objednávateľa zabezpečená.

- **Zmena zmluvy podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) ZVO**

Predĺženie Lehoty výstavby spôsobilo viacero dôsledkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti so zmenou technického riešenia. Ide o nasledovné skutočnosti:

- i. prebytok vyťaženého materiálu a potreba nakladania s ním v súlade s platným novelizovaným zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch s účinnosťou od 01.01.2016 (novela nadobudla účinnosť počas platnosti Zmluvy o dielo);
- ii. realizácia vegetačných úprav až v jesennom agrotechnickom termíne;
- iii. zmena platnej legislatívy – nová vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá mení grafické zobrazenie dopravného určenia a ktorej dôsledkom bola povinnosť Zhotoviteľa získať nové dopravné určenie pre trvalé dopravné značenie na diaľnicu D1 a miestnu komunikáciu II/127

Z dôvodov uvedených vyššie sa zmluvné Strany dohodli, že bez vplyvu na nároky Zhotoviteľa ktoré mu vznikli z dôvodu predĺženia realizácie Diela, sa v Zmluve o Dielo, konkrétne v Prílohe k ponuke, Zväzok 2, časť (D), ktorá tvorí prílohu a súčasť Zmluvy o Dielo, mení položka „Lehota výstavby“ nasledovne:

Položka	Podčlánok Zmluvných podmienok	Údaj
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 2 367 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)

Aktualizovaný Harmonogram prác vrátane mífnikov č. 1, 2, 3 a 4 tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 6.

## Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 6

1. Tento Dodatok č. 6 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo neupravené týmto Dodatkom č. 6 zostávajú nedotknuté.
3. Tento Dodatok č. 6 tvorí súčasť Zmluvy o Dielo.
4. Zmluvné Strany sa dohodli, že podpisom tohto Dodatku č. 6 sú upravené len tie nároky Zhotoviteľa ktoré sú v Dodatku č. 6 priamo uvedené. Týmto Dodatkom č.6 nie sú dotknuté najmä nie však

výlučne sporné nároky Zhotoviteľa ako žalobcu, ktoré si Zhotoviteľ uplatňuje žalobou v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava IV, spis. značka 14Cb/12/2021. Uzatvorenie Dodatku č. 6 nepredstavuje dohodu o urovnaní sporných nárokov medzi zmluvnými Stranami.

5. Tento Dodatok č. 6 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
6. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku č. 6 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 6 sú:
  - i. Príloha č. 1 - Harmonogram prác v súlade s podčlánkom 8.3 *Harmonogram prác* Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok;
  - ii. Príloha č. 2 – list Stavebného dozora č. 2285/21617/30921/2022 zo dňa 30.03.2022.

V Bratislave, dňa 05. MÁJ 2022

V Bratislave, dňa 12. APR. 2022

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Ing. Vladimír Jachymčík, inž.**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
konateľ

**Mgr. Jaroslav Ivančo**  
podpredseda predstavenstva

**Ing. Pavol Luzula**  
konateľ



**Podľa rozdeľovníka**

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Dátum
LZ 00787_2021_Ace_TRIB LO 4030/11816/30301/2022	2285/21617/30921/2022		30.03.2022

**VEC: DIAĽNICA D1 BRATISLAVA - TRNAVA, KRIZOVATKA TRIBLAVINA  
Nárok Zhotoviteľa č. 63 – Rozhodnutie Stavebného dozoru o predĺžení Lehoty výstavby**

V súlade so ZoD podčlánkom 3.5 Rozhodnutia, 8.2 Lehota výstavby, 8.4 Predĺženie Lehoty výstavby a listom Objednávateľa č. 4030/11816/30301/2022 doručeného dňa 30.03.2022 vo veci Nároku Zhotoviteľa č. 63 o predĺžení Lehoty výstavby, Stavebný dozor rozhodol nasledovne:

V zmysle podčlánku 1.1.3.3. Lehota výstavby, Všeobecných zmluvných podmienok, Zmluvy o Dielo, ďalej podľa podčlánku 8.2 (Lehota výstavby), tak ako je uvedená v prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami), podľa podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby), ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác sa mení na 2 367 dní (t.j. 78 mesiacov). Ukončenie Lehoty výstavby sa mení z dátumu 13.06.2021 na dátum 4.11.2021.

K vyššie uvedenému rozhodnutiu Stavebného dozoru uvádzam nasledovné podrobnosti:

Okolnosti, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieval, že má v zmysle podčlánkov 20.1 (Nároky Zhotoviteľa) a 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby) ZoD nárok na predĺženie Lehoty výstavby:

- V dôsledku zmeny technického riešenia na základe požiadavky Objednávateľa vznikol na stavbe prebytok výkopového materiálu v rozsahu cca 180 000 m<sup>3</sup>.
- Zmena legislatívy - vošiel do platnosti Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2016 a podľa ust. § 77 odseku 4 tohto zákona je Osoba uvedená v odseku 3 (Objednávateľ) povinná stavebné odpady vznikajúce pri stavebnej činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe.

Na základe týchto skutočností Objednávateľ listom č. 5232/40414/30301/2020 zo dňa 4.5.2020 požiadal o vydanie pokynu SD vo veci nakladania s prebytočným materiálom stavby, jeho zhodnotení a uskladnení na parcelu č. 1698/5 v kat. území Chorvátsky Grob, LV č.1233 (Pokyn SD č. 35). 17.9.2020 Objednávateľ vyjadril nespokojnosť s postupom prác Zhotoviteľa vyplývajúcich s Pokynom SD č. 35 listom č. 5232/70750/2020 prijatým stavebným dozorom dňa 17.09.2020 a SD listom 2892/72750/30923/2020 zo dňa 21.09.2020 vyzval Zhotoviteľa k náprave. Zhotoviteľ odpovedal listom č. 00795/2020/Ace/TRIB s vysvetlením, že práce pokračujú inžinierskou činnosťou – povolenie výrubu drevín od OÚŽP. Následne Objednávateľ z dôvodu, že Zhotoviteľ vo veci pokynu nekoná, požiadal listom č. 5232/76571/30301/2020 dňa 6.10.2020 SD o zastavenie prác Zhotoviteľa súvisiacich s pokynom SD č. 35. Listom SD č. 2892/76999/30923/2020 bol vydaný pokyn Zhotoviteľovi na zastavenie prác. Zhotoviteľ listom č. 00819\_2020\_Ace\_TRIB prijatým dňa 9.10.2020 podrobne vysvetlil a vyvrátil tvrdenia Objednávateľa, že v danej veci nekoná a konštatoval, že je pripravený v prácach pokračovať v momente doručenia povolenia na výrub stromov a zároveň požiadal o vydanie pokynu na ďalší postup prác. Zhotoviteľ listom č. 01035\_2020\_Ace\_TRIB zo dňa 17.12.2020 požiadal aby mu Objednávateľ o vydanie pokynu ako má nakladať s prebytočným materiálom najneskôr do 07.01.2021 a upozornil, že inak

Podľa ZoD číslo Objednávateľa: ZM 2015/0135 Zväzok 3, časť 2 Všeobecné technicko-kvalitatívne požiadavky TKP časť 25 bod 4.2.1 sa vegetačné úpravy môžu realizovať až po úprave plôch a v zmysle bodu 4.6.1 je výsadbu možné realizovať v jarnom, alebo v jesennom agrotechnikom termíne. V našom prípade: marec - apríl, alebo september – november do príchodu mrazov. Vegetačné úpravy mal Zhotoviteľ odzrkadlené v HMG prác na 60 dní. Sadenie krikov a následne stromov mohol Zhotoviteľ z dôvodov uvedených vyššie začať realizovať až od 1.10.2021.

Listom č. 00787\_2021\_Ace\_TRIB bol dňa 6.10.2021 Stavebnému dozoru Zhotoviteľom predložený Priebežný nárok č. 63 so žiadosťou o rozhodnutie na predĺženie Lehoty výstavby v súlade so ZoD podčlánkom 3.5, kde Zhotoviteľ konštatoval, že SO 020-00 Vegetačné úpravy bude kompletne dokončený do 1.12.2021. Dňa 27.10.2021 boli Zhotoviteľom ukončené práce na SO 020-00, čo bolo potvrdené aj zápisom v stavebnom denníku a objekt bol v zmysle ZoD podčlánok 10.2 (Preberanie časti Diela) pripravený na prevzatie. Dňa 4.11.2021 Stavebný dozor vydal preberací protokol na SO 020-00 Vegetačné úpravy.

Za účelom dosiahnutia dohody predĺženia LV konzultoval Stavebný dozor s každou stranou a listom č. 2390/74660/330921/2021 zo dňa 4.11.2021 konštatoval, že dohoda zatiaľ nebola dosiahnutá a v súlade so ZoD podčlánok 20.1 SD vydal odpoveď - súhlas k podstate nároku. Následne prebiehali ďalšie rokovania k dohode o predĺžení LV.

Listom Objednávateľa č. 4030/11816/30301/2022 bol v zmysle ZoD podčlánok 3.1 a 3.5 Stavebnému dozoru udelený súhlas Objednávateľa k vydaniu rozhodnutia o úprave Lehoty výstavby.

S pozdravom

Hlavný stavebný dozor

**Prílohy :**

List Objednávateľa č. 4030/11816/30301/2022

**Rozdeľovník**



PORR, s.r.o.

Riaditeľ stavby  
Plynárska 1  
821 09  
Bratislava

Váš list číslo/zo dňa  
00247\_2019-Afi TRIB

Naše číslo  
3956/104733 /30923/2019

Vybavuje

Dátum  
6.11.2019

## VEĽKÁ DIAĽNICA D1 BRATISLAVA - TRNAVA, KRIZOVATKA TRIBLAVINA

### Oznámenie podľa čl. 3.5 o predĺžení Lehoty výstavby.

V zmysle ZOD ev.č. Objednávateľa ZM/2015/0134, Všeobecných zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom FIDIC (červená kniha) a Osobitných zmluvných podmienok, v súlade s podčlánkom 3.5 *Rozhodnutia*, podčlánkom 8.4 *Predĺženie lehoty výstavby a podčl. 13.3 Postup pri zmenách* Objednávateľ udelil listom č. 7171/99772/30301/2019 **súhlas** s Vašou žiadosťou o predĺženie Lehoty výstavby na 73 mesiacov a o posun míľnikov č. 3 a č. 4.

V zmysle listu Objednávateľa č. 7171/99772/30301/2019 zo dňa 8.10.2019, doručeného SD 18.10.2019 Stavebný dozor vydáva podľa článku 3.5 *Rozhodnutia* Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o Dielo oznámenie o dohode medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom na predĺžení Lehoty výstavby v naslednom znení:

V zmysle ZOD ev.č. Objednávateľa ZM/2015/0134, Všeobecných zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované Objednávateľom FIDIC (červená kniha), **sa Lehota výstavby v zmysle čl. 1.1.3.3 a čl. 8.4 Všeobecných zmluvných podmienok mení z 54 mesiacov, dohodnutých dodatkom č. 4 k ZoD ev.č. Objednávateľa ZM/2015/0134 na 73 mesiacov.** Ďalej sa v zmysle čl. 8.3 upravujú míľniky č. 3 a č. 4 dohodnuté v dodatku č. 4 a to nasledovne. **Míľnik č. 3 sa posúva na 12.10.2019 a míľnik č.4 na 16.8.2020.**

V zmysle článku 8.3 *Harmonogram prác* Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienok, Vás žiadam aktualizovať a predložiť harmonogram prác. Harmonogram prác žiadame spracovať v podrobnosti v zmysle ZoD Zv. 2, čl. 8.3 a Zv. 3 časť 1, článok 2.3.2, 2.3.2.1, 2.3.2.2.

S pozdravom

Hlavný stavebný dozor

#### Príloha

listy Objednávateľa č. 7171/99772/30301/2019 doručený dňa 18.10.2019

listy SD č. 3956/94495/30923/2019, 3956/90321/30923/2019

listy Zhotoviteľa č. PORR/NDS/TR/838, 00247\_2019-Afi TRIB

\* 3956/100733/30923/2019

Na vedomie


Main table containing multiple rows of data with columns for line numbers, dates, times, descriptions, durations, frequencies, and dates. Includes various program titles and technical specifications.




[Redacted]


[Redacted]


[Redacted]

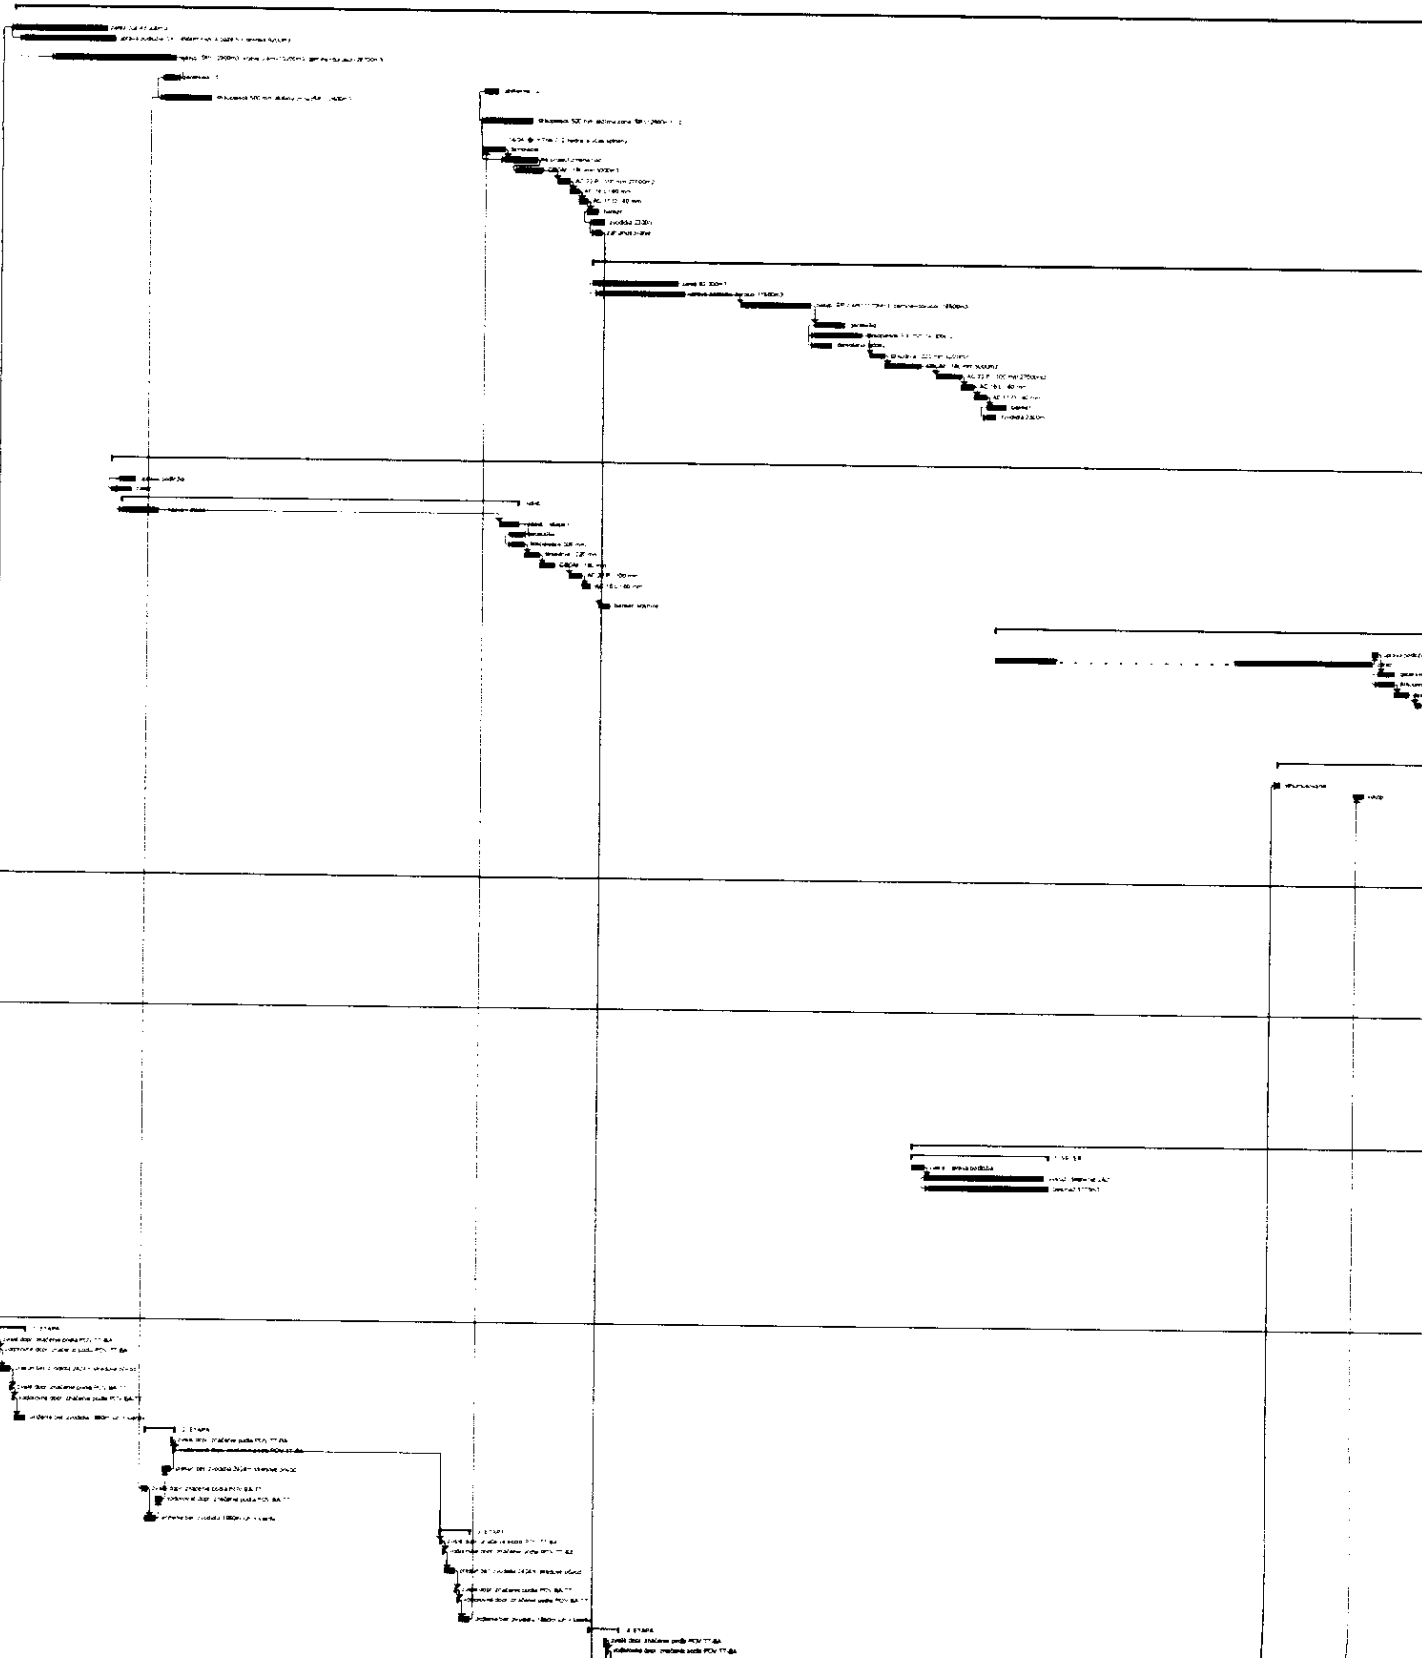

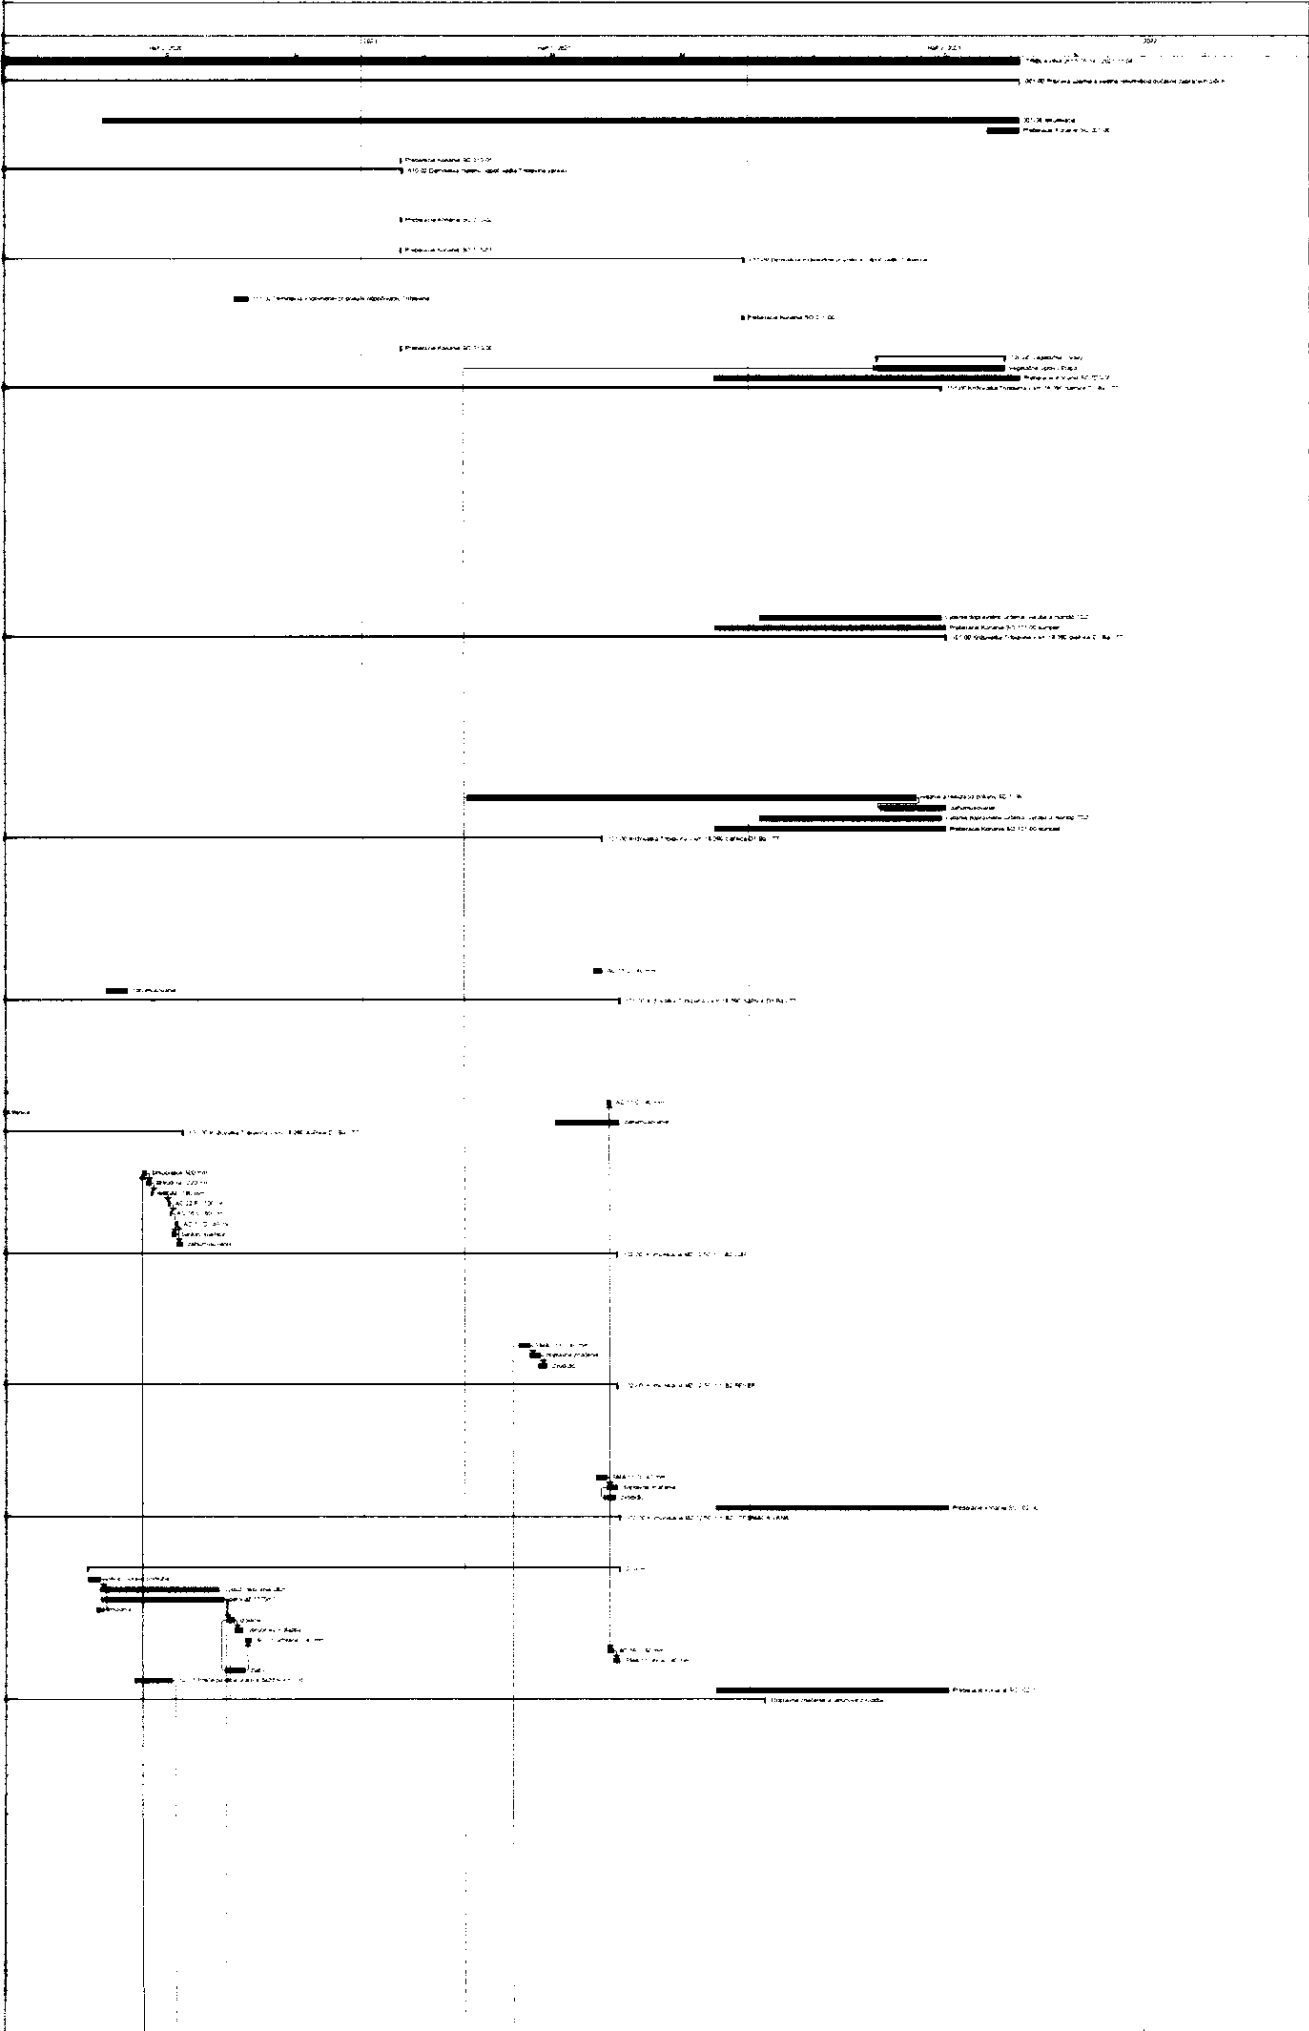



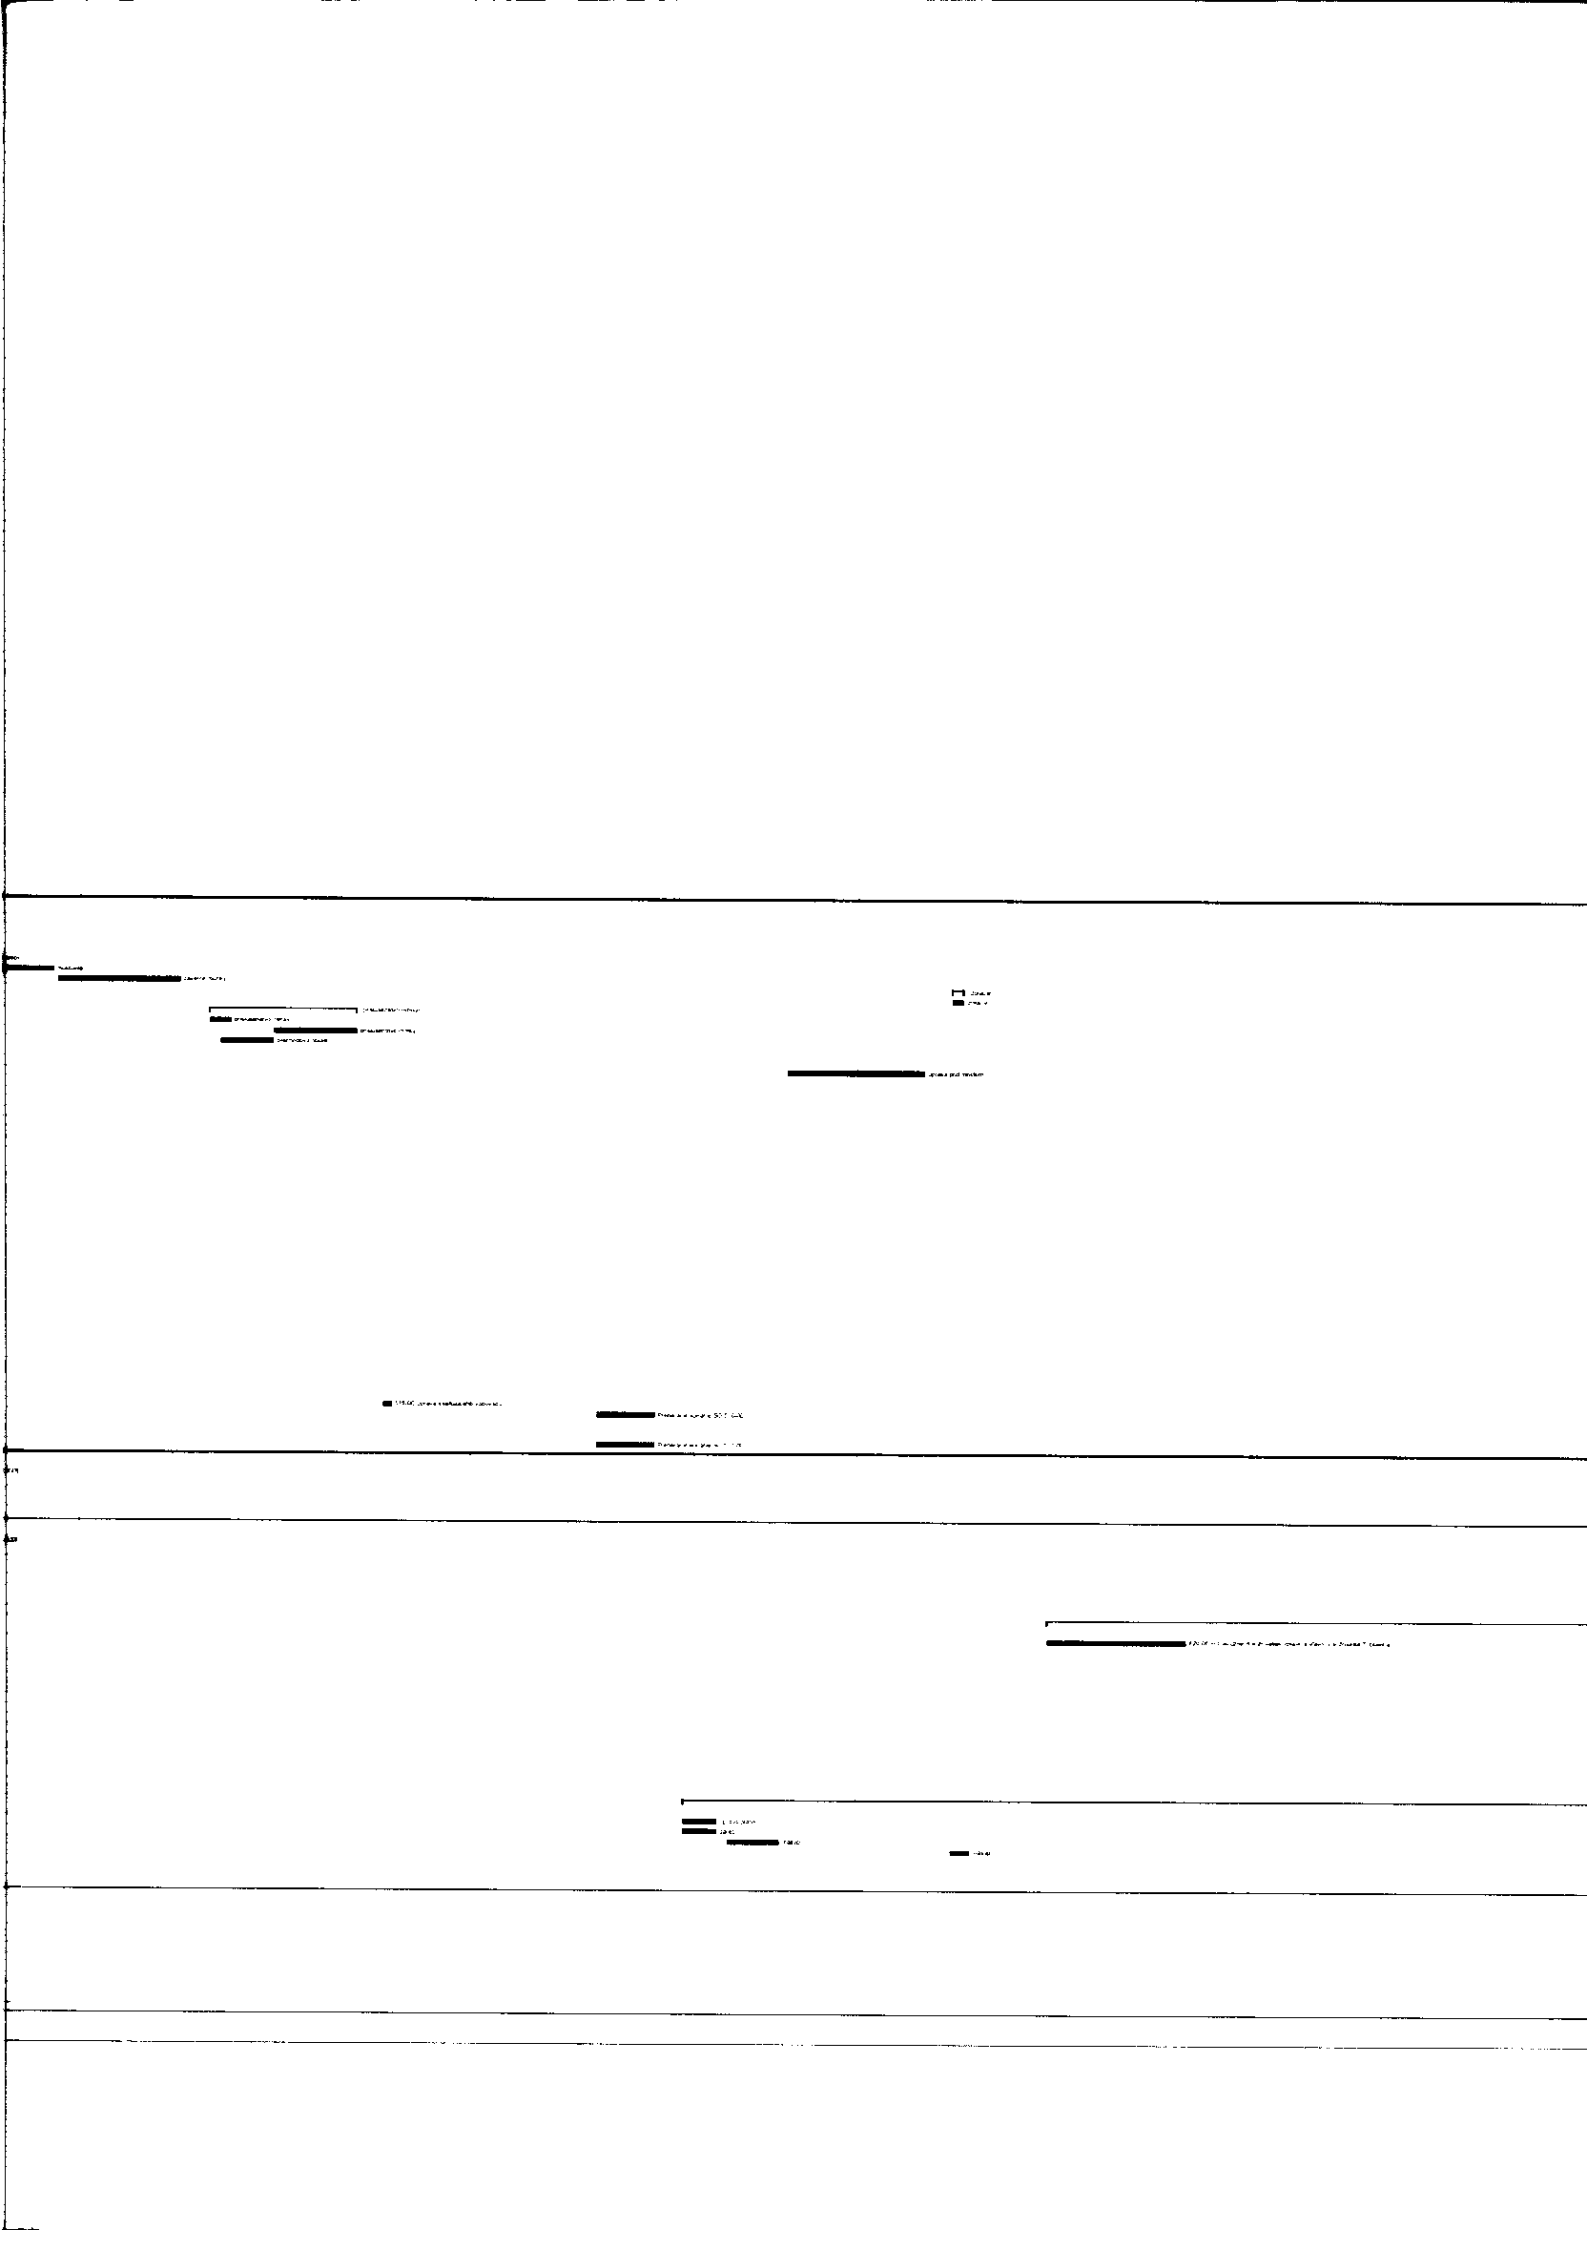

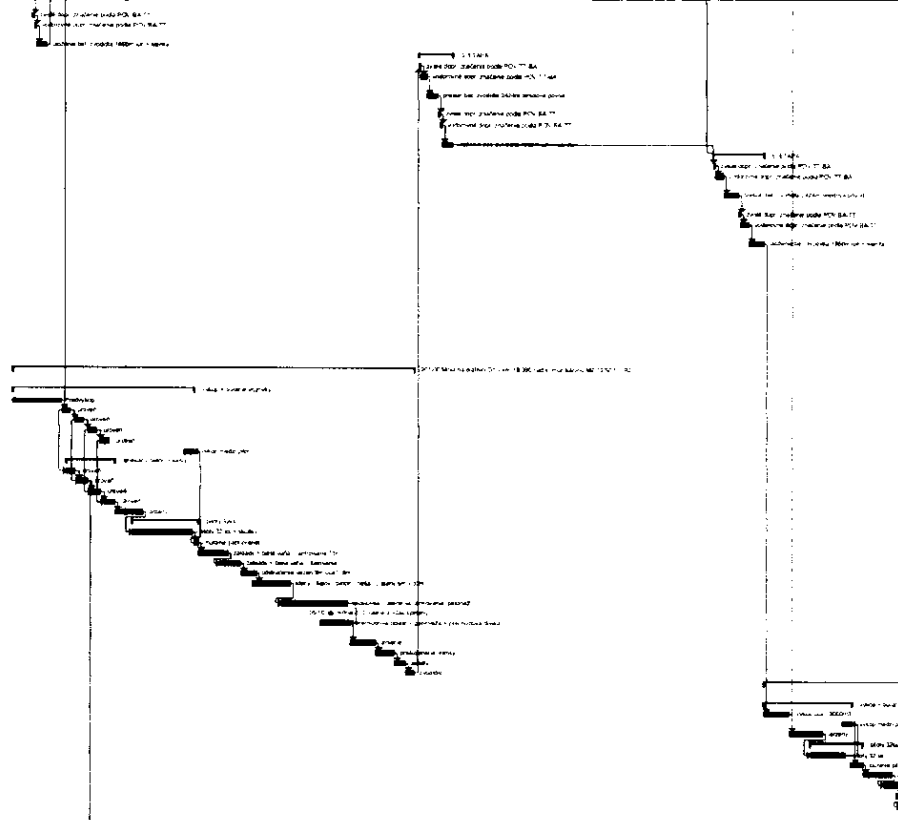

22.000 1/2" Dia  
 22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

22.000 1/2" Dia

