

Obec Kalinkovo
Hlavná 211
900 43 Kalinkovo

v Dunajskej Strede, dňa 26.10.2022

Vec:

Žiadosť o uzavretie dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 – úprava zmluvnej ceny

I.

Úspešný uchádzač/zhotoviteľ : **EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.**
Sídlo: **Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda**
Zastúpený: **Peter Lelkes, konateľ**
IČO: **50781570**
DIČ: **2120487886**
IČ DPH: **SK2120487886**
Bankové spojenie: **ČSOB**
IBAN: **SK2509000000005072515807**
Reg. č. z Obchodného registra **OR OS Trnava, oddiel Sro,, vložka č. 39555/T**

II.

Verejný obstarávateľ/Objednávateľ: **Obec Kalinkovo**
Sídlo: **Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo**
Zastúpený: **Jozef Konrád, starosta obce**
IČO: **00304841**
DIČ: **2020662149**

Z dole uvedeného Vás žiadame, ako verejného obstarávateľa o uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 – úprava zmluvnej ceny.

Obec Kalinkovo ako verejný obstarávateľ, a spoločnosť EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o. ako úspešný uchádzač, uzavreli dňa 24.01.2022 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „*Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO*“. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené Výzvou na predkladanie ponúk č. 27976 - WYP, Vestník č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021. Informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk zverejnenou vo vestníku verejného obstarávania 15989 – IPP, Vestník č. 65/2022 - 09.03.2022 verejný obstarávateľ identifikoval úspešného uchádzača spoločnosť EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o., IČO: 50781570, Kračanská cesta 690/23 , 92901 Dunajská Streda. Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie v máji 2021 a spoločnosť EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o. ako úspešného uchádzača identifikoval v marci 2022, **kedy už nemohol predvídať extrémny nárast vstupov ovplyvňujúcich cenu diela.**

Prílohy: Cenové ponuky na všetky dotknuté položky 27ks

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781570
EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.
Peter Lelkes, konateľ
Podpis žiadateľa

DODATOK Č. 1

KU ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 24.01.2022

uzatvorená v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	Obec Kalinkovo
Sídlo:	Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo
Štatutárny orgán:	Jozef Konrád, starosta obce
IČO:	00304841
DIČ:	2020662149

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno	EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Sídlo	Kračanská cesta 690/23 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	Peter Lelkes, konateľ
IČO:	50781570
DIČ:	2120487886
IČ DPH:	SK2120487886
Bankové spojenie:	ČSOB
IBAN:	SK2509000000005072515807
Reg. č. z Obchodného registra	OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 39555/T

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzavreli dňa 24.01.2022 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené Výzvou na predkladanie ponúk č. 27976 - WYP, Vestník č. 125/2021 zo dňa 25.05.2021.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava zmluvnej ceny diela z dôvodu extrémneho nárastu vstupov stavebných materiálov a zmena prílohy č. 3 Zmluvy o dielo – Zoznam subdodávateľov. Zmluvné strany postupujú pri uzatváraní dodatku v zmysle podmienok Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 06/2022 k zmenám zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v čase prípravy verejného obstarávania, t.j. v máji 2021 nemohol predvídať extrémny cenový nárast vstupov stavebných materiálov. Taktiež v čase uzavretia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022, t. j. v januári 2022 bola ešte cenová úroveň stavebných materiálov stabilná.

K extrémnemu nárastu cien tak došlo až po uzavretí Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022, pričom tento nárast predstavuje pri niektorých položkách nárast o desiatky percent a takýto nárast nemohla žiadna zo zmluvných strán v časti prípravy verejného obstarávania, resp. v čase uzavretia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 predvídať. Zhotoviteľ predložil pre každú dotknutú položku cenové ponuky subdodávateľov, čím objednávateľ ako verejný obstarávateľ overil hospodárnosť úpravy každej jednej položky.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že z dôvodov extrémneho nárastu cien stavebných materiálov nedochádza k plošnému paušálnemu nárastu ceny diela, ale úprava zmluvnej ceny diela je vykonaná len pre položky ktoré sú týmto nárastom dotknuté, pričom zhotoviteľ ku každej položke predložil objednávateľovi dôkazy o extrémnom náraste dotknutých položiek vo forme cenových ponúk, v počte 27 ks, ktoré doručil objednávateľovi dňa 26.10.2022 a súčasne ho požiadal dňa 26.10.2022 o uzavretie dodatku k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022

Potreba zmeny prílohy č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 vyplynula z doplnenia subdodávateľov k predmetu zákazky. Doplnení subdodávateľa spĺňajú podmienky osobitného postavenia v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že ku dňu podpisu tohto Dodatku č. 1 nedošlo porovnaním zmluvného harmonogramu ku omeškaniu prác na diele zo strany Zhotoviteľa.

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Bod 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 sa mení a nahrádza nasledovným:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovená dohodou podľa výkazu výmer dodaného objednávateľom, na základe cenovej ponuky resp. rozpočtu predloženého dodávateľom v maximálnej celkovej výške :

1 695 370,92EUR (s DPH)

slovom: (jeden milión šesťstodevätidesiatpäťtisíc tristosedemdesiat EUR a deväťdesiatdva centov)

Cena bez DPH 1 412 809,10 EUR; DPH 20 % 282 561,82 EUR

2. Príloha č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 sa dopĺňa a nahrádza novou prílohou č. 3 Zoznam subdodávateľov.


Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 zostávajú podpísom tohto Dodatku č. 1 nezmenené. Osobitne pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany prehlasujú, že uzavretím tohto Dodatku č. 1 nedošlo k zmene čl. V. Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022 s názvom „Čas plnenia“.
2. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 ako Príloha č. 1 je upravený aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu. Zmluvné strany podpísom tohto Dodatku č. 1 schvaľujú tento aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.1 sú tiež ako:

- Príloha č. 2 - Dôkazy o extrémnom náraste položiek vo forme cenových ponúk v počte 27 ks, ktoré doručil zhotoviteľ objednávateľovi dňa 26.10.2022, spolu so Žiadosťou o uzavretie dodatku zo dňa 26.10.2022 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022;
 - Príloha č.3 - Vyjadrenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor zo dňa 28.11.2022;
 - Príloha č. 4 – Vyjadrenie projektanta zo dňa 25.11.2022.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 ako príloha č. 5 je Zoznam subdodávateľov (nová verzia prílohy č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022).
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, a že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok č.1 podpisujú. Tento Dodatok č.1 tvorí pevnú a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022.
 6. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
 7. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na centrálnom registri zmlúv.

V Kalinkove, dňa 05.12.2022




Za objednávateľa

Jozef Konrád, starosta

Obec Kalinkovo



V Dunajskej Strede, dňa 2.12.2022



Za zhotoviteľa

Peter Leikes, konateľ

EUROPROJEKTDS –PLUS s.r.o.

Príloha č. 1: Upravený aktualizovaný výkaz výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov a krycieho listu

Príloha č. 2: Dôkazy o extrémnom náraste položiek vo forme cenových ponúk, v počte 27 ks, ktoré doručil zhotoviteľ objednávateľovi dňa 26.10.2022 spolu so Žiadosťou o uzavretie dodatku zo dňa 26.10.2022 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022

Príloha č. 3: Vyjadrenie osoby vykonávajúcej stavebný dozor zo dňa 28.11.2022

Príloha č. 4: Vyjadrenie projektanta zo dňa 25.11.2022

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov (nová verzia prílohy č. 3 Zmluvy o dielo zo dňa 24.01.2022)

Ing. Peter Šmotlák, Podlučinského 13, 821 03 Bratislava
mobil: 0903/ 808 264


Vec: Stanovisko stavebného dozora k dodatku č.1.

Dodatok č.1 obsahuje zmeny cien vstupných stavebných materiálov, ktoré vzhľadom na situáciu na Slovensku narástli. Toto navýšenie cien nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy o dielo predpokladať.

Zmeny cien-navýšenie sa týka iba použitých stavebných materiálov, ktoré obsahuje realizačná projektová dokumentácia. Tieto zmeny sú vyčíslené v aktualizovanom výkaze výmer, ktorý je súčasťou návrhu dodatku. Súčasťou dodatku sú aj cenové ponuky, ktoré predložil dodávateľ a dokumentujú nárast cien stavebných materiálov.

Tieto zmeny nemajú vplyv na predmet diela, zmenu materiálov a dobu výstavby.




Ing. Peter Šmotlák

V Bratislave, 28.11.2022

Obec Kalinkovo
Hlavná 211
900 43 Kalinkovo

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Vec: Vyjadrenie projektanta k žiadosti o uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 – úprava zmluvnej ceny dodávateľa stavby EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. :

Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

SÚHLASÍME s uzatvorením Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022 – úprava zmluvnej ceny medzi zhotoviteľom stavby EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. a objednávateľom Obec Kalinkovo, na základe predloženého rozpočtu dodávateľa k stavbe: „Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo – navýšenie cien“, vypracovaného dňa 25.10.2022 a dodávateľom priložených súvisiacich príloh:


- Návrh Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 24.01.2022
- Prílohy č. 1 – 27 (cenové ponuky subdodávateľov stavebných materiálov a výrobkov, ktoré budú zabudované na stavbe).

Dodávateľ týmto zdôvodnil zvýšenie jednotkových cien v predloženej rozpočte. Počas realizácie stavby nenastali zmeny v projekte stavby, ale berieme na vedomie, že od vyhlásenia verejného obstarávania, vyhláseného verejným obstarávateľom v máji 2021 extrémne rástli ceny stavebných materiálov a výrobkov a vybraný úspešný uchádzač / zhotoviteľ stavby – EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. tento rýchly rast cien nemohol predvídať pri podpise Zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom / objednávateľom.

Zvýšenie pôvodných cien podľa výkazu výmer, predloženého verejným obstarávateľom, je premietnuté do zvýšenia cien podľa vyznačených položiek v rozpočte, predloženej zhotoviteľom stavby.

Súhlasíme s navrhovanou cenou za zhotovenie diela zhotoviteľom stavby EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. v maximálnej celkovej výške 1 695 370,92 EUR - vrátane DPH, slovom: jeden milión šesťstodeväťdesiatpäťtisíc trisosedemdesiat EUR a deväťdesiatdva centov.

V Dunajskej Lužnej, dňa 25.11.2022



Ing. arch. Otto Csáder

Ing. Denisa Csáderová

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

1246

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo-
navyšenie cien

Miesto: Kalinkovo

Datum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:


Ročník:


Náklady z rozpočtov 1 284 994,26
Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00


Cena bez DPH 1 284 994,26


Cena s DPH 1 541 993,11

Zvýšená-pôvodná cena celková	Výpočet navyšenia celkovej ceny
1 412 809,10	127 814,84
0,00	0,00
1 412 809,10	127 814,84
282 561,87	25 561,87
1 541 993,11	153 377,81

Projektant: 28.10.2022
 Datum a podpis:  **Projektant**
 Datum a podpis: 

Objednávateľ: 31.10.2022
 Datum a podpis: 

Spracovateľ:
 Datum a podpis: 

Zhotoviteľ:
 Datum a podpis: 

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
 Sídlomiestnosť: 690 01 Bratislava, Družstevná 2081
 IČO: 50781570 IČDPH: SK2120187886
 * OBEC KALINKOVO *

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

1246

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo-
navýšenie cien

Kalinkovo #

Obec Kalinkovo

EUROPROJEKTD.S-PLUS s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Zvýšená prírodná cena náklady	Výpočet navýšenia celkovej ceny
1) Náklady z rozpočtov					
1246-1	Búracie práce , hlavný objekt S001 - Administratívna-prevádzková budova	1 284 994,26	1 541 993,11	1 412 809,10	127 814,84
1246-2		23 085,13	27 702,16	23 085,13	0,00
1246-21	Architektúra a statika	1 094 045,94	1 312 855,13	1 214 921,63	120 875,70
1246-22	Elektroinštalácia	826 759,48	992 111,38	926 725,63	99 966,16
1246-23	Slaboprúdové rozvody - štrukturovaná kábeláž	61 533,64	73 840,37	61 533,64	0,00
1246-24	Hlasová signalizácia požiaru	40 732,27	48 878,72	40 732,27	0,00
1246-25	Zdravotechnika	29 790,54	35 748,65	29 790,54	0,00
1246-25-1	ZTI- kanalizácia	43 778,19	52 533,83	43 778,19	0,00
1246-25-2	ZTI - vodovod a zariadenie predmety	11 654,36	13 985,23	11 654,36	0,00
1246-25-3	ZTI - plynovod	31 529,79	37 835,75	31 529,79	0,00
1246-26	Vykurovanie	594,04	712,85	594,04	0,00
1246-27	Vzduchotechnika	11 529,70	13 835,64	15 042,34	3 512,65
1246-3	S002 - Areálové spevnené plochy	79 922,12	95 906,54	97 319,01	17 396,89
1246-4	Sadové úpravy	74 822,11	89 786,53	74 822,11	0,00
1246-5	Vodovodná prípojka	31 656,71	37 988,05	38 595,85	6 939,14
1246-6	Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažďová kanalizácia	25 629,16	30 754,99	25 629,16	0,00
1246-7	Prídemie areálového NTL plynovodu	30 254,46	36 305,35	30 254,46	0,00
		5 500,75	6 600,90	5 500,75	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu					
		0,00	0,00		
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)		1 284 994,26	1 541 993,11	1 412 809,10	127 814,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-1 - Búracie práce , hlavný objekt

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:


IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				23 085,13
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				23 085,13
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 085,13	4 617,03
Cena s DPH		v EUR		27 702,16

Projektant

28.10.2022
Dátum a podpis: 
Pečiatka 

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

31.10.2022
Dátum a podpis: 
Pečiatka 

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 6 a/b, 22901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 507 1577 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis:  16.10.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-1 - Búracie práce , hlavný objekt

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	23 085,13
HSV - Práce a dodávky HSV	15 858,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 858,05
PSV - Práce a dodávky PSV	7 227,08
722 - Zdravotechnika	489,60
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	456,47
713 - Izolácie tepelné	1 500,43
764 - Konštrukcie klampiarske	423,26
766 - Konštrukcie stolárske	126,36
776 - Podlahy povlakové	2 549,74
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 681,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 085,13

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-1 - Búracie práce , hlavný objekt

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 085,13

HSV - Práce a dodávky HSV

15 858,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 858,05

1	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	336,086	2,98	1 001,54
2	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	336,086	0,99	332,73
3	K	952901111	Výčistenie po stavebných búracích prácach	m2	794,780	1,50	1 192,17
4	K	962031132	Búranie priecok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm - 0,196 t	m2	142,217	4,35	618,64
5	K	962032231	Búranie muriva naozakooveného z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu -1,905 t	m3	15,840	28,20	446,69
6	K	962052211	Búranie betónu železového - múrik, schody, rampa so zábradlím -2,400 t	m3	3,348	113,20	378,99
7	K	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových, panelov a vencov -2,400 t	m3	4,800	215,98	1 036,70
8	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lozka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	138,760	3,01	417,67
9	K	968062354	Vybúranie plastových okien a dverí plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	0,360	46,15	16,61
10	K	968062356	Vybúranie plastových okien a dverí plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	13,258	7,50	99,44
11	K	968062357	Vybúranie plastových okien a dverí plochy nad 4 m2-0,048 t	m2	56,760	6,20	351,91
12	K	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní a dverí -0,082 t	m2	28,482	12,70	361,72
13	K	968062558	Vybúranie kovových vrát -0,054 t	m2	2,860	11,70	33,46
14	K	968062745	Vybúranie drevených a plastových stien plných alebo zasklených -0,024 t	m2	25,707	5,10	131,11
15	K	968062991	Vybúranie drevených vnútorných obložení stien -0,004 t	m2	49,350	3,25	160,39
16	K	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr.do 450 mm -0,080 t	ks	8,000	10,45	83,60
17	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 450 mm -0,219 t	ks	10,000	15,56	155,60
18	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	5,670	4,49	25,46
19	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	0,624	44,59	27,82
20	K	976071111	Vybúranie kovových kcií - rebrík, oceľ.schod. zábradlie, mreža s dverami - 0,037 t	m	18,250	8,60	156,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	978059531	Odsekánie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	146,100	2,78	406,16
22	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	115,174	11,88	1 368,27
23	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	115,174	8,25	950,19
24	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 151,743	0,90	1 036,57
25	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km - do 20 km	t	2 303,487	0,45	1 036,57
26	K	97908724	Poplatok za skládku sute	t	115,174	35,00	4 031,09

PSV - Práce a dodávky PSV

7 227,08

722 - Zdravotechnika

489,60

27	K	7221722141	Uprava rozvodov vody a kanalizácie po demontáži	ks	24,000	20,40	489,60
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety

456,47

28	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	ks	13,000	19,35	251,55
29	K	725122813	Demontáž pisoára	ks	2,000	11,06	22,12
30	K	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry	ks	9,000	10,20	91,80
31	K	725820801	Demontáž batérie nástennej umyvadla, sprcha	ks	10,000	9,10	91,00

713 - Izolácie tepelné

1 500,43

32	K	713300852	Odstránenie tepelnej izolácie vrátane povrchovej úpravy fasády 0,03810t	m2	267,934	5,60	1 500,43
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

764 - Konštrukcie klampiarske

423,26

33	K	764322840	Demontáž odkvapov na strechach s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30°	m	17,000	1,05	17,85
34	K	764352810	Demontáž zlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30° rš 330 mm 0,0033t	m	27,000	1,25	33,75
35	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	92,695	2,38	220,61
36	K	764430840	Demontáž oplechovania murov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	93,240	1,62	151,05

766 - Konštrukcie stolárske

126,36

37	K	766694911	Demontáž parapetnej dosky, 0,002t	m	34,150	3,70	126,36
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	------	--------

776 - Podlahy povlakové

2 549,74

38	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	m2	632,690	4,03	2 549,74
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

783 - Dokončovacie práce - nátery

1 681,22

39	K	783902811	Ostatné práce odstránenie olejových náterov	m2	329,651	5,10	1 681,22
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Objekt: 1246-21 - Architektúra a statika

Objekt: 1246-21 - Architektúra a statika

Časť: 1246-21 - Architektúra a statika

Objekt: 1246-21 - Architektúra a statika

Objekt: 1246-21 - Architektúra a statika

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemné práce	7 507,40	7 507,40	0,00	7 507,40
2 - Zakladanie	16 343,05	16 343,05	4 774,88	21 117,93
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	65 660,70	65 660,70	19 817,55	85 478,25
4 - Vodorovné konštrukcie	76 903,21	76 903,21	17 670,39	94 573,60
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	142 559,55	142 559,55	2 699,45	145 259,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 946,22	21 946,22	0,00	21 946,22
99 - Presun hmôt HSV	22 107,68	22 107,68	0,00	22 107,68
PSV - Práce a dodávky PSV	472 879,47	472 879,47	55 003,89	527 883,36

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

712 - Izolácie stiech

713 - Izolácie tepelné

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

762 - Konštrukcie tesárske

763 - Konštrukcie - drevestavby a sadrokarton.konštr.

764 - Konštrukcie klampiarske

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

766 - Konštrukcie stolárske

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

771 - Podlahy z dlaždíc

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovacie práce a obklady

783 - Dokončovacie práce - nátery

784 - Dokončovacie práce - maľby

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

Zvýšená cena
cenníková

Výpočet
navýšenia
celkovej ceny

926 725,63	926 725,63	99 966,16
397 990,07	397 990,07	44 962,27
7 507,40	7 507,40	0,00
21 117,93	21 117,93	4 774,88
85 478,25	85 478,25	19 817,55
94 573,60	94 573,60	17 670,39
145 259,00	145 259,00	2 699,45
21 946,22	21 946,22	0,00
22 107,68	22 107,68	0,00
527 883,36	527 883,36	55 003,89
8 933,26	8 933,26	1 270,15
20 152,54	20 152,54	587,99
47 829,53	47 829,53	1 029,23
430,24	430,24	0,00
16 760,06	16 760,06	912,07
3 648,39	3 648,39	0,00
9 081,40	9 081,40	0,00
3 299,27	3 299,27	0,00
56 991,82	56 991,82	437,84
264 889,84	264 889,84	34 025,68
10 773,70	10 773,70	543,88
50 515,75	50 515,75	14 104,81
13 244,39	13 244,39	2 092,26
7 235,37	7 235,37	0,00
14 097,82	14 097,82	0,00
412,20	412,20	0,00
412,20	412,20	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Adaptácia, prístavba, prístavba a úpravy ZŠ Kráľovská nádvorná ulica
 1246 2 - 001 - Administratívna budova
Časť: 1246-21 - Architektúra a statika

JKSC: Kalinkovo
 Miesto: 25.10.2022
 Objednávateľ: Obec Kalinkovo
 Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
 Projektant:
 Spracovateľ:
 Kód: Datum: 25.10.2022
 IČO: IČO DPH:
 IČO: IČO DPH:
 IČO: IČO DPH:


Náklady z rozpočtu 826 759,48
 Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 826 759,48
 DPH základna 0,00
 daň 0,00
 celkom 826 759,48


Cena s DPH 992 111,38

185 345,13 19 993,23
 1 112 070,76 119 959,40

Zvýšená cena celková	Vypočet navyšenia celkovej ceny
926 725,63	99 966,16
926 725,63	99 966,16

Projektant: 
 Datum a podpis: 28.10.2022
 Spracovateľ:
 Datum a podpis:
 Pečiatka:
 Zhotoviteľ:
 Datum a podpis:
 Pečiatka:
 Objednávateľ:
 Datum a podpis: 10.2.2022

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 600, 83
 Slovenská republika
 IČO: 50781578 IČ DPH: 2120487886
 IČ DPH: SK2120487886



OST - Ostatné	440,00	440,00	0,00
OST - Ostatné	440,00	440,00	0,00
2) Ostatné náklady	0,00		
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	826.759,48	926.759,63	99.966,16

ROZPOČET

Časť: 1246-21 - Architektúra a statika

Dátum: 25.10.2022

Miesto: Kalinikovo

Objekt: Obec Kalinikovo
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTD+S PLUS s.r.o.

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

826 759,48

HSV - Práce a dodávky HSV

353 027,81

1 - Zemné práce

7 507,40

IPČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Zvýšená jednotková cena	Výpočet navýšenia jednotkovej ceny	Zvýšená celková	Výpočet navýšenia celkovej ceny
1	K	130201001	Výkop jamy a rýhy, ručné zacištenie 10 cm	m3	14,100	29,07	409,89	0,00	0,00	409,89	0,00
2	K	131201101	Výkop nezapažené jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	55,900	7,77	434,34	0,00	0,00	434,34	0,00
3	K	131201109	Pripätok za lepiivosť horniny 3	m3	55,900	0,80	44,72	0,00	0,00	44,72	0,00
4	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100m3	m3	50,112	7,30	365,82	0,00	0,00	365,82	0,00
5	K	132201109	Pripätok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	50,112	6,60	330,74	0,00	0,00	330,74	0,00
6	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	89,936	12,40	1 115,21	0,00	0,00	1 115,21	0,00
7	K	132201209	Pripätok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	89,936	0,78	70,15	0,00	0,00	70,15	0,00
8	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	217,148	1,80	426,87	0,00	0,00	426,87	0,00
9	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku úr. 1-4 do 10000 m	m3	182,948	5,90	1 079,39	0,00	0,00	1 079,39	0,00
10	K	167101102	Nákladanie neuhnutého výkopku z hornin úr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	182,948	1,50	274,42	0,00	0,00	274,42	0,00
11	K	1711011051	Doplnenie vrstvy zeminy pod objekt so zhutnením	m3	27,100	5,00	135,50	0,00	0,00	135,50	0,00
12	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	182,948	0,66	120,75	0,00	0,00	120,75	0,00
13	K	171201290	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	85,948	3,50	300,82	0,00	0,00	300,82	0,00
14	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	58,608	15,40	902,56	0,00	0,00	902,56	0,00
15	M	5834388600	Komenivo strik	€	107,663	13,00	1 399,62	0,00	0,00	1 399,62	0,00
16	K	181101102	Úprava plánie v horn. úr. 1-4 so zhutnením	m2	483,000	0,20	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00
							21 117,93	4 774,88			

2 - Zakladanie

16 343,05

17	K	271571111	Vankuse zhutnene pod základové pásy zo štrkopiesku	m3	14,100	29,00	408,90	0,00	0,00	408,90	0,00
18	K	274321411	Beton základových pasov železový (bez výstužeí), úr. C 20/25	m3	70,865	110,00	7 795,15	0,00	0,00	7 795,15	0,00
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	5,426	1 500,00	8 139,00	880,00	12 913,88	4 774,88	4 774,88
							21 117,93	4 774,88			

3 - Zvislé a kompletne konstrukcie

65 660,70

20	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzáklad., tehliam	m3	0,267	192,00	51,26	0,00	0,00	51,26	0,00
							85 478,25	19 817,55			

21	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m ² v murive paszklad. tehkami	m ³	2,243	183,60	411,81	183,60	0,00	411,81	0,00	0,00
22	K	310271300	Murivo z debnících tvárníc 50x15x25 s betónovou vyplňou hr. 19 cm	m ³	3,162	173,40	548,29	173,40	0,00	548,29	0,00	0,00
23	K	310271301	Murivo z debnících tvárníc 50x20x25 s betónovou vyplňou hr. 20 cm	m ³	20,925	168,30	3 521,68	168,30	0,00	3 521,68	0,00	0,00
24	K	310271302	Murivo z debnících tvárníc 50x25x25 s betónovou vyplňou hr.25 cm	m ³	24,165	165,20	3 992,06	165,20	0,00	3 992,06	0,00	0,00
25	K	310271303	Murivo z debnících tvárníc 50x30x25 s betónovou vyplňou hr. 30 cm	m ³	19,303	163,80	3 161,83	163,80	0,00	3 161,83	0,00	0,00
26	K	310272101	Predsedná stena z porobetonových tvárníc hr.200 mm	m ³	1,347	157,80	212,56	157,80	0,00	212,56	0,00	0,00
27	K	311101212	Prestupy v múroch s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m ²	ks	9,000	3,40	30,60	3,40	0,00	30,60	0,00	0,00
28	K	311101214	Prestupy v múroch s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m ²	ks	10,000	4,50	45,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00
29	K	311101215	Prestupy v múroch s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,20-0,4 m ²	ks	8,000	5,10	40,80	5,10	0,00	40,80	0,00	0,00
30	K	3112314831	Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 30 cm	m ³	83,035	139,00	11 541,87	239,89	90,89	19 088,58	7 546,71	0,00
31	K	3112314841	Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 25 cm	m ³	87,816	139,50	12 250,33	239,89	90,39	20 188,02	7 937,69	0,00
32	K	311321411	Betón nadvážkových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m ³	11,895	109,00	1 295,47	109,00	0,00	1 295,47	-0,01	0,00
33	K	311351105	Debnenie natzákladových múrov, stien a priečok zhotovených dielce	m ²	66,008	16,10	1 062,73	16,10	0,00	1 062,73	0,00	0,00
34	K	311351106	Debnenie natzákladových múrov, stien a priečok odstránenie-dielce	m ²	66,008	4,14	273,27	4,14	0,00	273,27	0,00	0,00
35	K	311361821	Výstuž 10505 žb stien a muriva z dobn. tvárníc	t	2,798	1 500,00	4 197,00	2 380,00	880,00	6 659,24	2 462,24	0,00
36	K	317161207	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	8,000	51,18	409,44	51,18	0,00	409,44	0,00	0,00
37	K	317161251	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	8,000	11,20	89,60	11,20	0,00	89,60	0,00	0,00
38	K	317161252	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	19,000	13,80	262,20	13,80	0,00	262,20	0,00	0,00
39	K	317941121	Osadenie oceľových konštrukcií	t	5,286	821,00	4 339,81	821,00	0,00	4 339,81	0,00	0,00
40	M	1333363000	Oceľ S235, stĺpy, platne, uholníky	t	5,286	2 200,00	11 629,20	2 200,00	0,00	11 629,20	0,00	0,00
41	K	330321410	Betón stĺpov a pilierov, tahadiel, rámových stĺpov, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m ³	3,223	115,00	370,65	115,00	0,00	370,65	0,00	0,00
42	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m ²	35,900	13,00	466,70	13,00	0,00	466,70	0,00	0,00
43	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m ²	35,900	4,80	172,32	4,80	0,00	172,32	0,00	0,00
44	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stĺpov z bet. ocele 10505	t	0,408	1 500,00	612,00	2 380,00	880,00	971,04	359,04	0,00
45	K	332318111	Vypinenie vnútorných dŕm oceľových stĺpov betonem	m ³	0,967	110,00	106,37	110,00	0,00	106,37	0,00	0,00
46	K	340239222	Zamurovanie otvorov pl.4 m ² v priečkach alebo stenách z tvárníc pálených P-D hr. 11,5 mm	m ²	11,660	25,30	295,00	25,30	0,00	295,00	0,00	0,00
47	K	342241175	Priečky z tehál pálených brúsených P-D hr. 15,00cm	m ²	19,694	25,40	500,23	25,40	0,00	500,23	0,00	0,00
48	K	342243103	Priečky z tehál pálených brúsených 11,5 P+D hr. 11,5 cm	m ²	137,389	23,20	3 071,42	23,20	11,42	4 583,31	1 511,89	0,00
49	K	342272102	Predsedná stena z porobetonových tvárníc hr. 100 mm	m ²	27,079	20,10	544,29	20,10	0,00	544,29	0,00	0,00
50	K	342272104	Predsedná stena z porobetonových tvárníc hr.150 mm	m ²	6,706	23,10	154,91	23,10	0,00	154,91	0,00	0,00

4 - Vodovonné konštrukcie

94 573,60 17 670,39

51	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škripín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	157,275	130,00	20 445,75	0,00	20 445,75	0,00
52	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	633,771	11,80	7 478,50	0,00	7 478,50	0,00
53	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	633,771	4,06	2 573,11	0,00	2 573,11	0,00
54	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	597,748	4,50	2 689,87	0,00	2 689,87	0,00
55	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	597,748	1,20	717,30	0,00	717,30	0,00
56	K	411361821	Dištančné prvky D5 100 stropov, po 0,6m	t	0,300	2 400,00	720,00	0,00	720,00	0,00
57	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	175,656	23,00	4 040,09	0,00	4 040,09	0,00
58	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	175,656	5,40	948,54	0,00	948,54	0,00
59	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - zhotovenie	m2	40,059	19,00	761,12	0,00	761,12	0,00
60	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - odstránenie	m2	40,059	4,70	188,28	0,00	188,28	0,00
61	K	417321515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	16,303	133,00	2 168,30	0,00	2 168,30	0,00
62	K	417351115	Debnenie bokov stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	121,335	8,80	1 067,75	0,00	1 067,75	0,00
63	K	417351116	Debnenie bokov stúžujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	121,335	3,70	448,94	0,00	448,94	0,00
64	K	411361821	Výstuž stropov, nosníkov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	19,283	1 500,00	28 924,50	880,00	45 893,54	16 969,04
65	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,744	135,00	1 180,44	0,00	1 180,44	0,00
66	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,797	1 500,00	1 195,50	880,00	1 896,86	701,36
67	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	38,026	17,90	680,67	0,00	680,67	0,00
68	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	38,026	4,70	178,72	0,00	178,72	0,00
69	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	31,622	12,11	382,94	0,00	382,94	0,00
70	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	31,622	3,57	112,89	0,00	112,89	0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

142 559,55 145 259,00 2 699,45

71	K	612421626	Vnútroštvá omietka väpenná v podlaží a v schodiskovej hladike	m2	1 412,800	8,50	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00
72	K	612456212	Vnútroštvá omietka stien cementová - pod keramic. obklady	m2	244,729	6,41	1 568,71	0,00	1 568,71	0,00
73	K	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia hr.3 mm	m2	1 412,800	4,65	6 569,52	0,00	6 569,52	0,00
74	K	6159811325	Dobrá vonkajších konštrukcií - ekstr. pevnosť hr. 200 mm	m2	143,419	58,20	8 346,99	0,00	8 346,99	0,00
75	K	620991121	Zakrytie výpoň vonkajších otvorov zhotovené z lešenia aluínikovek	m2	363,836	1,25	454,80	0,00	454,80	0,00
76	K	622464232	Vonkajšia omietka soier tenkovrstvová silikónová 1,5 mm proti plesiam a riasam s veľmi nízkou nasiakavosťou biela	m2	792,371	14,20	11 251,67	0,00	11 251,67	0,00
77	K	6224642321	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová 1,5 mm proti plesiam a riasam s veľmi nízkou nasiakavosťou žltá a antracit	m2	209,921	14,50	3 043,85	0,00	3 043,85	0,00
78	K	622466111	Príprava podkladu, prednáštrek pod omietky vonk.stien hr.cca 1 mm	m2	495,000	3,32	1 643,40	0,00	1 643,40	0,00

79	K	622466114	Prprava podkladu vonk.jestv. stien, hlboká penetrácia s vysokou mlierou hydroizbázcie	m2	368,222	1,68	618,61	0,00	618,61	0,00	0,00
80	K	625252513	Zateplovací systém min. vlna ostiená okien a dveri bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	m2	114,973	28,80	3 311,22	0,00	3 311,22	0,00	0,00
81	K	625252520	Zateplovací systém pre zdvojenie ľav. zateplenia, miner. vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm vrát. ukonč. profilov výplni otvorov a p. listů zatepovacia systém miner. vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm vrát. ukonč. profilov výplni otvorov a p. listů	m2	368,222	55,70	20 509,97	0,00	20 509,97	0,00	0,00
82	K	6252525201	Zateplovací systém minier. vlna bez povrchovej tenkovrstvej omietky celk. hr. 300 mm	m2	55,300	67,20	3 716,16	0,00	3 716,16	0,00	0,00
83	K	6252525202	Mazanina z betónu prostého hr.č. 18/20 hr.nad 120 do 250 mm	m3	106,810	118,80	12 689,03	0,00	12 689,03	0,00	0,00
84	K	631315611	Príplatok za sčrnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 250 mm	m3	106,810	2,31	246,73	0,00	246,73	0,00	0,00
85	K	631319175	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	32,158	10,14	326,08	0,00	326,08	0,00	0,00
86	K	631315101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	32,158	2,70	86,83	0,00	86,83	0,00	0,00
87	K	631315102	Výstuž mazanín a poterov z betónov (z kamienka) a z ľahkých betónov zo zväraných stecí KARI d8 x 150x150	t	5,767	1 336,00	7 704,71	0,00	7 704,71	0,00	0,00
88	K	631362021	Výstuž šírkový hr. 100 mm (pre spevnenie podkladu)	m3	38,318	34,00	1 302,81	0,00	1 302,81	0,00	0,00
89	K	631571003	Póter pieskovocementový hr. 64 a 65 mm	m2	340,610	13,00	4 427,93	0,00	4 427,93	0,00	0,00
90	K	632451057.	Póter pieskovocementový hr. 64 a 65 mm	m2	288,840	14,00	4 043,76	0,00	4 043,76	0,00	0,00
91	K	632451075	Póter pieskovocementový v späde hr. 40-100 mm	m2	30,450	18,20	554,19	0,00	554,19	0,00	0,00
92	K	632451058.	Doplnenie cementovetvo poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 40 mm	m2	30,260	14,56	440,59	0,00	440,59	0,00	0,00
93	K	632451441	Platy samonivelizačný poter hr.15mm	m2	683,140	12,10	8 290,19	0,00	8 290,19	0,00	0,00
94	K	632477001		m2				3,94	10 989,65		2 699,46
21 946,22											
95	K	931961151	Zvislé vložky do dŕiačacích skř. ext. povystyren hr. 20 mm	m2	58,906	7,32	431,19	0,00	431,19	0,00	0,00
96	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0, 80 do 1,00 m a výřky do 10 m	m2	1 207,679	2,97	3 586,81	0,00	3 586,81	0,00	0,00
97	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k.cene -1031	m2	3 623,037	1,95	7 064,92	0,00	7 064,92	0,00	0,00
98	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky 0,80-1,00 m a výřky do 10m	m2	1 207,679	0,90	1 086,91	0,00	1 086,91	0,00	0,00
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výřkou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	1 513,700	2,22	3 360,41	0,00	3 360,41	0,00	0,00
100	K	952901111	Výstuzenie budov pri výřke podlaží do 4m	m2	1 598,589	2,07	3 309,08	0,00	3 309,08	0,00	0,00
101	K	953943113	Posadenie ostatných výrobkov do murvä. so zaletím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	9,000	9,10	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00
102	M	449850181	Hosiace prístroje práčkove 6 kg	ks	9,000	35,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
103	K	953945111	Lišta rohová hliniková a profily s integrovanou sčtovinou	m	114,000	3,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
104	K	953945112	Profil ošetrový, ošetrový s integrovanou sčtkou	m	554,000	4,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00
105	X	970000111	Požiarne bezpečnostné značenie - smer úniku a východ	ks	40,000	3,80	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

95	K	931961151	Zvislé vložky do dŕiačacích skř. ext. povystyren hr. 20 mm	m2	58,906	7,32	431,19	0,00	431,19	0,00	0,00
96	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šířky od 0, 80 do 1,00 m a výřky do 10 m	m2	1 207,679	2,97	3 586,81	0,00	3 586,81	0,00	0,00
97	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia k.cene -1031	m2	3 623,037	1,95	7 064,92	0,00	7 064,92	0,00	0,00
98	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šířky 0,80-1,00 m a výřky do 10m	m2	1 207,679	0,90	1 086,91	0,00	1 086,91	0,00	0,00
99	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výřkou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	1 513,700	2,22	3 360,41	0,00	3 360,41	0,00	0,00
100	K	952901111	Výstuzenie budov pri výřke podlaží do 4m	m2	1 598,589	2,07	3 309,08	0,00	3 309,08	0,00	0,00
101	K	953943113	Posadenie ostatných výrobkov do murvä. so zaletím cementovou maltou, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	9,000	9,10	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00
102	M	449850181	Hosiace prístroje práčkove 6 kg	ks	9,000	35,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
103	K	953945111	Lišta rohová hliniková a profily s integrovanou sčtovinou	m	114,000	3,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00
104	K	953945112	Profil ošetrový, ošetrový s integrovanou sčtkou	m	554,000	4,00	2 216,00	0,00	2 216,00	0,00	0,00
105	X	970000111	Požiarne bezpečnostné značenie - smer úniku a východ	ks	40,000	3,80	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00

129	M	2837650060	Extrud polystyren XPS 3000 CS celk. hrúbka 380mm	m ²	296,915	51,56	15 308,94	0,00	15 308,94	0,00	0,00
130	M	2837650310	Extrud polystyren XPS 3000 CS celk. hrúbka 150mm	m ²	483,158	18,00	8 696,84	0,00	8 696,84	0,00	0,00
131	M	2837650050	Extrud polystyren XPS 3000 CS hrúbka 80mm	m ²	12,810	9,99	127,97	0,00	127,97	0,00	0,00
132	M	2837650051	Spádový extrud. polystyren hrúbka 20 70mm	m ³	0,669	249,00	166,58	37,00	191,33	24,75	0,00
133	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých (2x200mm)	m ²	191,030	2,22	424,09	0,00	424,09	0,00	0,00
134	M	2837651171	Tep. izol. doska z kamennej vlny hrúbka 200 mm, 50 ks/m ³	m ²	200,582	21,50	4 312,51	2,70	4 854,08	541,57	0,00
135	K	7131121112	Montáž tepelnej izolácie atiky vodorovne a zvislo	m ²	198,670	3,40	675,48	0,00	675,48	0,00	0,00
136	M	28376500601	Extrud polystyren hrúbka 100mm	m ²	62,606	13,64	853,95	0,44	881,49	27,54	0,00
137	M	28376500602	Extrud polystyren hrúbka 200mm	m ²	145,998	27,27	3 981,37	0,89	4 111,30	129,93	0,00
138	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie	m ²	360,900	1,01	364,51	0,00	364,51	0,00	0,00
139	M	6319124659	rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, ledninyštvo	m ²	378,945	9,02	3 418,08	0,00	3 418,08	0,00	0,00
140	K	713121121	Polystyren EPS, hrúbka 120mm	m ²	299,000	1,78	532,22	0,00	532,22	0,00	0,00
141	M	6319124651	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, 2 vrstvy	m ²	313,950	1,50	470,93	0,00	470,93	0,00	0,00
142	M	28376400001	Polystyren EPS 100S, hrúbka 20mm	m ²	313,950	4,27	1 340,57	0,18	1 397,08	56,51	0,00
143	K	713191120	Desky z elastifikovaného polystyrenu - ISOVER EPS FLOOR 5000 alebo iný ekvivalentný výrobok, hr. 40 mm	m ²	659,900	1,99	1 313,20	0,00	1 313,20	0,00	0,00
144	K	713191241	Izolácie tepelne podláh, stropov, stien prekrytím pásmom do výšky 100mm PE fólia	m ²	204,652	2,51	513,68	0,00	513,68	0,00	0,00
145	K	713191242	Izolácie tepelne stien - parozábrana Intelligentna membrána hr. 0,4 mm Delta Reflex alebo iný ekvivalentný výrobok	m ²	280,839	1,44	404,41	0,00	404,41	0,00	0,00
146	K	721111125	Izolácie tepelne stiech - parozábrana - parotná fólia z nízkohustotného polyetylénu (LD-PE), hr. 0,20 mm	m ²	78,631	8,17	642,42	0,00	642,42	0,00	0,00
147	M	2837651120	Montáž tepelnej izolácie	m ²	66,780	15,08	1 007,04	9,12	1 616,08	609,04	0,00
148	M	2837653150	rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien Tep. izol. doska z minerálne vlny hrúbka 200 mm	m ²	15,783	8,90	140,47	3,20	190,97	50,50	0,00
149	K	998713202	Izolácia int. stien hr. 100mm	%	1,400	468,00	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00
			Presun hmot pre izolácie tepelne v objektach výšky nad 6 m do 12 m								
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod							430,24		430,24	0,00	
150	K	722254116	Požiadané príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s príslušením, DN 25	ks	2,000	200,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
151	K	99872202	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektach výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	40,32	30,24	0,00	30,24	0,00	0,00
762 - Konštrukcie tesárske							15 847,99		16 760,06	912,07	
152	K	762211118	Drevené schody 4 stupne + zábradlie, š. ramena 1,075 m + obloženie	ks	1,000	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
153	K	762211119	Drevené schody, 2 stupne, š. ramena 0,92 m + obloženie	ks	1,000	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
154	K	762211120	Drevené schody, 2 stupne, š. ramena 1,54 m + obloženie	ks	1,000	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
155	K	762211121	Medzpodlažou a zábradlím, podlažia 3 vrst. biodoska 19mm - vid. 15 Detaily, výkazy mat.	ks	1,000	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00
156	K	762311103	Montáž kotvených želez, príložiek, patiek, ťahačiek, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	64,000	4,20	268,80	0,00	268,80	0,00	0,00

157	K	762332110	m	84,000	4,70	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ² .										
158	K	762332170	m	194,000	5,95	1 154,30	0,00	1 154,30	0,00	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ² .										
159	K	762332130	m	38,000	7,80	296,40	0,00	296,40	0,00	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm ² .										
160	K	762332140	m	30,000	8,40	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm ² .										
161	M	6051533602	m3	5,660	316,00	1 788,56	113,00	2 428,14	639,58	0,00
Hranaí smrekový impregnovaný ohoblovaný										
162	K	762342210	m2	101,756	1,02	103,79	0,00	103,79	0,00	0,00
Montáž debentila a latovania striech - kontrolaty rozbor 80-120 cm										
163	M	6051506900	m3	0,224	290,00	64,96	0,00	64,96	0,00	0,00
Hranolček mäkké rezivo impregnované 100-40 mm										
164	K	762395000	m3	5,884	30,00	176,52	0,00	176,52	0,00	0,00
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásova oceť, vruty, impregnácia										
165	K	762421220	m2	35,400	5,10	180,54	0,00	180,54	0,00	0,00
Montáž obloženia stropov alebo strešných podhľadov doskami tvrdými										
166	M	9959050015	m2	33,500	14,70	492,45	4,85	654,93	162,48	0,00
Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 18 mm (1250x3350mm)										
167	M	5959050017	m2	8,375	18,21	152,51	2,93	177,05	24,54	0,00
Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 22 mm (1250x3350mm)										
168	K	762431220	m2	66,600	4,07	271,06	0,00	271,06	0,00	0,00
Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými										
169	M	6072624000	m2	68,750	13,14	903,38	0,00	903,38	0,00	0,00
drevostruskový doska drevostrusková OSB 3 SE 2500x1250x12 mm										
170	K	762431500.01	m2	66,600	6,00	399,60	0,00	399,60	0,00	0,00
Montáž obloženia stien fasády - podkladový rošt a kontrolate pod obklad										
171	M	6051506901	m3	0,615	290,00	178,35	139,00	263,84	85,49	0,00
Hranolček mäkké rezivo impregnované										
172	K	762495000	m2	102,000	0,88	89,76	0,00	89,76	0,00	0,00
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, závrty										
173	K	762810036	m2	107,100	24,00	2 570,40	0,00	2 570,40	0,00	0,00
Základ stropov z dosiek OSB skrutkovaných hr. dosky 22 mm										
174	K	762812240	m2	15,200	5,13	77,98	0,00	77,98	0,00	0,00
Montáž záklapu z hoblovaných dosiek										
175	M	6051011502	m3	0,420	348,00	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
Tatranský profil hr.24 mm ohoblovaný										
176	K	762895000	m3	2,721	20,54	55,89	0,00	55,89	0,00	0,00
Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie										
177	K	998762202	%	4,500	139,95	629,78	0,00	629,78	0,00	0,00
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m										
763 - Konštrukcie - drevostavby a sadrokarton. konštr.										
178	K	763119210	m2	142,958	0,93	132,95	0,00	132,95	0,00	0,00
SDK - základný prenatravný náter (Grundierung)										
179	K	763147111	m2	2,440	21,05	51,36	0,00	51,36	0,00	0,00
Obklad sadrokartón, kanál, zvod, doska 88-12,5 mm										
180	K	763147114	m2	12,211	31,09	379,64	0,00	379,64	0,00	0,00
Obklad sadrokartón - kufre okolo svetelných doska GF 12,5 mm										
181	K	763161422	m2	97,779	23,60	2 306,40	0,00	2 306,40	0,00	0,00
SDK podhľad, kcia, doska GKF hr. 15 mm										
182	K	763161442	m2	30,578	24,50	749,16	0,00	749,16	0,00	0,00
SDK podhľad, kcia, doska GKF hr. 15 mm										
183	K	998763402	%	0,800	36,10	28,88	0,00	28,88	0,00	0,00
Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v saviach(objektoch) výšky od 7,60-12 m										
764 - Konštrukcie kľampiarske										
184	K	764252941	ks	1,000	149,80	149,80	0,00	149,80	0,00	0,00
Atková bočná vpusť terasy z PVC 100/100/800 - chránič										
185	K	7643112771	m2	193,300	21,00	4 059,30	0,00	4 059,30	0,00	0,00
Krytina a obklad stien z falc. plechu 0,6mm hladké										
							3 648,39	3 648,39	0,00	0,00
							3 648,39	3 648,39	0,00	0,00
							9 081,40	9 081,40	0,00	0,00
							9 081,40	9 081,40	0,00	0,00

186 K	764331240	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, murov na strechách z tvrdou krytinou rS 400 mm	m	23,400	9,00	210,60	0,00	210,60	0,00
187 K	764339310	Lemovanie - obloženie z plechu kominov	m ²	11,000	37,10	408,10	0,00	408,10	0,00
188 K	764332205	Žalaby z pozinkovaného PZ plechu poddivekovej polkruhové rS 400 mm	m	26,000	14,20	369,20	0,00	369,20	0,00
189 K	764339910	Žalaby z pozinkovaného PZ plechu, kotlík konický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30°	ks	3,000	13,90	41,70	0,00	41,70	0,00
190 K	764359941	Žalaby z pozink. Pz plechu, kotlík zberný na plochej streche pre rúry s D do 150 mm rozmerov do 300 mm	ks	4,000	30,49	121,96	0,00	121,96	0,00
191 K	764430230	Opiechovanie z pozinkovaného PZ plechu muriva a nadmuroviek vrátane obrob. rS do 800 mm	m	4,500	12,95	58,28	0,00	58,28	0,00
192 K	764430260	Opiechovanie z pozinkovaného PZ plechu muriva a nadmuroviek vrátane obrob. rS do 800 mm	m	132,000	19,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00
193 K	764430270	Opiechovanie z pozinkovaného PZ plechu muriva a nadmuroviek vrátane obrob. rS do 900 mm	m	16,500	22,60	372,90	0,00	372,90	0,00
194 K	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu kruhové s priemerom do 120 mm	m	50,000	12,28	614,00	0,00	614,00	0,00
195 K	998764202	Presun hmot. pre konštrukcie kľamparske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	88,19	167,56	0,00	167,56	0,00
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé						3 299,27		3 299,27	0,00
196 K	765315211	Krytina - prestrešenie terasy, platinie, priehľadný polykarbonát, uchytenie, lepenie	m ²	31,000	55,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00
197 K	765901301	Prerývité strechy a steny fóliou parapriepustnou Delta Vent 5 plus alebo iný ekvivalentný výrobok	m ²	185,192	2,10	388,90	0,00	388,90	0,00
198 K	7659013062	Prerývité strechy - štrukturovaná hydroizolácia a separačná fólia Delta Trella alebo iný ekvivalentný výrobok	m ²	139,370	7,20	1 003,46	0,00	1 003,46	0,00
199 K	998765202	Presun hmot. pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,100	33,10	201,91	0,00	201,91	0,00
766 - Konštrukcie stolárske						56 553,98		56 553,98	437,84
200 K	766411140	Drevená podlahá terasy z 2 schodmi - tepelne upravené drevo pri teplote min. 215°C ThermoWood, vrátane	m ²	28,900	68,00	1 965,20	0,00	1 965,20	437,84
201 K	766414121	Montáž stien s 2 kridl. dverami, dosky dreva, podkladného roštu v spáde	m ²	8,820	26,00	229,32	0,00	229,32	0,00
202 M	59590500171	Cementotritrikové dosky CE TRIS farba antracit - kovanie, dvere 2-kridl. 2,08x2,0 m	ks	1,000	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
203 K	766662312	Montáž otvárateľného kridla kompletiz otvárateľného z tvrdého dreva alebo smrekovca, jednokridlové	ks	29,000	10,25	297,25	0,00	297,25	0,00
204 M	6117103128	Drevené dvere vnútorné pinie, 60, 70x197 cm	ks	8,000	280,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00
205 M	6117103129	Drevené dvere vnútorné pinie, 80, 90x197 cm	ks	21,000	311,00	6 531,00	0,00	6 531,00	0,00
206 K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	29,000	32,49	942,21	0,00	942,21	0,00
207 M	6117103030	Drevená zárubňa pre jednokridlové dvere	ks	29,000	131,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00
208 K	766699312	Skolská tabuľa interaktívna s ultra krátkou projekciou	ks	12,000	2 400,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00
209 K	766699314	Skolská kartónová nástienka rozmer celkom 5,0x1,0 m	ks	14,000	777,00	10 878,00	0,00	10 878,00	0,00
210 K	998766202	Presun hmot. pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,600	565,00	452,00	0,00	452,00	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové						230 864,16		230 864,16	34 025,68

211	M	5534485201	ks	1,000	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	
<p>D-M osobný výtah, nosnosť 6/5 kg/9 osôb, zdvih 3630mm, rýchlosť 1,0 m/s, počet stanic / nastúpiť: 2/2 prechodný, riadenie mikroprocesorové Blonic 5, Pl jednoduche bez zberu, pohon trakčný, frekvenčne riadený ACVF, (napr. Schindler 3300 VP 675) alebo JmV.ek</p> <p>D-M oceľové zábradlie a schody, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, zmenám teplot, s</p> <p>D-M oceľové zábradlie a schody, rošt. podlaho, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, z</p> <p>D-M oceľové int. rozoberateľné zábradlie a schody, dier. stupne, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, z</p>										
212	M	5530000031	ks	1,000	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	
<p>D-M oceľové zábradlie a schody, rošt. podlaho, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, zmenám teplot, s</p>										
213	M	5530000033	ks	1,000	15 290,00	15 290,00	0,00	15 290,00	0,00	
<p>D-M oceľové zábradlie a schody, rošt. podlaho, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, z</p>										
214	M	5530000039	ks	1,000	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	
<p>D-M oceľové zábradlie a schody, rošt. podlaho, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, z</p>										
215	M	5530000040	ks	1,000	850,00	850,00	100,00	950,00	100,00	
<p>D-M ext. oceľové zábradlie rampy, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, zmenám teplot, s</p>										
216	M	5530000032	ks	1,000	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	
<p>D-M ext. oceľové zábradlie rampy, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, zmenám teplot, s</p>										
217	M	5530000041	ks	1,000	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	
<p>D-M ext. oceľový prvok zábradlia - erby, nadpis, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, zmenám teplot, s</p>										
218	M	5530000042	ks	1,000	3 445,00	3 445,00	-585,00	2 860,00	-585,00	
<p>D-M ext. oceľový prvok zábradlia - erby, nadpis, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorozná alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybam, zmenám teplot, s</p>										

219	M	5530000034	U-M ext. oceťový prístrešok pre bicykle 4ks, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybom, zm. D-M ext. oceťový prístrešok pre bicykle 6 ks, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybom, zm. D-M oceťová kcia fasády pre žalúzie, iz. poli, vrátane žlabov a zvodňov, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, krytá terasa Z.np, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderu	ks	1.000	22 290,00	22 290,00	0,00	22 290,00	0,00
220	M	5530000035	D-M ext. oceťový prístrešok pre bicykle 6 ks, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, ohybom, zm. D-M oceťová kcia fasády pre žalúzie, iz. poli, vrátane žlabov a zvodňov, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, krytá terasa Z.np, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderu	ks	1.000	32 690,00	32 690,00	0,00	32 690,00	0,00
221	M	5530000036	D-M oceťová kcia fasády pre žalúzie, iz. poli, vrátane žlabov a zvodňov, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderom, krytá terasa Z.np, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderu	ks	1.000	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00
222	M	5530000037	D-M ext. oceťové zariadenie a prístrešok - krytá terasa Z.np, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch. úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretanová vrchná aj základná farba v jednom, matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou proti úderu	ks	1.000	21 839,00	21 839,00	0,00	21 839,00	0,00
223	K	767316230	Montáž svetlíkov a nosnej oceť. a drevenej konštrukcie	ks	4.000	140,00	140,00	0,00	560,00	0,00
224	M	6133903200	Svetlík do plochej strechy, zaklený izolačným dvojsklom + polykarbonátovou čiarou kupoľou, 100x100 mm, neotváraný (napr. VELLIX CEP 100/100) alebo iný ekvivalentný	ks	4.000	778,00	778,00	80,33	3 233,32	321,32
225	M	5530000038	Mošna kcia pod svetlíky - oceťový profil a drevené hranyl. vid. 15 Detaily, výkazy mat.	ks	4.000	157,00	157,00	29,25	745,00	117,00
226	M	4297100177	D-M rebrik na jasadu š 60cm, S, 1 m	ks	1.000	396,00	396,00	79,00	475,00	79,00
227	K	767631112	Montáž a doprava hliníkových zaklených stien	ks	2.000	393,00	786,00	379,00	1 544,00	798,00
228	M	6114107800	Hliníková vstupná rohová zasklenia stena (5,53-4,975)x(5,035m, RAL 7016 oзн. A1	ks	1.000	9 460,00	9 460,00	8 191,75	17 651,75	8 191,75
229	M	6114107799	Oceťová (hliníková) int. zasklenia stena, 3,05x2,87m, RAL 7016 - oзн. A8	ks	1.000	1 909,00	1 909,00	0,00	1 909,00	0,00
230	K	767631113	Montáž a doprava plastových výplní	m	289,500	19,40	5 228,30	0,00	5 228,30	0,00
231	M	61141221001	Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 7016 - oзн. A2	ks	1.000	1 170,00	1 170,00	-53,77	1 116,23	-53,77
232	M	61141221002	Plastová vstupná rohová zostava (5,945-5,025)x(2,05m, RAL 7016 - oзн. A3	ks	1.000	4 131,00	4 131,00	1 327,02	5 458,02	1 327,02
233	M	61141221003	Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,06x2,3m, RAL 7016 - oзн. A4	ks	1.000	730,00	730,00	470,79	1 200,79	470,79
234	M	61141221004	Plastové dvere posuvné 3,23x2,35m, RAL 7016 - oзн. A5	ks	1.000	1 499,00	1 499,00	747,91	2 246,91	747,91
235	M	61141221005	Plastové 4 dielne okno f. 93x3,16m + sieťka, RAL 7016 - oзн. A6	ks	2.000	913,00	1 826,00	400,87	2 627,74	801,74
236	M	61141221006	Plastové dvere s bočným svetlíkom 3,05x2,1m, RAL 7016 - oзн. A7	ks	1.000	1 043,00	1 043,00	500,46	1 543,46	500,46
237	M	61141221007	Plastová okenná zostava f. 1,8x2,25m + sieťky - vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - oзн. B1, f. n.p.	ks	3.000	2 877,00	8 631,00	1 266,17	12 435,52	3 804,52
238	M	61141221008	Plastová okenná zostava f. 4x2,25m + sieťky - vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - oзн. B1, f. n.p.	ks	4.000	2 108,00	8 432,00	1 652,46	15 041,85	16 809,85

239	M	61141221008	ks	1,000	3 053,00	3 053,00	3 053,00	1 240,43	4 293,43	1 240,43	1 240,43
240	M	61141221009	ks	2,000	131,00	262,00	262,00	105,65	473,65	105,65	231,30
241	M	61141221010	ks	1,000	224,00	224,00	224,00	186,11	412,11	186,11	186,11
242	M	61141221011	ks	1,000	328,00	328,00	328,00	139,71	467,71	139,71	139,71
243	M	61141221012	ks	1,000	452,00	452,00	452,00	302,32	754,32	302,32	302,32
244	M	61141221013	ks	1,000	265,00	265,00	265,00	337,85	602,85	337,85	337,85
245	M	61141221014	ks	1,000	502,00	502,00	502,00	737,50	1 239,50	737,50	737,50
246	M	61141221015	ks	1,000	746,00	746,00	746,00	831,85	1 577,85	831,85	831,85
247	M	61141221016	ks	1,000	1 161,66	1 161,66	1 161,66	0,00	1 161,66	0,00	0,00
248	M	55344852000	ks	1,000	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 675,00	2 950,00	1 675,00	1 675,00
249	M	55344852021	ks	12,000	829,00	9 948,00	9 948,00	1 79,37	12 100,44	1 79,37	2 152,44
250	M	55344852022	ks	7,000	1 557,00	10 899,00	10 899,00	252,94	12 669,56	252,94	1 770,58
251	M	55344852023	ks	1,000	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	0,00	0,00
252	M	5534370703	ks	1,000	1 381,00	1 381,00	1 381,00	119,00	1 500,00	119,00	119,00
253	M	5534370713	ks	2,000	2 559,10	5 118,20	5 118,20	0,00	5 118,20	0,00	0,00
254	M	5534370714	ks	1,000	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00
255	M	5534370715	ks	1,000	3 445,00	3 445,00	3 445,00	1 129,00	4 574,00	1 129,00	1 129,00
256	M	5534370716	ks	3,000	261,40	784,20	784,20	0,00	784,20	0,00	0,00
771 - Podlahy z dlaždic											
257	K	771275107	m2	33,906	25,00	847,65	847,65	0,00	847,65	0,00	0,00
258	K	771575208	m2	216,700	24,00	5 200,80	5 200,80	0,00	5 200,80	0,00	0,00
259	M	59764047001	m2	214,128	12,00	2 569,54	2 569,54	0,99	2 781,52	0,99	211,58
260	M	5976404700	m2	55,408	12,00	664,90	664,90	3,99	996,79	3,99	331,89
10 229,82											
10 773,70											
543,88											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-22 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 533,64
Ostatné náklady	0,00



Cena bez DPH	61 533,64
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	61 533,64	12 306,73

Cena s DPH	v EUR	73 840,37
-------------------	--------------	------------------

Projektant

25.10.2022



Dátum a podpis:  Pečiatka 

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka


Objednávateľ

25.10.2022

Dátum a podpis:  Pečiatka 

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 680/23, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50784570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886

Dátum a podpis:  Pečiatka

261 K 7735009101	Upravy podlah - povrchove osetrenie Jest.schod, stupnov, čistenie, Imoizrenacia a. lestenie	m2	23,200	23,71	550,07	0,00	550,07	0,00
262 K 99871202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	101,76	396,86	0,00	396,86	0,00
776 - Podlahy povlakové							50 515,75	14 104,81
263 K 776591000	Lepenie povlakových podlah	m2	1 253,750	6,28	7 873,55	2,32	10 782,25	2 908,70
264 M 2841291500	Podlahovina marmóleum hr. cca 3 mm	m2	1 291,363	22,00	28 409,99	8,67	39 606,10	11 196,11
265 K 998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	364,00	127,40	0,00	127,40	0,00
781 - Dokončovacie práce a obklady							13 244,39	2 092,26
266 K 78145017	Montáž obkladov stien z obkladáčiek hlinných, keramických do tmeľu	m2	244,729	25,00	6 118,23	0,00	6 118,23	0,00
267 M 5976482600	Obkladáčky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	261,860	10,00	2 618,60	7,99	4 710,86	2 092,26
268 K 781789704	Príslušenstvo za skarovanie obkladov a dlaždíc	m2	495,335	0,75	371,50	0,00	371,50	0,00
269 K 998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	929,00	2 043,80	0,00	2 043,80	0,00
783 - Dokončovacie práce - nátery							7 235,37	0,00
270 K 783614920	Náter stôl, výřokov - dverei Nátery tesárskych konštrukcií syntetické	m2	52,800	6,80	359,04	0,00	359,04	0,00
271 K 783726300	na vzhľadu schůnce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	55,000	6,10	335,50	0,00	335,50	0,00
272 K 783894312	Náter Cetris dosiek - vonk. podlahy	m2	35,400	6,10	215,94	0,00	215,94	0,00
273 K 783894322	Náter vnút. stien farba oteruvzdorná silikonová	m2	873,300	6,83	5 964,64	0,00	5 964,64	0,00
274 K 783894612	Náter farbami ekologickými riešiteľnými vodou, biele, sadrokartón. stien a stropov 2x	m2	142,958	2,52	360,25	0,00	360,25	0,00
784 - Dokončovacie práce - maľby							14 097,82	0,00
275 K 784452271	Maľby stien z maľbařských zmesí tekutých jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	1 906,200	2,60	4 956,12	0,00	4 956,12	0,00
276 K 784452271	Maľby stropov z maľbařských zmesí tekutých dvojnás. výšky do 3,80 m - fedi	m2	975,432	3,50	3 414,01	0,00	3 414,01	0,00
277 K 784496501	Ostatné práce - penetracia stien, stropov a podlah	m2	5 560,861	1,03	5 727,69	0,00	5 727,69	0,00
M - Práce a dodávky M							412,20	0,00
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							412,20	0,00
278 K 460010001	Výšenie základov	bm	206,100	2,00	412,20	0,00	412,20	0,00
OST - Ostatné							440,00	0,00
OST - Ostatné							440,00	0,00
279 K HZ5000R11	Sekacie práce a murárske výpravky inštalácia	hod	40,000	11,00	440,00	0,00	440,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-22 - Elektroinštalácia

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	61 533,64
M - Práce a dodávky M	61 533,64
21-M - Elektromontáže	61 533,64
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 533,64

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-22 - Elektroinštalácia

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **61 533,64**

M - Práce a dodávky M **61 533,64**

21-M - Elektromontáže **61 533,64**

1	K	21-M1	Elektroinštalácia	sub	1,000	61 533,64	61 533,64
---	---	-------	-------------------	-----	-------	-----------	-----------

VYKAZ VYMER

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo
 Investor: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo
 Časť: Elektroinštalácia

POZ	POLOŽKA	jed	množ	dodávka	spolu	montáž	spolu
Elektromontáže							
1	Rúrka inštalácia ľuhá PVC 21mm - do podlahy, muriva, stropných prekladov	m	100	0,45	45,00	0,60	60,00
2	Rúrka inštalácia HFXP 20	m	200	0,61	122,00	0,60	120,00
3	Rúrka inštalácia HFXP 45	m	100	5,55	555,00	0,60	60,00
4	Rúrka ohybná, vlnitá FXPS 18, čierna	m	810	0,42	256,20	0,60	368,00
5	Príchytká CLIP pre ohybnú rúrku FXPS 18, čierna	ks	1100	0,05	55,00	0,05	55,00
6	Škatuľa 6455-11 so svorkovnicou, čierna	ks	215	1,98	425,70	1,00	215,00
7	Škatuľa prístrojová	ks	288	0,16	45,78	0,60	171,60
8	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou, kruhová	ks	170	1,75	297,50	1,00	170,00
9	Spínač zapustený jednopólový - radenie 1, IP20, označený "A"	ks	40	1,65	66,00	2,80	112,00
10	Spínač zapustený sériový - radenie 5, IP20, označený "B"	ks	3	2,50	7,50	2,80	8,40
11	Spínač zapustený striedavý - radenie 6, IP20, označený "C"	ks	17	1,75	29,75	2,80	47,60
12	Spínač zapustený krížový - radenie 7, IP20, označený "D"	ks	3	3,15	9,45	2,80	8,40
13	Spínač zapustený dvojitý striedavý - radenie 6+8, IP20, označený "E"	ks	1	3,10	3,10	2,80	2,80
14	Spínač zapustený - stmievač IP20, označený "S"	ks	13	25,50	331,50	2,80	36,40
15	Spínač nástenný jednopólový - radenie 1, IP43, označený "A"	ks	1	3,10	3,10	2,80	2,80
16	Spínač nástenný striedavý - radenie 6, IP43, označený "C"	ks	2	3,10	6,20	2,80	5,60
17	Domová zásuvka zapustená 18 A/250 V 2P+Z IP20 označená "A"	ks	208	1,90	395,20	3,10	644,80
18	Domová zásuvka zapustená 18 A/250 V 2P+Z IP21 označená "C"	ks	1	1,90	1,90	3,10	3,10
19	Domová zásuvka nástenná 18 A/250 V 2P+Z IP43 označená "D"	ks	14	2,95	41,30	3,10	43,40
20	Jednofázový spínač v krabici pre zapustenú montáž 16A/230, IP20	ks	13	22,30	289,90	2,80	36,40
21	IP20	ks	2	22,30	44,60	5,50	11,00
22	Hlavná ekvipotenciálová svorkovnica HEP	ks	1	8,90	8,90	5,50	5,50
23	Svorka na potrub "Bernard" vrát. pásika	ks	12	1,15	13,80	1,10	13,20
22	Kábel CXKE-R 3x1,5 mm ²	m	800	0,64	512,00	1,00	800,00
23	Kábel CXKE-R 3x2,5 mm ²	m	2200	0,99	2178,00	1,00	2200,00
24	Kábel CXKE-R 5x1,5 mm ²	m	1400	1,05	1470,00	1,00	1400,00
25	Kábel CXKE-R 5x2,5 mm ²	m	100	2,59	259,00	1,00	100,00
26	Kábel CXKE-R 5x4 mm ²	m	60	2,55	153,00	1,50	90,00
27	Kábel CXKE-R 5x6 mm ²	m	50	3,65	182,50	1,50	75,00
28	Kábel CXKE-R 5x10 mm ²	m	60	6,35	381,00	1,90	114,00
29	Kábel CHKE-V 3x1,5 mm ²	m	250	1,05	262,50	1,00	250,00
30	Kábel CYKY-J 5x18 mm ²	m	40	8,90	356,00	1,50	60,00
31	Vodič CY 4 mm ² zeleno-žltý	m	80	0,49	29,40	0,50	30,00
32	Vodič CY 6 mm ² zeleno-žltý	m	50	0,69	34,50	0,50	25,00
33	Vodič CY 16 mm ² zeleno-žltý	m	250	1,88	470,00	1,00	250,00
34	Vodič CY 50 mm ² zeleno-žltý	m	30	5,75	172,50	2,50	75,00
35	Tlačidlo Centrál Stop chránené priehľadným sklom a nápisom Svietidlo nudzové s piktoqramom, NEXI TECH 250	ks	1	22,70	22,70	5,50	5,50
36	s piktoqramom a s akumulátorom 1 hod	ks	41	115,30	4727,30	9,50	389,50
37	LED svietidlo kruhové 800 mm, stmievateľné, 60W, 3000K/4000K, 3700/3900 lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 MONO 80, W 60W) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový nástavec pod svietidlo z pozink. plechu	ks	113	107,53	12150,89	9,50	1073,50
38	LED svietidlo kruhové 800 mm, stmievateľné, 100W, 3000K/4000K, 6381/6600 lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 MONO 80, W 100W) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový nástavec pod svietidlo z pozink. plechu	ks	24	155,71	3737,04	9,50	228,00
39	LED svietidlo dl. 150cm 31-39W, 3000K/3500K/4000K, 3400-4300 lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 LINO 150P, W) alebo iný ekvivalentný výrobok	ks	5	107,07	535,35	9,50	47,50
40	LED svietidlo kruhové 250mm, 12W, 3000K/4000K/5700K, 1200lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 ROUND II 25 12W) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový nástavec pod svietidlo z pozink. plechu	ks	22	34,04	748,88	9,50	209,00
41	LED svietidlo kruhové 300mm, 25W, 3000K/4000K/5700K, 2200lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 ROUND II 30 25W) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový nástavec pod svietidlo z pozink. plechu	ks	42	40,71	1709,82	9,50	399,00
42	LED svietidlo kruhové 400mm, 30W, 3000K/4000K/5700K, 3000lm, IP20 (napr. LED2 LIGHTING, LED2 ROUND II 40 30W) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový nástavec pod svietidlo z pozink. plechu	ks	17	67,39	1145,63	9,50	161,50
43	LED svietidlo kruhové 240mm, 25W, 3000K, 2000 lm, IP54, (napr. LED2 LIGHTING, LED2 LUNA L, A25W, 3000K) alebo iný ekvivalentný výrobok + kruhový nástavec pod svietidlo z pozink. plechu	ks	10	60,72	607,20	9,50	95,00
44	svietidlo trubcové, pod kuchynské skrinky IP20, LED 8,4W, 554lm, IP20, dl. 630mm, česany hliník, (napr. RENDL DART) alebo iný ekvivalentný výrobok	ks	4	26,80	107,20	9,50	38,00
45	výkonný plochý LED reflektor, čierny, areálové osvetlenie s pohybovým senzorom, 30W, IP54, 3000K, 1800lm, 120°, (napr. PONTA) alebo iný ekvivalentný výrobok	ks	11	43,47	478,17	9,50	104,50
46	Stožiar oceľový, kužalový, STK 60/40/3K14, komplet s elektrovybrojom, výška 4m uložený do zeme	ks	2	199,50	399,00	85,50	131,00
47	Drážkovanie do steny pre uloženie káblov	m	700		0,00	5,50	3850,00
48	Rozvádzač KN zapustený, plastový, úvere pnie, krytie IP40/20, III-120A, (napr. Schneider typ PRA 25424) alebo iný ekvivalentný výrobok, prívod a vývody vrchom schéma a	ks	1	2250,00	2250,00	250,00	250,00
49	Rozvádzač KN1, zapustený, plastový, úvere pnie, krytie IP40/20, III-63A, (napr. Schneider, typ PRA 31418) alebo iný ekvivalentný výrobok, prívod a vývody vrchom schéma a	ks	1	680,00	680,00	250,00	250,00
50	Rozvádzač KN2, zapustený, plastový, úvere pnie, krytie IP40/20, III-63A, (napr. Schneider, typ PRA 31418) alebo iný ekvivalentný výrobok, prívod a vývody vrchom schéma a	ks	1	680,00	680,00	250,00	250,00
51	Ukončenie káblov	ks	160		0,00	1,55	248,00
52	Demontáž jestvujúcich stropných a nástenných svietidiel, spínačov, zásuviek	ks	200		0,00	8,50	1700,00
53	Demontáž jestvujúceho rozvádzača kotolne RK, jeho znovu montáž prísposobenie dĺžky káblov, odoplnenie a znovu nriadenie káblov	hod	48		0,00	15,00	720,00
54	Strojový výkop zeminy, homina tr.3, pre oceľové stožiare a uloženie káblov	m3	12		0,00	7,80	94,80
55	Strojový zához zeminy, homina tr.3, pre oceľové stožiare a uloženie káblov	m3	12		0,00	5,80	69,60
56	Murárske práce na zapracovaní drážok uložených káblov v murive	hod	90		0,00	5,00	450,00
57	Východzia revízia správa	hod	40		0,00	15,00	600,00

Ceny sú uvedené bez DPH

Bleskozvod

1	Krabica KO125	ks	13	3,30	42,90	3,50	45,50
2	Uzemňovaci drát FeZn D=8 mm (650m)	kg	260	2,20	572,00	1,10	266,00
3	Uzemňovaci drát FeZn D=10 mm (100m)	kg	50	2,20	110,00	1,10	55,00
4	Uzemňovaci pás FeZn 30x4 (200m)	kg	200	2,20	440,00	1,10	220,00
5	Svorka SZ	ks	13	1,15	14,95	1,30	16,90
6	Svorka SK	ks	60	0,70	42,00	1,30	78,00
7	Svorka SO	ks	5	0,95	4,75	1,30	6,50
8	Svorka SS	ks	38	0,40	14,40	1,30	46,80
9	Svorka SR03	ks	26	0,70	18,20	1,30	33,80
10	Svorka SP1	ks	10	0,55	5,50	1,30	13,00
11	Podpera vedenia na strechy PV21 plastová	ks	240	0,65	156,00	0,70	168,00
12	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	13	0,50	6,50	0,50	6,50
13	Zváranie uzemňovacieho systému	ka	13		0,00	15,50	201,50
14	Svorka na potrubie ST11	ks	2	3,40	6,80	1,30	2,80
15	Rúrka PVC min. vnútorný priemer 29mm - (do muriva, skryté zvody)	m	90		0,00	0,60	54,00
16	Surojový výkop zemin, nominálna ú.c., pre uloženie pozinkovaného páska FeZn30x4mm	m3	48		0,00	3,50	168,00
17	Surojový zához zemin, nominálna ú.c., pre uloženie pozinkovaného páska FeZn30x4mm	m3	48		0,00	1,90	91,20
18	Východzia revízná správa	hod	16		0,00	5,00	80,00

Ceny sú uvedené bez DPH

 Cena dodávok bez DPH: **40927,84** EUR

 Cena montáže bez DPH: **20605,70** EUR

 Cena celkom bez DPH: **61533,64** EUR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - 5001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-23 - Slaboprúdové rozvody - štrukturovaná kábeláž

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:



Náklady z rozpočtu	40 732,27
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	40 732,27
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	40 732,27	8 146,45

Cena s DPH	v EUR	48 878,72
-------------------	--------------	------------------



Projektant

25.10.2022
Dátum a podpis: 
Pečiatka 

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____
Pečiatka _____

Objednávateľ

31.10.2022
Dátum a podpis: 
Pečiatka 

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 644/25, 82001 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781574 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis: 16.10.2022  Pečiatka _____

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-23 - Slaboprúdové rozvody - štrukturovaná kábeláž

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	40 732,27
M - Práce a dodávky M	40 732,27
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	40 732,27
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	40 732,27

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-23 - Slaboprúdové rozvody - štrukturovaná kábeláž

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **40 732,27**

M - Práce a dodávky M **40 732,27**

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení **40 732,27**

1	K	22-M1	Slaboprúdové inštalácie - štrukturovaná kábeláž	sub	1,000	40 732,27	40 732,27
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

Časť: ŠTRUKTÚROVANÁ KABELAŽ						
P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)
A: KONCOVÉ ZARIADENIA						
1		Stojanový 19" rozvádzač rozoberateľný, šírka 600 mm hĺbka 800 mm, 42U	ks	1	712,00	712,00
2		Ventilačná jednotka strešná, 4 ventilátory, s termostatom	ks	1	154,00	154,00
3		Podstavec 600x800	ks	1	57,18	57,18
4		Držiak patch káblov 19" s hĺbkou oka 37 mm, kovový, 1U	ks	6	4,66	27,96
6		Rozvodný panel 19", 6x230V	ks	2	23,75	47,50
7		Keystone Jack, Cat 6A, RJ45/s	ks	144	4,28	615,60
8		Patch panel pre 24xRJ45, čierny, neosadený, 1U	ks	6	52,25	313,50
9		Patch kábel S/FTP, Cat 6A, LSOH, šedý, 3m	ks	144	6,17	888,48
10		Optický patch panel vrátane príslušenstva	ks	1	415,00	415,00
11		Telekomunikačná prípojka (z existujúceho miesta bodu napojenia, kompletná dodávka kabeľáže, materiál, dĺžka 45m)	ks	1	620,00	620,00
12		Ostatné drobné rozširovacie príslušenstvo pre dátový rozvádzač	ks	1	190,00	190,00
13		Vertikálny vyvážovací panel	ks	2	38,00	76,00
14		Dátová zásuvka 2xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, podom. krabica, montáž pod omietku	ks	45	14,20	639,00
15		Dátová zásuvka 2xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, montáž do parapetného žlabu	ks	13	13,77	179,01
16		Dátová zásuvka 2xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, krabica, montáž na povrch	ks	5	15,20	76,00
17		Dátová zásuvka 1xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, montáž do parapetného žlabu	ks	5	12,82	64,10
18		Dátová zásuvka 1xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, podom. krabica, montáž pod omietku (príprava pre WIFI)	ks	8	13,20	105,60
19		Dátová zásuvka 1xRJ45, CAT6A, inštalačný rámček, inštalačná krabica, montáž na povrch	ks	2	13,30	26,60
20		HDMI zásuvka, inštalačný rámček, krabica, montáž na povrch	ks	2	42,75	85,50
21		HDMI zásuvka, inštalačný rámček, podomietková krabica, montáž pod omietku	ks	2	42,75	85,50
22		meracie protokoly - metalika	ks	144	6,65	957,60
23		označenie dátových zásuviek	ks	82	0,15	12,30
24		označenie patch panelov	ks	6	23,40	140,40
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE						
25	S/FTP Cat6A	inštalačný dátový kábel CAT6A, 4P, 650 MHz, B2ca s1 d1 a1	m	5000	0,62	3 100,00
26	HDMI	HDMI kábel (dĺžka 10m)	ks	32	47,50	1 520,00
27		označenie káblov - štítky v zmysle STN	ks	500	0,18	90,00
28	HFX40	ohybná inštalačná rúrka vrátane príchytky pod omietku	m	1000	2,01	2 010,00
29	HFXPM40	ohybná inštalačná rúrka, montáž do podlahy	m	100	1,70	170,00
30		príslušenstvo pre rúrky	kpl	1	731,50	731,50
31		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	630,04	630,04
32		značenie trasy vedenia	m	1100	0,90	990,00
33		vyhotovenie drážky pre rúrku v stene	m	1100	1,90	2 090,00
34		prieraz v stene	ks	50	12,50	625,00
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY						
35		oživenie systému	kpl	1	475,00	475,00
36		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	220,40	220,40
37		montáž zariadení	kpl	1	6 505,00	6 505,00
38		montáž vedení	kpl	1	12 670,00	12 670,00
39		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1	285,00	285,00
40		uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1	190,00	190,00
41		inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1	380,00	380,00
42		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	237,00	237,00
43		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1	285,00	285,00
44		zaškolenie obsluhy	kpl	1	137,00	137,00
45		odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1	142,50	142,50
46		dopravné náklady	kpl	1	285,00	285,00
47		odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1	475,00	475,00
Spolu						40732,27
Káble-vedenia prechádzajúce cez CHUC, komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeľáže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.						
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Výkaz výmer je orientačný pre spracovanie cenovej ponuky dodávateľa.						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-24 - Hlasová signalizácia požiaru

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 790,54
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	29 790,54
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	29 790,54	5 958,11

Cena s DPH	v EUR	35 748,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

28.10.2022
Dátum a podpis:



Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

31.10.2022
Dátum a podpis:



Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 16.10.2022 Pečiatka

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50731570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-24 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	29 790,54
M - Práce a dodávky M	29 790,54
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	29 790,54
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 790,54

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-24 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **29 790,54**

M - Práce a dodávky M **29 790,54**

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení **29 790,54**

1	K	1	Hlasová signalizácia požiaru	sub	1,000	29 790,54	29 790,54
---	---	---	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

Časť: HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU							
P.č.	Typ položky	Názov položky /skrátený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Jedn. cena (EUR)	Cena (EUR)	
A: KONCOVÉ ZARIADENIA							
1		riadiaca jednotka HSP 4 zóny	ks	1	1 590,00	1 590,00	
2		2x300W výkonový zosilňovač	ks	1	1 890,00	1 890,00	
3		SD / USB MP3 prehrávač / tuner	ks	1	452,29	452,29	
4		časovač	ks	1	285,00	285,00	
5		stanica hlásateľa	ks	1	514,00	514,00	
6		požiarny panel	ks	1	403,00	403,00	
7		doska dohľadu reproduktorovej linky	ks	3	88,00	264,00	
8		systémový nabíjač batérií	ks	1	1 210,00	1 210,00	
9		Staničná batéria 65Ah/12V	ks	2	185,00	370,00	
10		nástenný rack 18U / 615x600 s vent.jednotkou, termostatom, policami na batérie, rozvodným panelom a ostatnou výbavou	kpl	1	660,00	660,00	
11		inštalčný materiál pre kompletáž ústredie HSP	kpl	1	118,70	118,70	
12		skrinkový nástenný reproduktor 6W, kovová skrinka, EN54-24	ks	39	40,85	1 593,15	
13		zvukový projektor 10W, EN54-24	ks	1	76,95	76,95	
14		zelené aktivačné tlačidlo so záklopkou	ks	10	33,25	332,50	
15		označenie prvku HSP	ks	54	0,38	20,52	
16		inštalčná prepojovacia krabica, požiarna odolná PS30, keramická svorkovnica	ks	1	29,05	29,05	
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE							
17	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8	kábel, bezhalogénový, požiarna odolný, B2ca s1d1a1	m	315	0,80	252,00	
18	JE-H/ST/H FE180/PS30 4x2x0,8	kábel, bezhalogénový, požiarna odolný, B2ca s1d1a1	m	60	1,60	96,00	
19	NHXH-O FE180/PS30 2x1,5	kábel, bezhalogénový, požiarna odolný, B2ca s1d1a1	m	700	0,84	588,00	
20		označenie káblov - štítky v zmysle STN	ks	107,5	0,19	20,43	
21		kovová príchytka pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarna odolnosť PS30, úchyt kábla každých 30cm	ks	3600	0,13	468,00	
22		inštalčná rúrka vhodná pre montáž do podlahy priemer fi 40	m	80	1,60	128,00	
23		drobný montážny a pomocný materiál (hmoždinky, skrutky pre zariadenia, ostatné príslušenstvo a pod.)	kpl	1	473,00	473,00	
24		protipožiarne utesnenie prestupov	ks	1	23,70	23,70	
25		značenie trasy vedenia	m	525	0,95	498,75	
26		vyhotovenie drážky pre kábel do 1,5 v stene, strope	m	1075	1,90	2 042,50	
27		príerez cez stenu	ks	50	12,90	645,00	
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY							
28		oživenie systému	kpl	1	475,00	475,00	
29		komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	565,00	565,00	
30		montáž zariadení	kpl	1	4 900,00	4 900,00	
31		montáž vedení	kpl	1	5 250,00	5 250,00	
32		skúšobná prevádzka systému	kpl	1	190,00	190,00	
33		meranie Indexu zrozumiteľnosti podľa STN EN 60849	kpl	1	475,00	475,00	
34		vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	kpl	1	285,00	285,00	
35		naprogramovanie zariadenia	kpl	1	475,00	475,00	
36		uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1	190,00	190,00	
37		inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1	380,00	380,00	
38		dokumentácia skutočného vyhotovenia	kpl	1	237,00	237,00	
39		vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	kpl	1	285,00	285,00	
40		zaškolenie obsluhy	kpl	1	137,00	137,00	
41		odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1	142,00	142,00	
42		dopravné náklady	kpl	1	285,00	285,00	
43		odvoz a likvidácia odpadu	kpl	1	475,00	475,00	
SPOLU BEZ DPH (EUR):						29 790,54	
SPOLU S DPH (EUR):						35 748,64	
Káble-vedenia prechádzajúce cez CHUC, Komunikácie, zhromažďovacie priestory a pod. musia mať podľa STN 92 0203 triedu reakcie na oheň podľa prílohy B - B2ca s1 d1 a1 a v ostatných priestoroch podľa EN 50 575 s min triedou reakcie na oheň Eca. Týka sa to kabeláže vedenej len na povrchu - príchytky, žľaby, rošty, rúrky. Tak isto musia mať aj nosné prvky tiež triedu reakcie na oheň min Eca.							
Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto projektovej dokumentácie, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky. Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke. Výkaz výmer je orientačný pre spracovanie cenovej ponuky dodávateľa.							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-1 - ZTI- kanalizácia

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	11 654,36
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	11 654,36
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	11 654,36	2 330,87

Cena s DPH	v EUR	13 985,23
-------------------	--------------	------------------


Projektant

22.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

31.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 100/2, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50701570 DIČ: 2120487886
IČO DPH: SK2120487886
Dátum a podpis: 16.10.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien
Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova
Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-1 - ZTI- kanalizácia

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022
Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	11 654,36
D1 - Práce a dodávky PSV	11 654,36
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	8 198,15
767 - Ocel. stav. dopln. konštrukcie	3 456,21
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 654,36

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-1 - ZTI- kanalizácia

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 654,36

D1 - Práce a dodávky PSV

11 654,36

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

8 198,15

1	K	721171107	Potrubie PVC DN 75x1,8	M	27,000	14,94	403,38
2	K	721171109	Potrubie PVC DN 110x2,2	M	47,000	16,92	795,24
3	K	721171111	Potrubie PVC DN 110x3,2	M	58,000	23,90	1 386,20
4	K	721171112	Potrubie PVC DN 125	M	63,000	26,16	1 648,08
5	K	721171112.1	Potrubie PVC DN 150	M	11,000	26,16	287,76
6	K	721171503	Potrubie z rúr novodur pripojovacie D 50 x 3	M	30,000	11,87	356,10
7	K	721171505	Potrubie z rúr novodur pripojovacie D 63 x 3	M	20,000	14,79	295,80
8	K	721194105	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	24,000	2,74	65,76
9	K	721194109	Zriadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	12,000	4,07	48,84
10	K	D + M	HL 210P	KUS	7,000	38,00	266,00
11	K	D + M.1	HL 810 DN110	KUS	2,000	19,40	38,80
12	K	D + M.2	HL 807 DN75	KUS	1,000	39,00	39,00
13	K	D + M.3	HL 900N DN 110	KUS	1,000	100,00	100,00
14	K	D + M.4	HL 900N DN 75	KUS	1,000	90,00	90,00
15	K	D + M.5	HL 600N	KUS	7,000	111,00	777,00
16	K	D + M.6	Dvierka plastové 15/30	KUS	6,000	13,30	79,80
17	K	D + M.7	Dvierka 15/15	KUS	11,000	8,55	94,05
18	K	D + M.8	Chránička DN 300	M	12,000	95,00	1 140,00
19	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	245,000	0,76	186,20
20	K	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 150	M	11,000	0,97	10,67
21	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu	%	86,031	1,04	89,47

767 - Ocel. stav. dopln. konštrukcie

3 456,21

22	K	KP	Montáž a dodávka úchytného systému	kg	522,000	5,70	2 975,40
23	K	998767202	Presun hmôt pre ocel. konštr.	%	31,320	1,04	32,57
24	K	24	Práce nezahrnuté v rozpise	%	11 206,120	0,04	448,24

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien
Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova
Časť: 1246-25 - Zdravotechnika
Úroveň 3: 1246-25-2 - ZTI - vodovod a zariadenie predmety

JKSO: Kalinkovo KS: 25.10.2022
Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022
Objednávateľ: Obec Kalinkovo IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 529,79
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	31 529,79
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 31 529,79	6 305,96
Cena s DPH v EUR	37 835,75

Projektant
28.10.2022
Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
31.10.2022
Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Právnika cesta 6/2023, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis: 26.10.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-2 - ZTI - vodovod a zariadenie predmety

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	31 529,79
D1 - Práce a dodávky PSV	31 529,79
713 - Izolácie tepelné	3 849,19
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	12 684,10
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	12 754,04
767 - Ocel. stav. dopln. konštrukcie	2 242,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 529,79

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien
 Objekt: 1246-2 - S001 - Administratívna-prevádzková budova
 Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-2 - ZTI - vodovod a zariadenie predmety

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022
 Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
 Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 529,79

D1 - Práce a dodávky PSV

31 529,79

713 - Izolácie tepelné

3 849,19

1	K	713482122	Montáž trubíc z PE do 70 mm hr. 20mm	M	570,000	3,19	1 818,30
2	K	D	Dodávka trubíc	M	570,000	3,47	1 977,90
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch	%	40,450	1,31	52,99

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

12 684,10

4	K	722172622	Potrubié z rúr PE D 20 x 2,8 plastliník	M	145,000	10,40	1 508,00
5	K	722172623	Potrubié z rúr PE D 25 x 3,5 plastliník	M	264,000	13,24	3 495,36
6	K	722172624	Potrubié z rúr PE D 32 x 4,4 plastliník	M	66,000	22,04	1 454,64
7	K	722172632	Potrubié z rúr PE D 50 x 6,9 plastliník	M	48,000	45,96	2 206,08
8	K	722140213	Potrubié ocelové DN 25 mat. 11 353	M	2,000	16,02	32,04
9	K	722140214	Potrubié ocelové DN 32 mat. 11 353	M	9,000	16,91	152,19
10	K	722140215	Potrubié ocelové DN 40 mat. 11 353	M	36,000	20,17	726,12
11	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky	KUS	60,000	7,12	427,20
12	K	722221010	Montáž ventilu guľového DN 15	KUS	42,000	2,17	91,14
13	K	551	Guľový ventil G 1/2"	KUS	4,000	4,70	18,80
14	K	551.1	Ventil rohový T67	KUS	35,000	5,60	196,00
15	K	551.2	Guľový ventil G 1/2" s prípojkou na hadicu	KUS	3,000	11,20	33,60
16	K	551.3	Vypúšťací kohút G 1/2"	KUS	1,000	4,70	4,70
17	K	722221015	Montáž ventilu guľového DN 20	KUS	5,000	3,61	18,05
18	K	551.4	Guľový ventil G 3/4"	KUS	5,000	5,60	28,00
19	K	722221020	Montáž ventilu guľového DN 25	KUS	1,000	4,00	4,00
20	K	551.5	Guľový ventil G 1"	KUS	1,000	7,50	7,50
21	K	722221030	Montáž ventilu guľového DN 40	KUS	1,000	6,10	6,10
22	K	551.6	Guľový ventil G 6/4"	KUS	1,000	23,50	23,50
23	K	D + M	Chránička DN 80	M	1,000	16,00	16,00
24	K	D + M.1	Prechodka plast - ocel' DN 20	KUS	2,000	14,00	28,00
25	K	D + M.2	Prechodka plast - ocel' DN 25	KUS	1,000	18,00	18,00
26	K	D + M.3	Prechodka plast - ocel' DN 40	KUS	2,000	28,00	56,00
27	K	D + M.4	Hadicové zariadenie NOHA DN 25/30	KUS	2,000	347,00	694,00
28	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	M	570,000	1,37	780,90
29	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	570,000	0,99	564,30
30	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch	%	134,110	0,70	93,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien
Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova
Časť: 1246-25 - Zdravotechnika
Úroveň 3: 1246-25-3 - ZTI - plynovod

JKSO: Kalinkovo
Miesto: Kalinkovo
Objednávateľ: Obec Kalinkovo
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum: 25.10.2022
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	594,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	594,04
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 594,04	118,81
Cena s DPH v EUR	712,85

Projektant
23.10.2022
Dátum a podpis:
Pečiatka

Spracovateľ
Dátum a podpis:
Pečiatka

Objednávateľ
31.10.2022
Dátum a podpis:
Pečiatka

Zhotoviteľ
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 6/23, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50794570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis: 16.10.2022
Pečiatka

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

725 - Zdravotechnika - zariadenia - predmety

12 754,04

31	K	725119711	Montáž Duofixov pre WC	kpl	7,000	33,63	235,41
32	K	725119730	Montáž záchodovej misy závesnej	SUB	7,000	6,20	43,40
33	K	557	Prichytka na WC misu/sada	KUS	7,000	5,60	39,20
34	K	D.1	Dodávka WC so závesným zariadením, s doskou, s odhlučňovacou	KUS	6,000	420,00	2 520,00
35	K	D.1	Dodávka WC so závesným zariadením, s doskou, s odhlučňovacou	KUS	1,000	611,00	611,00
36	K	725219201	Montáž umyvadla bez vytokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	SUB	1,000	31,10	31,10
37	K	D.2	Dodávka umyvadla, sifón chrómovaný - pre invalidov	SUB	1,000	122,00	122,00
38	K	725219201	Montáž umyvadla bez vytokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	SUB	19,000	31,10	590,90
39	K	D.3	Dodávka umyvadla, sifón chrómovaný	SUB	19,000	75,00	1 425,00
40	K	D + M.5	Montáž a dodávka výlevky - komplet vrátane batérie	KUS	1,000	197,00	197,00
41	K	D + M.6	Drez - nerez	SUB	3,000	112,00	336,00
42	K	725829301	Montáž batérie umyvadlovej drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	KUS	23,000	6,50	149,50
43	K	D.4	Dodávka batérií U,drez - stojánkové	KUS	23,000	178,00	4 094,00
44	K	725129711	Montáž Duofixov pre pisoár	KUS	5,000	29,10	145,50
45	K	725129730	Montáž pisoárov	KUS	5,000	5,20	26,00
46	K	D.5	Dodávka pisoáru so senzorom, s Duofixom	KUS	5,000	430,00	2 150,00
47	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch	%	135,820	0,28	38,03

767 - Ocel. stav. dopln. konštrukcie

2 242,46

48	K	KP	Montáž a dodávka úchytného systému	kg	200,000	5,60	1 120,00
49	K	998767202	Presun hmôt pre ocel. konštr.	%	12,000	1,03	12,36
50	K	50	Práce nezahrnuté v rozpise	%	31 717,000	0,04	1 110,10

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-3 - ZTI - plynovod

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTD5-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	594,04
D1 - Práce a dodávky PSV	594,04
725 - Zdravotechnika - plynovod	523,98
783 - Nátery	70,06
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	594,04

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-2 - SO01 - Administratívna-prevádzková budova

Časť: 1246-25 - Zdravotechnika

Úroveň 3: 1246-25-3 - ZTI - plynovod

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **594,04**

D1 - Práce a dodávky PSV **594,04**

725 - Zdravotechnika - plynovod **523,98**

1	K	723120206	Potrubié z ocel. rúr zvar. mat. 11 353.0 DN40	M	22,000	14,20	312,40
2	K	723239105	Montáž armatury zavítavej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 6/4"	KUS	1,000	6,20	6,20
3	K	551	Armatury a príslušenstvo guľový kohút 6/4" plyn	KUS	1,000	50,00	50,00
4	K	KP	Komplexné skúšky	kpl	1,000	150,00	150,00
5	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch	%	5,980	0,90	5,38

783 - Nátery **70,06**

6	K	783424340	Nátery potrubí dvojnásobný s 1x emailovaním vrátane základného náteru	m	22,000	2,10	46,20
7	K	7	Práce nezahrnuté v rozpise	%	596,380	0,04	23,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Časť: 1246-26 - Vykurovanie

25.10.2022

Kalinkovo

Obec Kalinkovo

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Poznámka

Vypočet
navýšenia
celkovej ceny

Náklady z rozpočtu	11 529,70	3 512,65
Ostatné náklady	0,00	0,00
Cena bez DPH	11 529,70	3 512,65
	3 008,47	702,53
Cena s DPH	18 050,81	4 215,18

Cena s DPH v EUR 13 835,64

Projektant

Spracovateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis

Datum a podpis

3.10.2022

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 600, Bratislava
IČO: 50722570 DIČ: 2120707806
Slovak Republic, Dunajská Streda

OBEC KALINKOVO

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia priestavu, inštalácia a nadväzná zariadenia na navýšenie výšky

Číslo: 1246-2-5001 Administratívna prevádzková budova

Časť: 1246-26 - Vykurovanie

Mesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objemovateľ: Obec Kalinkovo Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. (projektant)

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Zvýšená cena celkovo	Výpočet navyšenia celkovej ceny
1) Náklady z rozpočtu	11 529,70	15 042,34	3 512,65
HSV - Práce a dodávky HSV	60,87	60,87	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	60,87	60,87	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	11 397,84	14 910,49	3 512,65
713 - Izolácie tepelné	1 429,11	1 692,56	263,45
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	548,87	689,57	140,70
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	3 441,30	3 813,47	372,17
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	765,17	1 489,03	723,86
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 213,39	7 225,87	2 012,48
M - Práce a dodávky M	70,99	70,99	0,00
23-M - Montáže potrubia	70,99	70,99	0,00
2) Ostatné náklady	0,00		
Celkové náklady za stavbu (1) + 2)	11 529,70	15 042,34	3 512,65

16	K	998731101	Presun hmotí pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,003	141,73	0,43	3 441,30	141,73	0,00	0,43	3 813,47	372,17
17	K	733120815	Demontáž potrubia z ocelových rurok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	20,000	1,21	24,20	0,00	1,21	0,00	0,43	24,20	0,00
18	K	733126195	Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením	ks	12,000	6,31	75,72	0,00	6,31	0,00	0,00	75,72	0,00
19	M	316170019600	Nátrubok varný 1/2 z čiernej uhlikovej ocele	ks	12,000	0,27	3,24	0,00	0,27	0,37	0,00	7,68	4,44
20	K	733126210	Montáž tvarovky - závit 5/4 privarením	ks	2,000	9,23	18,46	0,00	9,23	0,00	0,00	18,46	0,00
21	M	316170020400	Závit varný 1 1/4, dĺžky 145 mm, z čiernej uhlikovej ocele	ks	2,000	0,98	1,96	0,00	2,05	1,07	0,00	4,10	2,14
22	K	733126285	Montáž tvarovky - členko DN 20 privarením	ks	6,000	7,38	44,28	0,00	7,38	0,00	0,00	44,28	0,00
23	M	316170017800	Dielenka varná DN 20 mm, z čiernej uhlikovej ocele	ks	6,000	0,27	1,62	0,00	1,50	1,23	0,00	9,00	7,38
24	K	733167300	Montáž plastlinikového potrubia	m	287,000	3,07	881,09	0,00	3,07	0,00	0,00	881,09	0,00
25	M	286220049600	Redopress lisováním D 16x2	ks	30,000	2,97	89,10	0,00	3,16	0,00	0,00	89,10	0,00
26	K	733167306	Montáž plastlinikového potrubia lisováním D 20x2	m	54,000	3,68	198,72	0,00	3,68	0,00	0,00	198,72	0,00
27	M	286220040000	Spojka D 20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	5,000	3,93	19,65	0,00	4,27	0,00	0,00	19,65	0,00
28	K	733167309	Montáž plastlinikového potrubia lisováním D 26x3	m	34,000	4,13	140,42	0,00	4,13	0,00	0,00	140,42	0,00
29	M	286220040100	Spojka D 26 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	5,000	5,21	26,05	0,00	7,31	1,16	0,00	31,96	10,50
30	K	733167312	Montáž plastlinikového potrubia lisováním D 32x3	m	87,000	4,44	386,28	0,00	4,44	0,00	0,00	386,28	0,00
31	M	286220040700	Spojka D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	10,000	8,80	88,00	0,00	9,95	1,36	0,00	99,31	10,50
32	K	733167316	Montáž plastlinikovej spojky lisováním D 27	ks	6,000	3,58	21,48	0,00	3,58	0,00	0,00	21,48	0,00
33	M	286220040600	Rúra plastliniková D 32x3 mm/5 m	m	87,000	4,55	395,85	0,00	5,16	0,00	0,00	450,00	79,17
34	K	733167315	Montáž plastlinikovej redukcie lisováním D 20	ks	1,000	2,97	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	2,97	0,00
35	M	286220040800	Redukcia D 20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	3,54	3,54	0,00	4,96	0,00	0,00	4,96	1,42
36	K	733167318	Montáž plastlinikovej redukcie lisováním D 26	ks	5,000	3,28	16,40	0,00	3,28	0,00	0,00	16,40	0,00
37	M	286220047000	Redukcia D 26/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	3,000	5,41	16,23	0,00	6,37	0,96	0,00	19,11	2,88
38	M	286220047100	Redukcia D 26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	2,000	4,80	9,60	0,00	6,66	1,86	0,00	13,32	3,72
39	M	286220047500	Redukcia D 32/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	2,000	8,10	16,20	0,00	8,85	0,75	0,00	17,70	1,50
40	M	286220047500	Redukcia D 32/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	4,000	8,85	35,40	0,00	8,85	0,80	0,00	35,40	3,20
41	K	733167393	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 16	ks	26,000	2,30	59,80	0,00	2,30	0,00	0,00	59,80	0,00
42	M	286220007700	T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	26,000	5,10	132,60	0,00	7,05	1,95	0,00	183,30	50,70
43	K	733167393	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 16	ks	2,000	2,30	4,60	0,00	2,30	0,00	0,00	4,60	0,00
44	M	286220006600	T-kus D 16/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	2,000	7,19	14,38	0,00	8,74	1,55	0,00	17,48	3,10
45	K	733167399	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 20	ks	7,000	2,97	20,79	0,00	2,97	0,00	0,00	20,79	0,00
46	M	286220004900	T-kus D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	7,000	6,53	45,71	0,00	8,74	2,21	0,00	61,18	15,47
47	K	733167400	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 26	ks	1,000	3,28	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00
48	M	286220009700	T-kus D 26/16/26 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	9,30	9,30	0,00	13,71	4,41	0,00	13,71	4,41
49	K	733167400	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 26	ks	1,000	3,28	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28	0,00
50	M	286220008000	T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
51	K	733167400	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 26	ks	6,000	9,21	55,26	0,00	9,21	0,00	0,00	55,26	0,00
52	M	286220010400	T-kus D 26/26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	6,000	10,16	60,96	0,00	13,92	3,76	0,00	83,52	22,56
53	K	733167403	Montáž plastlinikového T-kusu lisováním D 32	ks	1,000	3,80	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00
54	M	286220010500	T-kus D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	14,11	14,11	0,00	21,12	7,01	0,00	21,12	7,01

55	K	733167403	Montáž plastliniového T-kusu (sováním D 32	ks	5,000	3,58	17,90	3,58	0,00	17,90	0,00
56	M	286220008100	T-kus D 32 mm, PEX-AL-PEX systém,	ks	5,000	15,04	75,20	21,93	6,89	109,05	34,45
57	K	733167445	Montáž plastliniového prechodu (sováním D 32	ks	6,000	3,58	21,48	3,58	0,00	21,48	0,00
58	M	286220023000	Prechod D 32x1" vonkajší závit, PEX-AL-PEX systém,	ks	6,000	8,41	50,46	8,54	0,13	51,24	0,78
59	M	286220023400	Prechod RADOPRESS D 32x11/2" vonkajší závit, PEX-AL-PEX systém, PIPELIFE	ks	12,000	3,17	38,04	8,49	5,32	101,88	63,84
60	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 72 mm	m	470,000	0,42	198,81	0,42	0,00	198,81	0,00
61	K	733890801	Výstav. premiestnenie výbušných hmôt razovými potrubia vodovodne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,100	39,95	4,00	39,95	0,00	4,00	0,00
62	K	998733101	Presun hmôt pre rozvedby potrubia v objektoch, výšky do 6 m	t	0,077	42,62	3,28	42,62	0,00	3,28	0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry											
63	K	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045l	ks	24,000	0,87	20,88	0,87	0,00	20,88	0,00
64	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	4,34	8,68	4,34	0,00	8,68	0,00
65	M	55121004900	Galvaný ventíl 1 1/4", počta červených chrán, GIACOMINI	ks	2,000	16,13	32,26	24,93	8,80	49,86	17,60
66	K	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	25,000	2,12	53,00	2,12	0,00	53,00	0,00
67	M	551210012100	Ventil odzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovana mosadz, plast, pripojovacie skrutkovanie pre 8l	ks	25,000	1,34	33,50	12,47	11,13	311,75	278,25
68	M	551290008100	rohové 2-rurový systém, EKX3/4 F, PN 10, niklovana mosadz,	ks	25,000	12,47	311,75	25,15	12,68	628,75	317,00
69	M	I	Nikruba so zvieracim krúžkom 16mm	bef	25,000	2,73	68,25	4,56	1,83	114,00	45,75
70	K	734232308	Montáž termostatickej hlavice (vypalňovacej, jednoduchej)	sub.	25,000	1,48	37,00	1,48	0,00	37,00	0,00
71	M	551280001300	Termostaticka hlavica ET 35	ks	25,000	7,92	198,00	10,53	2,61	263,25	65,25
72	K	734890801	Vnútrostenkové premiestnenie výbušných hmôt armatúr do šm. Presun hmôt pre armatúry v objektoch	t	0,070	31,16	0,62	31,16	0,00	0,62	0,00
73	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,035	35,23	1,23	35,23	0,00	1,23	0,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá											
74	K	735111810	Demontáž radiátorov štánkových, 0,07380t	m2	24,000	1,02	24,48	1,02	0,00	24,48	0,00
75	K	735112035	Montáž vykurovacieho telesa štánkového liatinového výšky 500 mm	ks	6,000	32,18	193,08	32,18	0,00	193,08	0,00
76	K	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrakového výšky 400 mm, výška 1000x1200,000ve avojarovave	ks	11,000	7,54	82,94	7,54	0,00	82,94	0,00
77	M	484530018300	ocelové VK 22, vztahí 400x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1 1/2	ks	2,000	108,00	216,00	165,24	57,24	330,48	114,48
78	M	484530018500	ocelové VK 22, vztahí 400x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1 1/2	ks	9,000	121,00	1 089,00	184,70	63,70	1 662,30	573,30
79	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrakového výšky 600 mm, výška 1800x1200,000ve avojarovave	ks	10,000	8,07	80,70	8,07	0,00	80,70	0,00
80	M	484530021300	ocelové VK 22, vztahí 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1 1/2	ks	6,000	125,00	750,00	190,38	65,38	1 142,28	392,28
81	M	484530021700	ocelové VK 22, vztahí 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, avojarovave	ks	4,000	140,75	563,00	213,26	72,51	833,04	290,04
82	K	735154213	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojrakového výšky 300 mm, výška 1800x1800,000ve avojarovave	ks	2,000	9,84	19,68	9,84	0,00	19,68	0,00
83	M	484530031400	ocelové VK 33, vztahí 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1 1/2, vlnitými	ks	2,000	218,07	436,14	331,78	113,71	665,56	227,42

1 489,03

765,17

723,86

5 213,39

7 225,87

2 012,48

84	K	735154214	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm, výška 2000, 2600, 3000, príloha trojradové	ks	2,000	10,91	21,82	0,00	0,00	0,00	
85	M	484530034100	ocelové VK 33, vlnitá 300x2000x155 mm, pripojenie prave spodne, zavít G 1/2, vyústená	ks	2,000	236,47	472,94	123,25	719,44	246,50	
86	K	735191910	Nárustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia, vykurovacích teles	m	480,000	0,26	124,80	0,00	124,80	0,00	
87	M	484120021100	servomotor SR 5, 230 V/50 Hz pre zmišľovac. ventilu	ks	1,000	134,04	134,04	36,96	171,00	36,96	
88	K	735291800	rúcná automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 25 pre katly Vitodens 100 W/111 W. Demontaz kontrol alebo držákov	ks	12,000	0,38	4,51	0,00	4,51	0,00	
89	M	5523	vykurovacieho telesa, registra, napojenie pozostava z: ventilovej záslepký, 2 kornáči, 4 skrutek, 4 hmoždínok	ks	25,000	10,14	258,50	5,26	390,00	131,50	
90	K	998735101	Presun hmot. pre vykurovacie telesa v objektoch výšky do 6 m	t	0,930	39,53	36,76	0,00	36,76	0,00	
91	M	Z	Mašník MM Č, kotky, izolované objímky, skrutky, patné plechy	sub	1,000	705,00	705,00	0,00	705,00	0,00	
M - Práce a dodávky M							70,99	70,99	0,00	0,00	0,00
23-M - Montáže potrubia							70,99	70,99	0,00	0,00	0,00
92	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,5 MPa	úse	1,000	70,99	70,99	0,00	70,99	0,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: **Stavba železničkej zastávky v obci Kalinkovo**

Upravená výška rozpočtu: **17 396,89 €**

Časť: **1246-27 - Vzduchotechnika**

Objekt: **Kalinkovo** Dátum: **25.10.2022**
 Číslo: **1246-27**
 Číslo účtu: **CO**
 Číslo účtu: **CO DPH**
 Číslo účtu: **CO**
 Číslo účtu: **CO DPH**
 Číslo účtu: **CO**
 Číslo účtu: **CO DPH**
 Číslo účtu: **ICO**
 Číslo účtu: **CO DPH**

Zvýšená cena celkovo **Výpočet navyšenia celkovej ceny**

97 319,01 **17 396,89**
0,00 **0,00**
97 319,01 **17 396,89**

19 463,80 **3 479,38**
97 319,01 **17 396,89**

Náklady z rozpočtu **79 922,12**
Ostatné náklady **0,00**
Cena bez DPH **79 922,12**

DP - základná 20,0% 15 984,32
 DPH 0,0% 0,00
Cena s DPH **EUR** **95 906,54**

Projektant
 Dátum a podpis: **31.10.2022**
Objednávateľ
 Dátum a podpis: **31.10.2022**

Spracovateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: **31.10.2022**
 Pečiatka: **OBEC KALINKOVO**

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: **31.10.2022**
 Pečiatka: **OBEC KALINKOVO**

EUROPROJEKTDS PLUS s.r.o.
 Kračanská cesta 600, 833 01 Bratislava
 IČO: 50728370 DIČ: 2120487886
 IČ DPH: SK2120487886

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia priestavby, prístavba a nadstavba (Kultúra) na ul. Žitná, 01000000

Objekt: 1246 Z 50.1 Administratívna-prístavba (Kúpele)

Časť: 1246-27 - Vzduchotechnika

Miestnosť: Kalinkovo Datum: 25.10.2022

Objektovú zmluvu: Obec Kalinkovo Projektant: SPP, s.r.o.

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Zvýšená cena celková	Výpočet navyšenia celkovej ceny
1) Náklady z rozpočtu	79 922,12	97 319,01	17 396,89
M - Práce a dodávky M	79 922,12	97 319,01	17 396,89
24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.	79 922,12	97 319,01	17 396,89
2) Ostatné náklady	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 922,12	97 319,01	17 396,89

ROZPOČET

Ustanov: Město Kalinkovo, Jihlava
 Datum: 25.10.2022
 Zpracoval: Mgr. Miroslav Štěpánek

Část: 1246-27 - Vzduchotechnika

Místo: Kalinkovo
 Datum: 25.10.2022
 Zpracoval: Mgr. Miroslav Štěpánek

Zpracoval: Mgr. Miroslav Štěpánek
 Zpracoval: Mgr. Miroslav Štěpánek

PC Týp	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Zvýšená cena celková	Výpočet navýšení celkové ceny
						79 922,12	97 319,01	17 396,89
		M - Práce a dodávky M				79 922,12	97 319,01	17 396,89
		24.M - Montáže vzduchotechnických zařad.				79 922,12	97 319,01	17 396,89
1	K	1	sub	1,000	79 922,12	79 922,12	97 319,01	17 396,89

Zoznam strojov a zariadení

Vzduchotechnika

Názov projektu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO

Investor: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo

Zoznam strojov a zariadení

Pozícia	Názov komponentu	Typové označenie / jednotka	Množstvo	Dodávka		Montáž		Cenná časť D+M pôvodná	Zvýšená pôvodná jednotková cena dodávky	Vypočet navyšenia jednotkovej ceny dodávky	Zvýšená cena D+M celková	Vypočet navyšenia celkovej ceny
				jednotková	celková	jednotková	celková					
1.1	Zariadenie č.1 Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F- L1-F7/M5-C6-LJA (pravá) (KOMFOVENT-TZB produkt)	kpl	12	3 450,00 €	41 400,00 €	700,00 €	8 400,00 €	49 800,00 €	3 801,60	351,60	54 019,20	4 219,20
	Q _v : 600 m ³ /h / 200Pa											
	Q _v : 600 m ³ /h / 200Pa											
	Q _v : 2x176W / 230V/50Hz											
	Q _v elektr.: 2,0kW / 230V/50Hz											
	Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládaci panel C6 1	kpl	12	200,00 €	2 400,00 €	60,00 €	720,00 €	3 120,00 €	259,20	99,20	4 318,40	1 190,40
	Hmotnosť jednotky: 93kg											
	2x spätná klapka RSK250 + dilatčná manžeta 250-4x	kpl	12	50,00 €	600,00 €	17,50 €	210,00 €	810,00 €	25,46	-24,54	615,52	-294,48
1.2	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F- R1-F7/M5-C6-LJA (pravá) (KOMFOVENT-TZB produkt)	kpl	1	3 450,00 €	3 450,00 €	710,00 €	710,00 €	4 160,00 €	3 801,00	351,00	4 611,00	381,00
	Q _v : 600 m ³ /h / 200Pa											
	Q _v : 600 m ³ /h / 200Pa											
	Q _v : 2x176W / 230V/50Hz											
	Q _v elektr.: 2,0kW / 230V/50Hz											
	Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládaci panel C6 1	kpl	1	200,00 €	200,00 €	60,00 €	60,00 €	260,00 €	281,60	81,60	341,60	81,60
	Hmotnosť jednotky: 93kg											
	2x spätná klapka RSK250 + dilatčná manžeta 250-4x	kpl	1	50,00 €	50,00 €	17,50 €	17,50 €	67,50 €	25,46	-24,54	42,96	-24,54
1.3	Kombinovaná mrežka CVVX 250	kpl	8	230,00 €	1 840,00 €	69,50 €	556,00 €	2 396,00 €	270,30	40,30	2 718,40	322,40
1.4	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-355x355-S-RAL...	ks	27	35,60 €	961,20 €	11,10 €	299,70 €	1 260,90 €	46,75	11,15	1 561,95	301,05
1.5	Timič hluku THR-100-250-1500 (systemair)	ks	13	120,00 €	1 560,00 €	36,50 €	474,50 €	2 034,50 €	184,45	64,45	2 872,35	837,85
1.6	Timič hluku THR-100-250-1000 (systemair)	ks	13	101,00 €	1 313,00 €	30,20 €	392,60 €	1 705,60 €	184,90	63,90	2 636,30	830,70
1.7	Prívodný viný anemostiel VVKR-A-S-400x8-B-RAL9010	ks	52	15,00 €	780,00 €	5,10 €	265,20 €	1 045,20 €	20,32	5,32	1 321,84	276,64
	Prítlakový box PB-VVK-S-400-160-S-H-D1	ks	52	36,00 €	1 872,00 €	11,09 €	576,68 €	2 448,68 €	63,75	27,75	3 891,68	1 443,00
1.8	Odvodné sito 250	ks	13	11,00 €	143,00 €	3,20 €	41,60 €	184,60 €	23,97	12,97	353,21	168,61
	VZT potrubie kruhové SPIRO											
	SR 250 (30% tv.)	bm	286	11,50 €	3 289,00 €	3,94 €	1 126,84 €	4 415,84 €	23,77	12,27	7 925,06	3 509,22
	SR 160 (10% tv.)	bm	52	6,50 €	338,00 €	2,50 €	130,00 €	468,00 €	16,19	9,69	971,88	503,88
	Tepeľná izolácia potrubia sama a výluku 15mm	m2	82	7,00 €	574,00 €	9,20 €	754,40 €	1 328,40 €	9,78	2,78	1 656,36	227,96
	Potrubie štvorcové do obvodu 1420mm (100% tv.)	ks	10	3,00 €	30,00 €	0,97 €	9,70 €	39,70 €	68,68	65,68	695,50	655,80
	Zariadenie č.2											
2.1	Odvodný ventilátor TD 500/160	ks	5	180,00 €	950,00 €	58,30 €	291,50 €	1 241,50 €	190,91	0,91	1 246,05	4,55
	Q _v : 400 m ³ /h / 80Pa											
	Q _v : 30W / 230V/50Hz											
	1x spätná klapka RSK160 + dilatčná manžeta 160-2x	kpl	5	20,00 €	100,00 €	6,10 €	30,50 €	130,50 €	20,75	0,75	134,45	3,95
2.2	Odvodný ventilátor OX 100 T s časovým dobehom a spätnou	ks	3	60,00 €	180,00 €	18,20 €	54,60 €	234,60 €	73,63	13,63	276,19	40,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-3 - S002 - Areálové spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:



Náklady z rozpočtu	74 822,11
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	74 822,11
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	74 822,11	14 964,42

Cena s DPH	v EUR	89 786,53
-------------------	--------------	------------------



Projektant

25.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

25.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 60, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis: 26.10.2022 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-3 - S002 - Areálové spevnené plochy

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	74 822,11
HSV - Práce a dodávky HSV	71 370,11
1 - Zemné práce	7 960,07
2 - Zakladanie	1 303,19
5 - Komunikácie	42 586,28
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 311,50
99 - Presun hmôt HSV	7 209,07
PSV - Práce a dodávky PSV	3 452,00
7600 - Mobiliár	3 452,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	74 822,11

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-3 - S002 - Areálové spevnené plochy

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 822,11

HSV - Práce a dodávky HSV

71 370,11

1 - Zemné práce

7 960,07

1	K	112101122	Odstránenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	ks	4,000	7,00	28,00
2	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	4,000	17,83	71,32
3	K	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m ² , -0,2600 t	m ²	16,480	3,47	57,19
4	K	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	354,840	3,80	1 348,39
5	K	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m ²	288,620	0,90	259,76
6	K	113206111	Vytŕhanie obrub betonových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	89,080	1,90	169,25
7	K	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	659,940	1,10	725,93
8	K	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	305,100	3,80	1 159,38
9	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	214,786	0,89	191,16
10	K	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m ³	m ³	90,041	5,30	477,22
11	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažene pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	27,012	0,95	25,66
12	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	17,353	26,60	461,59
13	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm v hornine 3	m ³	5,206	6,61	34,41
14	K	162303101	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 500 m	m ³	149,360	1,35	201,64
15	K	162503102	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	247,500	2,76	683,10
16	K	162503103	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 970,000	0,29	861,30
17	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	74,680	6,17	460,78
18	K	171102103	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornínna 100% Proctor-Standard	m ³	35,016	1,89	66,18

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	322,180	0,64	206,20
20	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 150,275	0,41	471,61

2 - Zakladanie

1 303,19

21	K	211521111-1	Vypln odvodnovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	17,353	31,08	539,33
22	K	211971121	Zhotov. oplášť. vyplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2. 5 m	m2	125,343	1,18	147,90
23	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	150,412	1,62	243,67
24	K	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 6 do 8,5 m	m2	128,425	0,30	38,53
25	M	693110000100-PC	Geotextília polypropylénová, 200g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	91,740	0,64	58,71
26	M	2833000250.1	Izolácia proti úniku ropných látok a benzínu	m2	62,370	4,41	275,05

5 - Komunikácie

42 586,28

27	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	29,560	6,41	189,48
28	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 200 mm	m2	35,160	6,97	245,07
29	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	149,089	2,71	404,03
30	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	45,384	4,72	214,21
31	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 001,186	4,90	4 905,81
32	K	567122111	Podklad z kameniva smiešaného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	586,902	7,69	4 513,28
33	K	567132112	Podklad z kameniva smiešaného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	302,154	10,39	3 139,38
34	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	15,137	11,18	169,23
35	K	573111111	Postrek asfaltový infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0.60 kg/m2	m2	10,990	0,49	5,39
36	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	598,880	15,02	8 995,18
37	M	592460010600.1	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	604,869	12,01	7 264,48
38	K	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	310,420	14,68	4 556,97
39	M	5921953100-PC	Dlažba betónová Low value 20x10x8 cm, sivá	m2	266,913	14,87	3 969,00
40	M	592460011900-PC	Dlažba betónová Low value, rozmer 200x100x80 mm, grafit	m2	46,612	18,08	842,74
41	K	596912211	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	44,210	9,90	437,68
42	M	592460013500-PC	Dlažba betónová Low value zatravnovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	45,094	13,18	594,34

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	K	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	9,470	32,71	309,76
44	M	592270037900-PC	Zlábokový zlábok NW 400, dĺžky 1 m, výšky 160 mm, bez spádu, betónový s mriežkovým roštom	ks	10,000	178,42	1 784,20
45	K	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	10,990	4,19	46,05
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 311,50
46	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	20,000	16,66	333,20
47	M	404410071100	Zákazová značka č.231 (B1) (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	1,000	40,18	40,18
48	M	404410071200	Zákazová značka č.230 (B2) (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	69,70	139,40
49	M	404410103500	Príkazová značka č.211 (C2) (Príkazný smer jazdy vpravo), rozmer 500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	3,000	40,18	120,54
50	M	404410112800	Informatívna prevádzková značka č.321 (IP3b) (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	24,61	24,61
51	M	404410041000	Značka upravujúca preanosť č.202 (P2) (Stoj daj prednosť v jazde), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	1,000	74,67	74,67
52	M	404410042600	Značka upravujúca preanosť č.302 (P8) (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	2,000	40,35	80,70
53	M	404410124200	Informatívna prevádzková značka č.272 (IP12), rozmer 500x700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	4,000	39,41	157,64
54	M	404410130600	Informatívna prevádzková značka č.319 (IP26a) (Školská zóna), rozmer 750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	73,97	73,97
55	M	404410198200	Dodatková tabuľka č.531 (E15) (vyhradené miesto pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	27,92	27,92
56	M	404410197700	Dodatková tabuľka č.532 (E13) (vyhradené miesto), rozmer 500x700 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,000	34,00	68,00
57	M	404410078700	Zákazová značka č.215 (B27a) (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	1,000	69,00	69,00
58	M	404410079000	Zákazová značka č.215 (B27b) (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA2*(R3A,R3B), pozinkovaná	ks	1,000	69,00	69,00
59	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravne značky	m	45,500	5,50	250,25
60	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	40,000	3,05	122,00
61	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	13,000	0,48	6,24
62	M	404490008800	Hliníková pätká pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	13,000	14,69	190,97
63	K	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	187,120	0,90	168,41
64	K	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	187,120	0,16	29,94

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	915721111	Vodorovne znacenie krytu striekane farbou stopčiar, zebier, tieňov, šipok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,650	13,97	288,48
66	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šipok nápisov, prechodov a pod.	m2	20,650	0,59	12,18
67	K	915791111	Predznacenie pre znacenie striekane farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	187,120	0,23	43,04
68	K	915791112	Predznacenie pre vodorovne znacenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	20,650	1,72	35,52
69	K	915940011	Osadenie plastovej dorazovej lišty	ks	4,000	2,30	9,20
70	M	4045795070	Dorazová lišta - 1820x152x102	ks	4,000	37,87	151,48
71	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	167,000	4,67	779,89
72	M	59217000900-PC	Obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý	ks	340,001	1,31	445,40
73	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	73,490	6,52	479,15
74	M	59217000900-PC	Obrubník cestný bez skosenia rovný, 100x15x26 cm	ks	75,000	6,67	500,25
75	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	2,300	2,59	5,96
76	K	919735123	Rezanie existujúceho betonového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	8,690	15,00	130,35
77	K	966006211	Odstranenie (demontaz) zvislej dopravnej značky zo stlpov, stlpikov alebo konzol. -0,00400t	ks	4,000	1,92	7,68
78	K	979082213	Vodorovná doprava sutiiny so zlozenim a hrubým urovanim na vzdialenosť do 1 km	t	349,075	1,43	499,18
79	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 887,050	0,30	1 466,12
80	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	320,774	15,50	4 972,00
81	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenove zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	28,285	15,52	438,98

99 - Presun hmôt HSV

7 209,07

82	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 103,993	6,53	7 209,07
----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 452,00

7600 - Mobiliár

3 452,00

83	K	76233213011	Lavička	ks	4,000	438,00	1 752,00
84	K	76233213012	Kôš	ks	5,000	340,00	1 700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: 1246-4 - Sadové úpravy

Objekt: 1246-4 - Sadové úpravy
 Datum: 25.10.2022
 Obec Kalinkovo
 Objednávateľ: Obec Kalinkovo
 Zhotoviteľ: EUROPROJEKTS-PLUS s.r.o.
 Projektant: [Signature]
 Spracovateľ: [Signature]
 Organizácia: [Signature]

Výpočet
 zvýšená cena
 celkovej ceny


Zvýšená cena	38 595,85	6 939,14
Ostatné náklady	0,00	0,00
Cena bez DPH	38 595,85	6 939,14
DPH základná	7 719,17	1 387,83
DPH znižujúca		
Cena s DPH	46 315,02	8 326,97

Náklady z rozpočtu: 31 656,71
 Ostatné náklady: 0,00
Cena bez DPH: 31 656,71

DPH základná: 7 719,17
 DPH znižujúca: -1 387,83
Cena s DPH: 37 988,05

Projektant: [Signature]
 Datum a podpis: 28.10.2022
 Zhotoviteľ: [Signature]
 Datum a podpis: 31.10.2022

Spracovateľ: [Signature]
 Datum a podpis: [Signature]



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Acenta, ul. pri športovní, prístupná a nastavená ZS Kalinkovo navýšením o cel

Objekt: 1246-4 - Sadové úpravy

Miesto: Kalinkovo Datum: 25.10.2022
Gejzernavatel: Obec Kalinkovo
Zhotovitel: EUROPROJEKTS-PLUS s.r.o. Projektant: Spracovateľ

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]	Zvýšená cena celková	Vypočet navýšená celková cena
1) Náklady z rozpočtu	31 656,71	38 595,85	6 939,14
HSV - Práce a dodávky HSV	31 656,71	38 595,85	6 939,14
1 - Zemné práce	31 656,71	38 595,85	6 939,14
2) Ostatné náklady	0,00		
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 656,71	38 595,85	6 939,14

ROZPOČET

Objekt: 1246-4 - Sadové úpravy

Místo: Kalinkovo Datum: 25.10.2022
 Objednavitel: Obec Kalinkovo
 Zhotovitel: EUROPROJEKTDSD-PLUS s.r.o. Projektant:
 Jura, Ivatek

PC p	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 656,71
HSV - Práce a dodávky HSV							31 656,71
1 - Zemné práce							31 656,71
1	K	1	Sadové úpravy	sub	1,000	31 656,71	31 656,71

Zvýšená cena celková	38 595,85	Vypočet: navýšená celková cena	6 939,14
38 595,85		6 939,14	
38 595,85		6 939,14	
38 595,85		6 939,14	

Sadové úpravy zadanie - výkaz výmer

Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zvýšená jednotková cena	Výpočet navýšenia jednotkovej ceny	Zvýšená cena celková	Výpočet navýšenia celkovej ceny
SADOVÉ ÚPRAVY - PRÁCE :								
Plošná úprava terénu	m2	945,000	0,95	897,75	0,95	0,00	897,75	0,00
Obrobenie pôdy frézovaním	m2	945,000	0,95	897,75	0,95	0,00	897,75	0,00
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	945,000	0,10	94,50	0,10	0,00	94,50	0,00
Položenie mulčovacej kôry	m2	73,000	0,95	69,35	0,95	0,00	69,35	0,00
Mulčovanie dŕvou a štrkom na textíliu	m3	3,000	48,00	144,00	48,00	0,00	144,00	0,00
Položenie mulčovacej textílie	m2	140,000	0,15	21,00	0,15	0,00	21,00	0,00
Výsev trávnik	m2	818,000	0,48	392,64	0,48	0,00	392,64	0,00
Valcovanie trávnik	m2	818,000	0,09	73,62	0,09	0,00	73,62	0,00
Osadenie obruby Ekobrim	bm	170,000	1,60	272,00	1,60	0,00	272,00	0,00
Zvislý presun na strechu objektu				960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Rozprestretiešného substrátu, vyrovnanie	m2	633,000	1,20	759,60	1,20	0,00	759,60	0,00
Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	633,000	0,14	88,62	0,14	0,00	88,62	0,00
Doplnenie štrkov na strechu objektu	m3	4,500	38,00	171,00	38,00	0,00	171,00	0,00
Rozprestretie drenážnej fólie	m2	750,000	0,90	675,00	0,90	0,00	675,00	0,00
Osadenie solitérnych kameňov			25,00	30,00	25,00	0,00	30,00	0,00
Osadenie zavlazovacích hadíc			18,00	20,00	18,00	0,00	20,00	0,00
Výsev trsov a rezkov skalničiek	m2	633,000	0,95	601,35	0,95	0,00	601,35	0,00
Výsadba dreviny s balom pri priemeru balu nad 500 do 600 mm	kus	16,000	13,50	216,00	13,50	0,00	216,00	0,00
Výsadba dreviny s balom pri priemeru balu nad 100 do 200 mm	kus	48,000	1,45	69,60	1,45	0,00	69,60	0,00
Výsadba dreviny s balom pri priemeru balu nad 200 do 300 mm	kus	255,000	2,40	612,00	2,40	0,00	612,00	0,00
Výsadba dreviny s balom pri priemeru balu do 100 mm	kus	195,000	0,98	191,10	0,98	0,00	191,10	0,00
Ukotoenie dreviny tromi a viac kolmi s ochranou proti poškodeniu v mies	kus	16,000	9,15	146,40	9,15	0,00	146,40	0,00
Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín s 50% výmenou pôdy objemu nad	kus	16,000	36,00	576,00	36,00	0,00	576,00	0,00
Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín objemu nad 0,02 do 0,05 m3	kus	255,000	1,00	255,00	1,00	0,00	255,00	0,00
Hĺbenie jám pre vysadzovanie rastlín objemu do 0,01 m3	kus	243,000	0,25	60,75	0,25	0,00	60,75	0,00
Zaliatie rastlín vodou	m3	12,000	3,10	37,20	3,10	0,00	37,20	0,00
Práce spolu :				8 332,23			8 332,23	0,00
SADOVÉ ÚPRAVY - MATERIÁL :								
Mulčovacia kôra s dopravou	ks	73,000	5,90	430,70	6,20	0,30	452,60	21,90
Koly ku stromom, dĺžka 2-3m	ks	48,000	2,60	124,80	4,90	2,30	235,20	110,40
Polkoly	ks	16,000	1,48	23,68	3,50	2,02	56,00	32,32
Úväzový materiál ku stromom	ks	16,000	1,00	16,00	1,00	0,00	16,00	0,00
Závažková perforovaná hadica, priemer max 8 cm, 3 bm/strom v diaľžbe	bm	12,000	2,50	30,00	0,41	-2,09	4,92	-25,08

Celková rekapitulácia sadových úprav:

Práce spolu:

Materiál:

Spolu:

DPH 20%:

CENA SPOLU s 20 % DPH:

8 332,23

23 324,48

31 656,71

6 331,34

37 988,05

8 332,23

30 263,62

38 595,85

0,00

6 939,14

6 939,14

EUR

EUR

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-5 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Kalinkovo

KS:

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:

Obec Kalinkovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	25 629,16
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	25 629,16
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 629,16	5 125,83

Cena s DPH	v EUR	30 754,99
-------------------	--------------	------------------

Projektant

25.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

31.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 612/3, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis:  Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-5 - Vodovodná prípojka

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 629,16
HSV - Práce a dodávky HSV	25 629,16
8 - Rúrové vedenie	25 629,16
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 629,16

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-5 - Vodovodná prípojka

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P						

Náklady z rozpočtu **25 629,16**

HSV - Práce a dodávky HSV 25 629,16

8 - Rúrové vedenie 25 629,16

1	K	1	Vodovodná prípojka	sub	1,000	25 629,16	25 629,16
---	---	---	--------------------	-----	-------	-----------	-----------

Investor :

Projektant:

Dodávateľ:

Dátum :

Stavba : **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZAKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č.48/5,48/8,48/9,48/10,48/11-C-KN**
p.č.48,49,56,57-E-KN

Objekt : **04 - Vodovodná prípojka**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcie a práce €	Spolu	Hmotnosť v tonách	Jednotková Spolu	Suť v tonách
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------------	-----------------------	-------	-------------------	------------------	--------------

REKAPITULÁCIA HSV

1.	1	Zemné práce			5 702,91			0,195	53,865	
2.	45	Podkladné konštrukcie			391,50				21,263	
3.	5	Vozovky			879,00				26,100	
4.	8	Potrúbné vedenie			15 349,52			14,922		
5.	9	Ostatné konštrukcie spolu :			1 863,80 24 186,73			15,117	101,228	
6.	99827 - 6101	Presun hmôt	15,12	t	30,57	462,11				
7.	99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	101,23	t	2,31	233,84				
		ZRN spolu :			24 882,68					
		Iné náklady (GZS)		%	3,00	746,48 €				
		Náklady bez DPH								25 629,16 €
		DPH		%		20,00				5 125,83 €

1 - ZEMNÉ PRÁCE

1.	132201201	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 75 x 1,0 x 1,3 = 97,50 m3 menej vozovka 20x 1 x 0,4 = - 8,00 m3 spolu : 89,50 m3	89,50	m3	18,00	1 611,00			
2.	132201209	Prír. za lep. tr. 3 89,50 x 0,30	26,85	m3	1,00	26,85			
3.	151101101	Zriadenie paženia rýh príložného 75 x 1,3 x 2	195,00	m2	3,50	682,50	0,001	0,195	
4.	151101111	Odstránenie paženia príložného	195,00	m2	2,10	409,50			
5.	174101001	Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 Výkop 89,50 m3 menej obsyp = - 39,75 m3 75 x 1,0 x 0,53 = - 49,75 m3 spolu : 89,50 m3	39,75	m3	3,40	135,15			
6.	175101101	Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia z pol. č.5 39,75 m3 menej lôžko = - 11,25 m3 spolu : 28,50 m3	28,50	m3	15,60	444,60			
7.	P.C.	Dodávka piesku - obsyp	28,50	m3	24,00	684,00	1,890	53,865	
8.	162501102	Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok 89,50 - 39,75 = 49,75 m3	49,75	m3	4,25	211,44			
9.	162501105	Prirážka za ďalší km - do 10 km	348,25	m3	0,40	139,30			
10.	171201201	Uloženie na skládke	49,75	m3	0,70	34,83			
11.	P.C.	Výčistenie trasy	0,08	km	450,00	33,75			0,500
12.	113107132	Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm	30,00	m2	34,00	1 020,00			15,000
13.	P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	15,00	t	18,00	270,00			
		Zemné práce spolu :				5 702,91			0,195
									53,865
1.	451573111	45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 75 x 1,0 x 0,15 = 11,25 m3	11,25	m3	34,80	391,50	1,890	21,263	
		Podkladné konštrukcie spolu :				391,50			21,263
1.	564861111	VOZOVKY Podklad zo štrkodry hr. 200 mm 20 x 1,5 = 30 m2	30,00	m2	6,00	180,00	0,371	11,130	
2.	581130115	Kryt bet. hr. 200 mm	30,00	m2	23,30	699,00	0,499	14,970	
		Vozovky spolu :				879,00			26,100



8 - POTRUBNÉ VEDEDNIE

1.	871251066	Montáž potrubia polyetyl. D 90	17,00	m	0,70	11,90	0,001	0,005
2.	871221062	Montáž potrubia polyetyl. D 63	44,00	m	0,60	26,40	0,001	0,001
3.	871221060	Montáž potrubia polyetyl. D 50	14,00	m	0,50	7,00	0,001	0,001
4.	857242121	Montáž tvaroviek liat. jednoosých DN 80	5,00	ks	21,00	105,00	0,004	0,020
5.	857262121	Montáž tvaroviek liat. jednoosých DN 100	1,00	ks	23,00	23,00	0,001	0,002
6.	857264121	Detto, odbočných DN 100	1,00	ks	27,30	27,30	0,001	0,002
7.	852242121	Montáž liat. potrubia do 1,0m prírubového DN 80	5,00	ks	25,30	126,50	0,001	0,001
8.	891241221	Montáž uzáverov v šachtách DN 80	2,00	ks	15,30	30,60	0,001	0,002
9.	891241111	Montáž uzáverov so zemnou súpravou DN 80	2,00	ks	23,01	46,02	0,001	0,001
10.	891261111	Montáž uzáverov so zemnou súpravou DN 100	1,00	ks	28,00	28,00	0,001	0,001
11.	891244121	Montáž mont. vložiek DN 80	1,00	ks	12,60	12,60	0,001	0,001
12.	891245321	Montáž spätnej klapky DN 80	1,00	ks	11,60	11,60	0,001	0,001
13.	891247211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	1,00	ks	23,00	23,00	0,001	0,001
14.	899401112	Montáž poklopov uzáverových	3,00	ks	21,20	63,60	0,001	0,001
15.	892241111	Tlakové skúšky do DN 80	75,00	m	0,75	56,25	0,119	0,357
16.	892372111	Zabezpečenie koncov	1,00	ks	190,00	190,00	0,052	0,052
17.	892233111	Preplach a dezinfekcia do DN 70	58,00	m	3,10	179,80	0,002	0,034
18.	892273111	Preplach a dezinfekcia do DN 125	17,00	m	4,50	76,50	0,002	0,002
19.	286	Potrubié PVC D 90	17,00	m	6,50	110,50	0,002	0,004
20.	286	Tvarovka ANPL 90/90	1,00	ks	17,00	17,00	0,001	0,014
21.	286	Tvarovka ENPL D 110	2,00	ks	18,00	36,00	0,001	0,044
22.	286	Potrubié rPE DN 40	14,00	m	2,10	29,40	0,003	0,003
23.	286	Potrubié rPE DN 50	44,00	m	4,20	184,80	0,012	0,012
24.	D + M	X DN 50	1,00	ks	44,00	44,00	0,007	0,014
25.	552	PP DN 80	1,00	ks	145,00	145,00	0,010	0,010
26.	552	E DN 80	2,00	ks	88,00	176,00	0,020	0,020
27.	552	FFR 100/80	1,00	ks	125,00	125,00	0,018	0,018
28.	552	T 100/100	1,00	ks	168,00	168,00	0,019	0,019
29.	552	FF DN 80 1,0m	1,00	ks	280,00	280,00	0,019	0,019
30.	552	FF DN 80 0,80 m	1,00	ks	394,00	394,00	0,009	0,018
31.	552	FF DN 80 0,40 m	1,00	ks	394,00	394,00	0,017	0,034
32.	552	FF DN 80 0,20 m	2,00	ks	88,00	176,00	0,019	0,019
33.	422	Vodovodný uzáver do zeme DN 80 PN 10	2,00	ks	225,00	450,00	0,006	0,018
34.	422	Vodovodný uzáver do zeme DN 100 PN 10	1,00	ks	345,00	345,00	0,017	0,051
35.	422	Zemná súprava teleskopická DN 80,100	3,00	ks	85,00	255,00	0,078	0,078
36.	422	Uzáverové poklopy do vozovky	3,00	ks	52,00	156,00	0,008	0,015
37.	422	Hydrant nadzemný DN 80	1,00	ks	1 540,00	1 540,00	0,012	0,012
38.	422	Uzáver prírubový DN 80 s ručným kolom	2,00	ks	249,00	498,00	0,020	0,020
39.	422	Montážna vložka DN 80	1,00	ks	297,00	297,00	0,020	0,020
40.	D + M	Združený vodomer DN 80	1,00	ks	1 125,00	1 125,00	0,020	0,020
41.	422	Spätná klapka DN 80	1,00	ks	220,00	220,00		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien
Objekt: 1246-6 - Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažďová kanalizácia
JKSO: Kalinkovo KS: 25.10.2022
Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022
Objednávateľ: Obec Kalinkovo IČO:
IČO DPH:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. IČO:
IČO DPH:
Projektant: IČO:
IČO DPH:
Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 254,46
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 254,46
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 254,46	6 050,89
Cena s DPH		v EUR		36 305,35

Projektant
25.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 

Spracovateľ
Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ
31.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 

Zhotoviteľ
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 639/23, 92901 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781870 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis: 16.10.2022 Pečiatka

42.	KP	Osadenie a dodávka vyhľadávacieho vodiča AY 4 mm2 vrátane vývodov	75,00	m	1,00	75,00	
43.	KP	Fólia výstražná	75,00	m	0,85	63,75	
44.	KP	Vodomerová šachta - osadenie a dodávka pref. VŠ vnútorného rozmeru 2800/1400/1800 + stropná doska + komín - bet. bloky 300x300x600 = 4ks bet C20/25 - vstupný poklop 600 x 600 - stupačky kanalizačné oceľové s Pe poťahom - podkladné konštrukcie podľa PD - komplet - potrebné zemné práce - komplet - izolačný náter	1,00	kpl	7 000,00	7 000,00	14,000 14,000

Potrúbné vedenie spolu: 15 349,52 14,922

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

1.	KP	Odstránenie jestvujúcej vodovodného potrubia DN 80, VŠ, hydrantu, odvoz a likvidácia vyb. hmôt	1,00	kpl	980,00	980,00	
2.	979082213	Odvoz suti do 1 km	15,00	t	1,00	15,00	
3.	979082219	Prír. za ďalší km 15 x 9	135,00	t	0,30	40,50	
4.	919735124	Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm	40,00	m	17,10	684,00	
5.	919722111	Rezanie dilat. škár	20,00	m	0,90	18,00	
6.	919726531	Zaliatie škár	20,00	m	6,00	120,00	
7.	919741121	Ošetrovanie krytu vodou	90,00	m2	0,07	6,30	

Ostatné konštrukcie spolu: 1 863,80

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: **1246-6 - Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažďová kanalizácia**

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 254,46
HSV - Práce a dodávky HSV	30 254,46
8 - Rúrové vedenie	30 254,46
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 254,46

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-6 - Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažďová kanalizácia

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo Projektant:
Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. Spracovateľ:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **30 254,46**

HSV - Práce a dodávky HSV **30 254,46**

8 - Rúrové vedenie **30 254,46**

1	K	1	Prípojka splaškovej kanalizácie, areálová dažďová kanalizácia	sub	1,000	30 254,46	30 254,46
---	---	---	--	-----	-------	-----------	-----------

Investor :
 Projektant:
 Dodávateľ:
 Dátum :

Stavba : **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZAKLADNEJ SKOLY KALINKOVO p.č.48/5,48/8,48/9,48/10,48/11-C-KN**
 p.č.48,49,56,57-E-KN

Objekt : **05 - Prípojka splašk. kanalizácie, areálová dažď. kanalizácia**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena €	Konštrukcia a práce €	špecifikovať materiál €	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Suť v t Jednotková
------------	-------------	---	-----------------	----------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	-------	------------------------------	--------------------

REKAPITULÁCIA HSV

1.	1	Zemné práce			24 423,73			1,078	231,336	
2.	45	Podkladné konštrukcie			1 582,89			2,566	77,112	
3.	5	Vozovky			4 306,50				129,195	
4.	8	Potrúbné vedenie			14 484,76			18,698		
5.	9	Ostatné konštrukcie spolu :			7 305,17			22,342	437,643	
6.	99827	- 610 Presun hmôt	22,34	t	30,57	682,99				
7.	99822	- 201 Presun hmôt - štrky	437,64	t	2,31	1 010,96				

ZRN spolu :

29 373,26

Iné náklady (GZS)

3,00 881,20 €

N á k l a d y b e z D P H

30 254,46 €

DPH

20,00 6 050,89 €

1 - Z E M N É P R Á Č E

1.	132201202	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000,0 m3			506,38	10,00	5 063,80			
		272 x 1,0 x 1,8	=	489,60	m3					
		šachty DN 600 1,2 x 1,2 x 4,79	=	6,90	m3					
		Š DN 1000 2,6 x 2,6 x 1,30 x 4	=	35,15	m3					
		2,60 x 2,60 x 2,12	=	14,33	m3					
		menej vozovka 99 x 1 x 0,4	=	- 39,60	m3					
		spolu :		506,38	m3					

2.	132201209	Prír. za lep. tr. 3 506,38 x 0,30	151,91	m3	1,00	151,91		
3.	151101101	Zriadenie paženia rýh príložného 272 x 1,8 x 2 + 1,2 x 4,79 x 4 + 2,6 x 1,3 x 4 x 4 + + 2,6 x 2,12 x 4 = 1 077,90 m2	1 077,90	m2	3,20	3 449,28	0,001	1,078
4.	151101111	Odstránenie paženia príložného	1 077,90	m2	2,40	2 586,96		
5.	174101002	Zásyp rýh, jám so zhutnením do 1000 m3 Výkop 506,38 m3	336,08	m3	3,20	1 075,46		
		menej obsyp 272 x 1,0 x 0,60 = - 163,20 m3						
		šachty 3,14 x 0,3 x 0,3 x 4,79 = - 1,35 m3						
		3,14 x 0,59 x 0,59 x 7,32 = - 5,75 m3						
		spolu : 336,08 m3						
6.	175101101	Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia z pol. č.5 163,20 m3 menej lôžko = - 40,80 m3 spolu : 122,40 m3	122,40	m3	15,20	1 860,48		
7.	P.C.	Dodávka piesku - obsyp	122,40	m3	23,00	2 815,20		
8.	162501122	Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok 506,38 - 336,08 = 170,30 m3	170,30	m3	3,00	510,90	1,890	231,336
9.	162501123	Prirážka za ďalší km - do 10 km	1 192,10	m3	0,25	298,03		
10.	171201202	Uloženie na skládke	170,30	m3	0,60	102,18		
11.	P.C.	Vytýčenie trasy	0,27	km	456,00	124,03		
12.	113107132	Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm	148,50	m2	34,00	5 049,00		0,500
13.	P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	74,25	l	18,00	1 336,50		
		Zemné práce spolu :				24 423,73		
							1,078	231,336
1.	451573111	45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 272 x 1,0 x 0,15 = 40,80 m3	40,80	m3	35,00	1 428,00	1,890	77,112
2.	452311131	Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 3,14 x 0,4 x 0,4 x 0,10 x 3 = 0,15 m3	1,15	m3	95,00	109,25	2,217	2,550
3.	452351101	3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 5 = 1,00 m3 Debnenie dosiek 3,14 x 0,8 x 0,1 x 3 = 0,75 m2 3,14 x 1,6 x 0,1 x 5 = 2,51 m2	3,26	m2	14,00	45,64	0,005	0,016
		Podkladné konštrukcie spolu :				1 582,89		
1.	564861111	VOZOVKY Podklad zo štrkodry hr. 200 mm 99 x 1,5 = 148,50 m2	148,50	m2	6,00	891,00	0,371	55,094
2.	581130115	Kryt bet. hr. 200 mm	148,50	m2	23,00	3 415,50	0,499	74,102

8 - POTRUBNÉ VEDEDNIE

1.	871356026	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 150,125	212,00	m	0,60	127,20			
2.	871356028	Montáž potrubia kanalizačného PVC DN 200	60,00	m	0,77	46,20			
3.	D + M	Šachta WAVIN DN 600 vrátane poklopu D + M	3,00	ks	655,00	2 565,00	0,200	0,600	
4.	894411111	Šachty kanalizač. na potrubí DN 200	5,00	ks	412,00	2 060,00	1,829	9,145	
5.	899104111	Osadenie poklopuv	5,00	ks	31,00	155,00	0,007	0,035	
6.	592	Skružň prechodová 1000/625 SK - s osad. stup.	5,00	ks	116,00	580,00	0,510	2,550	
7.	592	Skružň rovná 1000/1000 - s osadenými stupáčkami	1,00	ks	125,00	125,00	0,960	0,960	
8.	592	Detto, 1000/500	5,00	ks	75,00	375,00	0,240	1,200	
9.	592	Šacht. dno na potr. DN 200 s poplast. stupáčkami s prechodkami do stien H 600 mm DN 1000	1,00	ks	645,00	645,00	1,000	1,000	
10.	552	Poklopy DN 600 kategória D400	5,00	ks	187,00	935,00	0,170	0,850	
11.	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 150,125	212,00	m	1,25	265,00			
12.	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 200	60,00	m	1,65	99,00			
13.	"R"	Zabezpečenie koncov	5,00	ks	89,00	445,00			
14.	286	Potrubie PVC DN 125 SN 8 + 20 % tvarovky	173,00	m	10,50	1 816,50	0,01	1,21	0,346
15.	286	Potrubie PVC DN 150 SN 8 + 20 % tvarovky	39,00	m	13,50	526,50	0,01	1,21	0,117
16.	286	Potrubie PVC DN 200 SN 8 + 20 % tvarovky	60,00	m	22,00	1 320,00	0,01	1,21	0,300
17.	KP	Osadenie a dodávka výstražnej fólie	272,00	m	0,88	239,36			
18.	KP	Osadenie a dod. nádrže na dažďovú vodu vrátane podkladných konštrukcií, ZP, skúšok - komplet	3,00	ks	710,00	2 130,00			
19.	211571112	Výpiť studne zo štrkopiesku	1,00	m3	30,00	30,00	1,595	1,595	
		Potrubné vedenie spolu:				14 484,76			18,698

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

1.	KP	Odstránenie jestvujúcej kanalizačného potrubia odvoz a likvidácia vyb. hmôt	45,00	m	45,00	2 025,00			
2.	979082213	Odvoz sutí do 1 km	74,25	t	1,50	111,38			
3.	979082219	Prír. za ďalší km 74,25 x 9	668,25	t	0,34	227,21			
4.	919735124	Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm	198,00	m	17,00	3 366,00			
5.	919722111	Rezanie dilat. škár	99,00	m	9,50	940,50			
6.	919726531	Zaliatie škár	99,00	m	6,10	603,90			
7.	919741121	Ošetrovanie krytu vodou	445,50	m2	0,07	31,19			
		Ostatné konštrukcie spolu:				7 305,17			

onách
Spolu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-7 - Predĺženie areálového NTL plynovodu

JKSO:
Miesto: Kalinkovo

KS:
Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ:
Obec Kalinkovo

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:



Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 500,75
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 500,75
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 500,75	1 100,15
Cena s DPH		v EUR		6 600,90

Projektant

25.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

25.10.2022
Dátum a podpis:  Pečiatka 

Zhotoviteľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Sreda
Slovenská republika
IČO: 5073570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886
Dátum a podpis:  Pečiatka

74,250

74,250

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-7 - Predĺženie areálového NTL plynovodu

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	5 500,75
HSV - Práce a dodávky HSV	5 500,75
8 - Rúrové vedenie	5 500,75
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 500,75

ROZPOČET

Stavba: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien

Objekt: 1246-7 - Predĺženie areálového NTL plynovodu

Miesto: Kalinkovo Dátum: 25.10.2022

Objednávateľ: Obec Kalinkovo

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P							

Náklady z rozpočtu 5 500,75

HSV - Práce a dodávky HSV 5 500,75

8 - Rúrové vedenie 5 500,75

1	K	1	Predĺženie areálového NTL plynovodu	sub	1,000	5 500,75	5 500,75
---	---	---	-------------------------------------	-----	-------	----------	----------

Investor :
 Projektant :
 Dodávateľ :
 Dátum :

Stavba : **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZAKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO p.č.48/5,48/8,48/9,48/10,48/11-C-KN**
 p.č.48,49,56,57-E-KN

Objekt : **06 - Predĺženie areálového NTL plynovodu**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	špecifikačný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
								Spolu	Jednotkov	Spolu	Jednotková

REKAPITULÁCIA HSV

1.	1	Zemné práce				2 546,33		0,065	16,065		
2.	45	Podkladné konštrukcie				112,50			7,088		
3.	5	Vozovky				870,00			26,100		
4.	9	Ostatné konštrukcie spolu :				1 049,75 4 578,58		0,065	49,253		

5.	99827 - 2201	Presun hmôt	0,07	t	10,60	0,69					
6.	99822 - 2011	Presun hmôt - štrky	49,25	t	2,31	113,77					

HSV spolu : 4 693,04

1. 23 Ocelové potrubie 647,49

ZRN spolu : 5 340,53

Iné náklady (GZS) 5 340,53 % 3,00 160,22 €

N á k l a d y b e z DPH 5 500,75 €

DPH 5 500,75 % 20,00 1 100,15 €

Poznámka : Výpis materiálu je súhrnom len základného materiálu pre dodávku zrealizovanú v súlade s PD.
Podrobný rozpis si spracuje dodávateľ vo vlastnej réžii

		1 - ZEMNÉ PRÁČE						
1.	132201201	Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 100 m3 25 x 1,0 x 1,3 = 32,50 m3 menej vozovka 20x1 x 0,4 = - 8,00 m3 spolu : 24,50 m3	24,50	m3	18,00	441,00		
2.	132201209	Prír. za lep. tr. 3 24,50 x 0,30	7,35	m3	1,00	7,35		
3.	151101101	Zriadenie paženia rýh príložného 25 x 1,3 x 2	65,00	m2	3,50	227,50	0,001	0,065
4.	151101111	Odstránenie paženia príložného	65,00	m2	2,10	136,50		
5.	174101001	Zásyp rýh, jám so zhutnením do 100 m3 Výkop 24,50 m3 menej obsyp 25 x 1,0 x 0,49 = - 12,25 m3 spolu : 12,25 m3	12,25	m3	3,00	36,75		
6.	175101101	Obsyp potrubia, objektov bez prehodenia z pol. č.5 menej ľžko = - 3,75 m3 spolu : 8,50 m3	8,50	m3	14,50	123,25		
7.	P.C.	Dodávka piesku - obsyp	8,50	m3	24,00	204,00	1,890	16,065
8.	162501102	Vodorov. prem. výkopku do 3km - prebytok 24,50 - 12,25	12,25	m3	2,10	25,73		
9.	162501105	Prirážka za ďalší km - do 10 km	85,75	m3	0,40	34,30		
10.	171201201	Uloženie na skládke	12,25	m3	0,70	8,58		
11.	P.C.	Vytýčenie trasy	0,03	km	455,00	11,38		
12.	113107132	Odstránenie vozovky z bet. hr.do 200 mm	30,00	m2	34,00	1 020,00	0,500	15,000
13.	P.C.	Poplatok za uskladnenie betónov	15,00	t	18,00	270,00		
		Zemné práce spolu :	2 546,33				0,065	15,000
							16,065	
1.	451573111	45 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 25 x 1,0 x 0,15 = 3,75 m3	3,75	m3	30,00	112,50	1,890	7,088
		Podkladné konštrukcie spolu :				112,50		7,088

VOZOVKY

1.	564861111	Podklad zo štrkrodny hr. 200 mm 20 x 1,5 = 30 m ²	30,00	m ²	6,00	180,00	0,371	11,130
2.	581130115	Kryť bet. hr. 200 mm	30,00	m ²	23,00	690,00	0,499	14,970
		Vozovky spolu:				870,00		26,100

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

1.	979082213	Odvoz suti do 1 km	15,00	t	1,49	22,35		
2.	979082219	Priř. za ďalší km 15 x 9	135,00	t	0,30	40,50		
3.	919735124	Rezanie podkladu a krytu vozovky hr.200 mm	40,00	m	17,00	680,00		
4.	919722111	Rezanie dilat. škár	20,00	m	9,03	180,60		
5.	919726531	Zaliatie škár	20,00	m	6,00	120,00		
6.	919741121	Ošetrovanie krytu vodou	90,00	m ²	0,07	6,30		
		Ostatné konštrukcie spolu:				1 049,75		

23 - POTRUBNÉ VEDEDNIE PLYNOVODNÉ

1.	23020	Montáž potrubia ocel.čierne zvarané DN 40	25,00	m	11,00	275,00		
2.	114	Potrubie ocel DN 40 + náter	25,00	m	10,20	255,00		
3.	230	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	25,00	m	0,23	5,75		
4.	230	Príprava pre skúšku tesnosti DN do 40	1,00	ús	71,00	71,00		
5.	D + M	Výstražná fólia	25,00	m	0,89	22,25		
6.	IMV	Murárska výpomoc	629,00	%	0,98	6,16		
7.	PM	Podružný materiál	629,00	%	0,98	6,16		
8.	PPV	Podiel pridružených výkonov	629,00	%	0,98	6,16		
		Oceľové potrubie spolu:				647,49		

ZOZNAM PRÍLOH k Dodatku č.1

Stavba: **Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo- navýšenie cien**

v Dunajskej Stryde dňa 26.10.2022

2 - Zakladanie			CP od spol.	Pril.č.
19	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	1
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie				
30	K	3112314831	Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 30 cm	2
31	K	3112314841	Murivo nosné z tehál pálených brúsených hr. 25 cm	2
35	K	311361821	Výstuž 10505 žb stien a muriva z debn. tvármic	1
44	K	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	1
48	K	342243103	Priečky z tehál pálených brúsených 11,5 P+D hr. 11,5 cm	2
4 - Vodovonné konštrukcie				
64	K	411361821	Výstuž stropov, nosníkov a vencov z betonárskej ocele 10505	1
66	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	1
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
94	K	632477001	Liaty samonivelačný poter hr.15mm	3
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				
113	M	6283229401	Pásky ťažké asfaltované Velbit AL S 40	4
712 - Izolácie stiech				
120	M	2833000151	Fólia na báze mPVC, odolná voči UV žiareniu a proti prerastaniu koreňov, min. hr. 1,5 mm	4
123	M	6936651001	Geotextília netkané polypropylénové Tatrutex pp 300	3
713 - Izolácie tepelné				
132	M	2837650051	Spádový extrud. polystyrén hrúbka 20-70mm	4
134	M	2837651171	Tep. izol. doska z kamennej vlny hrúbka 200 mm, 50 kg/m3	7
136	M	28376500601	Extrud polystyrén hrúbka 100mm	3
137	M	28376500602	Extrud polystyrén hrúbka 200mm	3
142	M	28376400001	Dosky z elastifikovaného polystyrénu - ISOVER EPS FLOOR 5000 alebo iný ekvivalentný výrobok, hr. 40 mm	8
147	M	2837651120	Tep. izol. doska z minerálnej vlny hrúbka 200 mm	3
148	M	2837653150	Izolácia int. stien hr. 100mm	3
762 - Konštrukcie tesárske				
161	M	6051533602	Hranol smrekový impregnovaný hobľovaný	9
166	M	5959050015	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr.18 mm (1250x3350mm)	10
167	M	5959050017	Cementotrieskové dosky CETRIS BASIC hr. 22 mm (1250x3350mm)	10
171	M	6051506901	Hranolček mäkké rezivo impregnované	9
766 - Konštrukcie stolárske				

200	K	766411140	Drevená podlaha terasy s 2 schodmi - tepelne upravené drevo pri teplote min. 215°C Thermo Wood, vrátane drev.podkladného roštu v spáde	PROKOM SR, s.r.o.	11
767 - Konštrukcie doplnkové kovové					
215	M	5530000040	D+M oceľová int.mreža-zábradlie š 155 x v 326cm, výroba, doprava, dielenská dokumentácia, povrch.úprava - 3x náter: antikorózna alkyd uretánová vrchná aj základná farba v jednom. matná čierna RAL 9005, so zvýš. pružnosťou, odolnosťou	PROIMPEX s.r.o.	12
224	M	6113903200	Svetlík do plochej strechy, zasklený izolačným dvojsklom + polykarbonátovou čiarou kupolou, 100x100 mm, neotvárací (napr. VELUX CFP 100/100) alebo iný ekvivalentný výrobok	VELUX SLOVENSKO spol. s.r.o.	14
225	M	5530000038	Nosná kcia pod svetlíky - oceľový L profil a drevené hranoly-vid'.15 Details, výkazy mat.	PROIMPEX s.r.o.	15
226	M	4297100177	D+M rebrík na fasádu š 60cm, 5,1 m	PROIMPEX s.r.o.	16
227	K	767631112	Montáž a doprava hliníkových zasklených stien	Zaluman s.r.o.	17
228	M	6114107800	Hliníková vstupná rohová zasklená stena (5,53+4,975)x3,035m, RAL 7016 - ozn. A1	Zaluman s.r.o.	17
231	M	61141221001	Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,15x2,1m, RAL 7016 - ozn. A2	MBK okno s.r.o.	18
232	M	61141221002	Plastová vstupná rohová zostava (5,945+5,025)x2,05m, RAL 7016 - ozn. A3	MBK okno s.r.o.	18
233	M	61141221003	Plastové dvere s bočným svetlíkom 2,06x2,3m, RAL 7016 - ozn. A4	MBK okno s.r.o.	18
234	M	61141221004	Plastové dvere posuvné 3,23x2,3m, RAL 7016 - ozn. A5	MBK okno s.r.o.	18
235	M	61141221005	Plastové 4-dielne okno 1,93x3,16m + sieťka, RAL 7016 - ozn. A6	MBK okno s.r.o.	18
236	M	61141221006	Plastové dvere s bočným svetlíkom 3,05x2,1m, RAL 7016 - ozn. A7	MBK okno s.r.o.	18
237	M	61141221007	Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-1,np	MBK okno s.r.o.	18
238	M	61141221007.	Plastová okenná zostava 7,4x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B1-2,np	MBK okno s.r.o.	18
239	M	61141221008	Plastová okenná rohová zostava (5,65+1,825)x2,25m + sieťky + vnút. a vonk. parapety, RAL 7016 - ozn. B2	MBK okno s.r.o.	18
240	M	61141221009	Plastové okno 0,6x1,25m + sieťka + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B3	MBK okno s.r.o.	18
241	M	61141221010	Plastové okno 2,0x0,6m + sieťka + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B4	MBK okno s.r.o.	18
242	M	61141221011	Plastové okno 1,645x1,25m + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B5	MBK okno s.r.o.	18
243	M	61141221012	Plastové okno 2,15x1,5m + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B6	MBK okno s.r.o.	18
244	M	61141221013	Plastové okno 1,5x1,52m + vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B7	MBK okno s.r.o.	18
245	M	61141221014	Plastové okno 2,15x2,0m + vnút. a vonk. parapet, RAL 7016 - ozn. B8	MBK okno s.r.o.	18

246	M	61141221015	Plastové dvere plné 1,0x2,05m, RAL 7016 - ozn. 5	MBK okno s.r.o.	18
248	M	5534485200	D+M sekcionálna výsuvná brána zateplená 3,0x2,0m, pohon motor, 3x diaľkové ovládanie, RAL 7016, pre potreby premiestňovania objemnejších technických zariadení do kotolne cez technickú miestnosť a v nrisťavanej časti	Danter brány s.r.o.	19
249	M	55344852021	D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastíľkoch 2,95x2,97m, s el.pohonom + krycie plechy, RAL 7016 - ozn. Ž1	Vitro-Plast s.r.o.	20
250	M	55344852022	D+M vonkajšia hliníková žalúzia v skrytých kastíľkoch (3,7+3,7)x2,2m, s el.pohonom + krycie plechy, RAL 7016 - ozn. Ž2	Vitro-Plast s.r.o.	20
252	M	5534370703	D+M 2-krídl. bránka k smetým nádobám š 3,4m, v 1,8m, joklovina+výplň Cetris, farba antracit, výroba, doprava, dielenská dokumentácia-vid'.15 Detaily, výkazy mat.	PROIMPEX s.r.o.	21
255	M	5534370715	D+M Fasádne kovové hodiny, d=2,0 m, výroba, doprava, dielenská dokumentácia	Elektročas s.r.o. Sz & W elektro s.r.o.	22, 23
259	M	59764047001	Dlaždice gresové 10 mm a 12 mm	INGEMA s.ro.	24
260	M	5976404700	Dlaždice gresové protišmykové mrazuvzdorné 10 mm a 12 mm	INGEMA s.ro.	24
776 - Podlahy povlakové					
263	K	776591000	Lepenie povlakových podláh	DELPHY, s.r.o.	13
264	M	2841291500	Podlahovina marmóleum hr. cca 3 mm	DELPHY, s.r.o.	13
781 - Dokončovacie práce a obklady					
267	M	5976582600	Obkladačky keramické glazované, jednofarebné hladké	INGEMA s.ro.	24

VYKUROVANIE

713 - Izolácie tepelné

7	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	Ervin Mészáros TZB	25
8	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	Ervin Mészáros TZB	25
9	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	Ervin Mészáros TZB	25
10	M	286210003700	Rúra plasthliníková D 16x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-PeX	Ervin Mészáros TZB	25
11	M	286210003900	Rúra plasthliníková D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém	Ervin Mészáros TZB	25
12	M	286210004000	Rúra plasthliníková D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém	Ervin Mészáros TZB	25

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

15	M	484810007200	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom a bypassom M 34, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos Para RS 25/6, výkon 45/22,5 kW,	Ervin Mészáros TZB	25
19	M	316170019600.S	Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele	Ervin Mészáros TZB	25
21	M	316170020800.S	Závit varný 1 1/4", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	Ervin Mészáros TZB	25
23	M	316170017800.S	Dienko varné DN 20 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	Ervin Mészáros TZB	25
25	M	286220039800	Spojka D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
27	M	286220040000	Spojka D 20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
29	M	286220040100	Spojka D 26 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
31	M	286220040200	Spojka D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
33	M	286210004600	Rúra plasthímková D 32x3 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
35	M	286220046800	Redukcia D 20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
37	M	286220047000	Redukcia D 26/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
38	M	286220047200	Redukcia D 26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
39	M	286220047500.S	Redukcia lisovacia pre plasthímkové potrubie D 32/20 mm	Ervin Mészáros TZB	25
40	M	286220047500	Redukcia D 32/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
42	M	286220007700	T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
44	M	286220008600	T-kus D 16/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
46	M	286220008900	T-kus D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
48	M	286220009700	T-kus D 26/16/26 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
52	M	286220010400	T-kus D 26/26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
54	M	286220010500	T-kus D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
56	M	286220008100	T-kus D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
58	M	286220023800	Prechod D 32x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém,	Ervin Mészáros TZB	25
59	M	286220023400	Prechod RADOPRESS D 20x1/2" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	Ervin Mészáros TZB	25

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

65	M	551210044900	Guľový ventil I 1/4", páčka červená-chróm. GIACOMINI	Ervin Mészáros TZB	25
67	M	551210012100	Ventil odvodušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast,	Ervin Mészáros TZB	25
68	M	551290008100	Pripojovacie skrutkovanie pre VT rohové 2-rúrový systém, EKx3/4"F, PN 10, niklovaná mosadz,	Ervin Mészáros TZB	25
69	M	I	Nákrutka so zvieracím krúžkom 16mm	Ervin Mészáros TZB	25

71	M	551280001300	Termostatická hlavica ET35	Ervin Mészáros TZB	25
----	---	--------------	----------------------------	--------------------	----

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

77	M	484530018300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 22, vxlxhl 400x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
78	M	484530018500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 22, vxlxhl 400x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
80	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
81	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
83	M	484530034200	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové VK 33, vxlxhl 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
85	M	484530034300	Teleso vykurovacie doskové trojradové ocelové VK 33, vxlxhl 300x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	Ervin Mészáros TZB	25
87	M	484120021300	servomotor SK 3, 230 V/750 Hz pre zmesavac, vonterma rucna/automaticka prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 25 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VIESMANN	Ervin Mészáros TZB	25
89	M	5523	Rýchlomontážna sada VK pre spodné napojenie pozostáva z: ventilovej vložky, odvzdušňovacej, zátky, záslepký, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	Ervin Mészáros TZB	25

Vzduchotechnika

Zariadenie č.1

1.1	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-L1-F7/M5-C6-L/A (ľavá) (KOMFOVENT-TZB produkt) Q _p : 600 m ³ /h / 200Pa Q _o : 600 m ³ /h / 200Pa Q _{ei} : 2x176W / 230V/50Hz Q _{el} ohrev: 2,0kW / 230V/50Hz Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládaci panel C6.1 Hmotnosť jednotky: 93kg 2x spätná klapka RSK250 + dilatčná manžeta 250-4x	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.2	Vetracia jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-R1-F7/M5-C6-L/A (pravá) (KOMFOVENT-TZB produkt)	COM-KLIMA s.r.o.	26

	<p>Q_p: 600 m³/h / 200Pa Q_o: 600 m³/h / 200Pa Q_{ei}: 2x176W / 230V/50Hz Q_{ei,ohrev}: 2,0kW / 230V/50Hz</p> <p>Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací panel C6.1 Hmotnosť jednotky: 93kg 2x spätná klapka RSK250 + dilatčná manžeta 250-4x</p>		
1.3	Kombinovaná mriežka CVWX 250	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.4	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-355x355-S-RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.5	Tlmič hliuku THR-100-250-1500 (systemair)	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.6	Tlmič hliuku THR-100-250-1000 (systemair)	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.7	Prívodný vrtivý anemostat VKR-A-S-400x8-B-RAL9010 Pretlakový box PB-VVK-S-400-160-S-H-D1	COM-KLIMA s.r.o.	26
1.8	Odvodné sito 250	COM-KLIMA s.r.o.	26
	VZT potrubie kruhové SPIRO	COM-KLIMA s.r.o.	26
	SR 250 (30% tv.)		
	SR 160 (10% tv.)		
	Tepelná izolácia potrubia sania a výfuku 15mm		
	Potrubie štvorhranné do obvodu 1420mm (100% tv.)		
	Zariadenie č.2		
2.1	Odvodný ventilátor TD 500/160	COM-KLIMA s.r.o.	26
	Q _o : 400 m ³ /h / 80Pa Q _{ei} : 30W / 230V/50Hz		
	1x spätná klapka RSK160 + dilatčná manžeta 160-2x		
2.2	Odvodný ventilátor QX 100 T s časovým dobehom a spätnou klapkou	COM-KLIMA s.r.o.	26
	Q _o : 80 m ³ /h / 80Pa Q _{ei} : 28W / 230V/50Hz		
2.3	Výfuková hlavica VHO 100	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.4	Krycia mriežka IGC 160 - RAL ..	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.5	Krycia mriežka IGC 200 - RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.6	Krycia mriežka IGC 100 - RAL...	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.7	Tanierový ventil odvodný TVO 100	COM-KLIMA s.r.o.	26
2.8	Sito šikmé 160	COM-KLIMA s.r.o.	26
	VZT potrubie kruhové SPIRO		
	SR 400 (30% tv.)		
	SR 200 (30% tv.)		
	SR 160 (30% tv.)		
	SR 100 (30% tv.)		

Krycia mriežka do dverí 450x450 - tech. miestnosť 1.11		
Montážny spojovací a tesniaci materiál	COM-KLIMA s.r.o.	26
Skušky a zaregulovanie	COM-KLIMA s.r.o.	26

Sadové úpravy

Sadové úpravy - materiál	MAX GARDEN	27
Mulčovacia kôra s dopravou	MAX GARDEN	27
Koly ku stromom, dĺžka 2-3m	MAX GARDEN	27
Polkoly	MAX GARDEN	27
Závlahová perforovaná hadica, priemer max 8 cm, 3 bm/strom v dľažbe	MAX GARDEN	27
Dreviny	MAX GARDEN	27
Ekobrim bez klincov	MAX GARDEN	27
Extenzívny strešný substrát s dopravou	MAX GARDEN	27
Mulčovacia textília	MAX GARDEN	27

Súpis drevín:

Acer campestre Elsrjik 12/14 cm	MAX GARDEN	27
Prunus fruticosa Globosa 12/14 cm	MAX GARDEN	27
Sorbus aria Magnifica 12/14 cm	MAX GARDEN	27
Pinus parviflora Negishi 125/150 cm	MAX GARDEN	27
Pinus mugo Pumilio 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Prunus laurocerasus Rotundifolia 40/60 cm	MAX GARDEN	27
Prunus laurocerasus Otto Luyken 20/30 cm	MAX GARDEN	27
Pachysandra terminalis Co 7 cm	MAX GARDEN	27
Lonicera pileata 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Euonymus fortunei Emerald Gold 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Spiraea japonica Goldflame 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Spiraea japonica little Princess 15/20 cm	MAX GARDEN	27
Carex testacea Prairie Fire Co 1l	MAX GARDEN	27
Carex testacea orange Sedge Co 1l	MAX GARDEN	27
Uncinia rubra Co 1l	MAX GARDEN	27
Echinacea purpurea Co 1l	MAX GARDEN	27
Salvia nemorosa Co 1l	MAX GARDEN	27

Hemerocallis Co 1l	MAX GARDEN	27
Gaura lindheimeri Co 1l	MAX GARDEN	27
Asrer dumosus Jenny Co 1l	MAX GARDEN	27
Gypsophila paniculata Co 1l	MAX GARDEN	27
Thymus praecox Co 7 cm	MAX GARDEN	27
Geranium sanquineum Co 7 cm	MAX GARDEN	27
Origanum vulgare Aureum Co 7 cm	MAX GARDEN	27

DEK

ponuka
NAB-620-22-00410

1

dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o.
Pobočka Dunajská Streda
Kračanská cesta 1239/42
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

dátum vystavenia:
5.5.2022
platí do:
10.5.2022

IČO: 43821103
IČ DPH: SK2022484849

DIČ: 2022484849

odberateľ

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

pol C 13
35
47
57
66

IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
DIČ: 2120487886

so sídlom:
Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

so sídlom:
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda

č. pol.	popis a poznámka	množstvo MJ	cena MJ cenník bez DPH	zľava	cena MJ po zľave bez DPH	cena MJ po zľave s DPH	cena spolu bez DPH
4400993265	* KR bet. oceľ 8mm s ohybom	545,00000 kg	3,22	46,27 %	1,73	1,73	942,85
4400993275	* KR bet. oceľ 10mm s ohybom	2 671,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	4 620,83
4400993285	* KR bet. oceľ 12mm s ohybom	5 254,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	9 089,42
4400993295	* KR bet. oceľ 14mm s ohybom	957,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	1 655,61
4400993305	* KR bet. oceľ 16mm s ohybom	277,00000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	479,21
4400993325	* KR bet. oceľ 22mm s ohybom	212,000 kg	3,03	42,90 %	1,73	1,73	366,76

upozornenie pre zákazníka:

- Tovar označený:
 - Je atypický tovar objednaný iba pre Vašu zakázku. Vrátenie takto označeného tovaru nie je možné.
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby obvyklé kvality.
- Množstevné údaje v tejto cenovej ponuke sú len orientačné. Za vzniknuté rozdiely medzi množstvom uvedeným v tejto ponuke a skutočnou spotrebou na konkrétnej stavbe nezodpovedáme.
- V prípade, že požadujete zabezpečenie dopravy tovaru, vyžiadaťte si, prosím, cenovú kalkuláciu dopravy.

cena bez DPH	17 154,68 EUR
základ DPH 0 %	17 154,68 EUR
DPH 0 %	0,00 EUR
zaokrúhlenie	0,00 EUR
spolu	17 154,68 EUR

k úhrade 17 154,68 EUR

poznámka:

Termín dodania: 10-12 prac. dní od objednávky
V cene je dodanie bez vytkádky.

tošfimo
sta ma
spoluprácu

informácia k zakázke:

kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
akcia:
objednávka:

vystavil: Konkoly Attila, Mgr.
telefón: +421902950369
e-mail: attila.konkoly@dek-sk.com

Zapísaný v OR, vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sro, vložka 62/13/L



Navos spol. s r.o., Velkobláhovska 47, 92901 Dunajska Streda

Tel./fax : 031/552-76-61,031/550-57-11 IČO: 30840961 IČDPH: SK2020366194 DIČ: 2020366194

Zapis. v OR okr.sudu Trnava, Sro vl.c.2655/T

2
pol. 30
31
48

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

IČDPH: SK2120487886

Kračanská cesta 690/23

DIČ: 2120487886

929 01 Dun.Streda

Tel.:

Slovensko

Fax:

CP č.: 220139

CENOVÁ PONUKA

Číslo dopytu: Kallnkovo

18.04.2022

Názov	Cena/MJ v EUR bez DPH	Množstvo	MJ	Cena spolu v EUR bez DPH	Zfava v %	Termin dodania
Termobrik TD 250 PD P15 DRY +Pur pena	229,89	1	M3			..
Termobrik TD 300 PD P15 DRY +Pur pena	229,89	1	M3			..
Termobrik TD 115 PD DRY +Pur pena	34,62	1	M2			..
Paleta	18,00	1	ks			
Predávajúci fakturuje palety pri odbere tovaru rozmer 1180x1000x130mm						
Nie sme zodpovední za množstvo!!!						

Platnosť cenovej ponuky: 30 dni

Vystavil: ST



Navos spol. s r.o., Velkoblahovska 47, 92901 Dunajska Streda

Tel./fax : 031/552-76-61,031/550-57-11 IČO: 30840961 IČDPH: SK2020366194 DIČ: 2020366194

3

pol. 37

Zapís. v OR okr.sudu Trnava, Sro vl.c.2655/T

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dun.Streda
Slovensko

IČDPH: SK2120487886
DIČ: 2120487886
Tel.:
Fax:

CP č.: 220214

Číslo dopytu: kalinkovo

CENOVÁ PONUKA

03.11.2022

Číslo	Názov	Cena/MJ v EUR bez DPH	Množstvo	MJ	Cena spolu v EUR bez DPH	Zfava v %	Termín dodania
00961	Liaty samoniv.poter hr.15mm	16.040	685.140	m2	10989.65		
Zfava :				Bez DPH:	10989.65		
				DPH:	2197.93		
				S DPH:	13187.58		
				Spolu EUR :	13187.58		

Platnosť cenovej ponuky: 30 dni

Vystavil: ST



Navos spol. s r.o., Velkoblahovska 47, 92901 Dunajska Streda

Tel./fax : 031/552-76-61,031/550-57-11 IČO: 30840961 IČDPH: SK2020366194 DIČ: 2020366194

4

Zapís. v OR okr.sudu Trnava, Sro vl.c.2655/T

pol. 112

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

IČDPH: SK2120487886

Kračanská cesta 690/23

DIČ: 2120487886

929 01 Dun.Streda

Tel.:

Slovensko

Fax:

CP č.: 220209

CENOVÁ PONUKA

Číslo dopytu: VELBIT AL

26.10.2022

Číslo	Názov	Cena/MJ v EUR bez DPH	Množstvo	MJ	Cena spolu v EUR bez DPH	Zľava v %	Termín dodania
21910	Velbit AL V S40 izol.proti radonu	4.450	800.000	m2	3560.00		
				Zľava :	Bez DPH:	3560.00	
					DPH:	712.00	
					S DPH:	4272.00	
					Spolu EUR :	4272.00	

Platnosť cenovej ponuky: 30 dni

Vystavil: ST



IZOLÁCIE SN

Cenová ponuka

Dodávateľ: SN izolácie, s.r.o.
Hlavná ulica 856/22,
930 25 Vrakúň
0904092403

Objednávateľ: Europrojekt
DS - PLUS s.r.o.
ZŠ Kalinkovo

Názo v	mn.	m. jed.	j. cena bez DPH	cena spolu bez DPH [€]
Strecha S1				
Fatrafol 818UV na zelenú strechu	870	m2	8,60 €	7 482,00 € pol. 110
Fatrafol 810 UV na atiku	150	m2	8,30 €	1 245,00 €
Viplanyl vnútorná rohová lišta	190	bm	2,00 €	380,00 €
Viplanyl vonkajšia rohová lišta	190	bm	2,00 €	380,00 €
Okapnica RS 200 antracit	135	bm	6,00 €	810,00 €
Spojky na okapnicu	80	ks	1,50 €	120,00 €
Bluetex + Controfoil	800	m2	2,00 €	1 600,00 €
Tatratex pp 300	300	m2	1,09 €	327,00 € pol. 113
Detailová fólia	5	m2	20,00 €	100,00 €
Chrič PVC	5	ks	90,00 €	450,00 €
Dosky OSB	30	ks	40,00 €	1 200,00 €
Kotviaci materiál na ukotvenie OSB dosiek	1	sada	170,00 €	170,00 €
Kotviaci materiál na ukotvenie rohových lišt	1	sada	200,00 €	200,00 €
Kotviaci materiál na ukotvenie oplechovania	1	sada	100,00 €	100,00 €
Montážna pena na lep. EPS	25	ks	8,00 €	200,00 €
Parozábrana Parostop	1000	m2	0,60 €	600,00 €
Pokládka tepelnej izolácie	725	m2	2,00 €	1 450,00 €
Pokládka spádového polystyrénu	1	x	725,00 €	725,00 €
Osadenie OSB dosiek	135	bm	3,00 €	405,00 €
XPS na atiku, montáž	1	x	240,00 €	240,00 €
Hydroizolácia, montáž	1	x	4 200,00 €	4 200,00 €

SN izolácie, s.r.o., Hlavná ulica 856/22, 930 25 Vrakúň
IČO: 53031661, DIČ: 2121225623, IČ DPH: SK2121225623

Oplechovanie Atiky	1	x	945,00 €	945 00 €
Presun hmôt	1	x	500,00 €	500 00 €
Iskrová skúška	1	x	150,00 €	150 00 €

Cena bez DPH spolu: **23 979 €**

Po dokončení práce - technická kontrola od fatrafolu - záruka na materiál 10 rokov.

Vo
Vrakúni
20.6.2022

Štefan Nagy

348/2022 XPS

Pri objednávke prosím uvádzať poradové číslo kladacieho plánu I



Cenová ponuka 348/2022 XPS Stavba:
 S1 302,08 m² Rovné dosky 3x120mm STYRODUR 3000CS, Spád. dosky SD 2800C od 20mm 1,6%
 SPOLU 302,08 m²

Spádové dosky	Spád	1,60%	ks	m ³	m ²	Materiál	cena €/m ³	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 2800 C								
Rozmer dosiek:			0,6 x 1,25					
Klin A	hr.:	20 - 40	181	4,07	135,75	Spád dosiek je vytvorený na 1,25m strane! Dosky sú vytvorené prečným prerezaním rovných dosiek (viď tabuľka nižšie). Z rovných dosky sa vytvorí 2ks identických klinov		
Klin B	hr.:	40 - 60	164	6,15	123,00			
Klin C	hr.:	60 - 80	133	6,98	99,75			

Rovné dosky na vytvorenie klinov

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALÍKY !!!

Doska	hr. v mm	0,6 x 1,25	Potrebná plocha:	m ²	Materiál	cena €/m ²	Cena SPOLU €	
Doska A	60	m ² v balíku		5,25	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%) 286,65	1 173,83 €	
		Počet balíkov	13	4,10				68,25
		0,6 x 1,25		Potrebná plocha:				61,50
m ² v balíku		3,00	63,00					
Doska B	100	0,6 x 1,25		Potrebná plocha:	49,88	STYRODUR 2800 C (vrátane 30% príplatku za rezanie)	(220,5 + 30%) 286,65	2 076,78 €
		m ² v balíku		2,25	51,76			
		Počet balíkov	23	7,25	51,76			
Spolu				17,84	Spolu bez DPH		5 056,51 €	

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALÍKY !!!

Rovné (doplnkové a podkladné)	ks	m ³	m ²	Materiál	cena €/m ²	Cena SPOLU €	
XPS STYRODUR 2800 C							
hr. v mm 60	0,615 x 1,285		Potrebná plocha:	155,77	XPS STYRODUR 2800 C	12,12	1 908,90 €
	m ² v balíku		5,25	157,50			
	Počet balíkov	30	9,45	157,50			
hr. v mm 120	0,615 x 1,285		Potrebná plocha:	82,24	XPS STYRODUR 2800 C	24,24	2 036,16 €
	m ² v balíku		3,00	84,00			
	Počet balíkov	28	10,08	84,00			
Spolu				19,53	Spolu bez DPH		3 945,06 €

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALÍKY !!!

Rovné dosky do plochy	ks	m ³	m ²	Materiál	cena €/m ²	Cena SPOLU €	
XPS STYRODUR 3000 CS							
hr. v mm 120	0,600 x 1,250		Potrebná plocha:	908,24	XPS STYRODUR 3000 CS	26,64	24 215,76 €
	m ² v balíku		3,00	909,00			
	Počet balíkov	303	109,08	909,00			
Spolu				109,08	Spolu bez DPH		24 215,76 €

SPOLU REÁLNA SPOTREBA	m ³	146,26	BEZ DPH	S DPH 20%
		KLINY	5 056,51 €	6 067,81 €
		ROVNÉ DOSKY	28 160,82 €	33 792,98 €
		CENA SPOLU	33 217,33 €	40 860,79 €

Poznámka: Cenová ponuka a kladací plán bol vypracovaný na základe doručených podkladov od objednávateľa. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za vzniknuté zmeny medzi projektovaným a skutočným stavom objektu, ktoré je potrebné zamerať na mieste /zabezpečiť pre objednávateľa realizátor stavby/. Objednávateľ je povinný skontrolovať správnosť a obsah ponuky, rozmery zadania a skutočného stavu na stavbe, čím preberá zodpovednosť za dodané množstvo materiálu a správnosť uloženia podľa navrhovaného kladacieho plánu. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za správnosť ponuky v prípade konštrukčnej a rozmerovej nejasnosti dodaných podkladov, nezhôd a reálnym stavom prípadne iných neovarených skutočností na stavbe a nie je povinný prijať späť materiál objednaný na základe podkladov, ktoré mu dodal objednávateľ a za ktorých správnosť zodpovedá.

piatok, august 12, 2022

Bc. Ákos Mészáros
 Sales Specialist
 +421 911 250 674

348/2022 XPS

Prí objednávke prosím uvádzať poradové číslo kladačského plánu!



Cenová ponuka
S2
SPOLU

348/2022 XPS Stavba:
414,13 m²
414,13 m²

Spád. dosky SD 2800C od 10-70mm 4,8%, Nábohové klíny od 10-100mm spád 5%
Spád. dosky SD 2800C od 10-70mm 4,8%

Spádové dosky	Spád	4,80%	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m3	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 2800 C								
Rozmer dosiek:	0,6 x 1,25							
Klín E	hr.:	10 - 70	32	0,96	24,00			

Spád dosiek je vytvorený na 1,25m strane!! Dosky sú vytvorené prečným prerezaním rovných dosiek (viď tabuľka nižšie). z rovných dosky sa vytvoria 2ks identických klínov

Rovné dosky na vytvorenie klínov

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALIKY III

Doska A	80	0,6 x 1,25	Potrebná plocha:	12,00	STYRODUR 2800 C	(220,5 + 30%)	286,65	343,98 €
hr. v mm		m2 v balíku		3,75	(vrátane 30% príplatku za rezanie)			
		Počet balíkov	4	1,20				
		Spolu		1,20				343,98 €

Spolu bez DPH

Spádové dosky	Spád	5,00%	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m3	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 2800 C								
Rozmer dosiek:	0,6 x 1,25							
Klín X1	hr.:	10 - 40	39	0,73	29,25			
Klín X2	hr.:	40 - 70	25	1,03	18,75			
Klín X3	hr.:	70 - 100	12	0,77	9,00			

Spád dosiek je vytvorený na 0,6m strane!! Dosky sú vytvorené prečným prerezaním rovných dosiek (viď tabuľka nižšie). z rovných dosky sa vytvoria 2ks identických klínov

Rovné dosky na vytvorenie klínov

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALIKY III

Doska X1	50	0,6 x 1,25	Potrebná plocha:	14,63	STYRODUR 2800 C	(220,5 + 30%)	286,65	257,99 €
hr. v mm		m2 v balíku		6,00	(vrátane 30% príplatku za rezanie)			
		Počet balíkov	3	0,90				
		Spolu		18,00				
Doska X2	120	0,6 x 1,25	Potrebná plocha:	9,38	STYRODUR 2800 C	(220,5 + 30%)	286,65	412,78 €
hr. v mm		m2 v balíku		3,00	(vrátane 30% príplatku za rezanie)			
		Počet balíkov	4	1,44				
		Spolu		12,00				
Doska X3	100	0,6 x 1,25	Potrebná plocha:	9,00	STYRODUR 2800 C	(220,5 + 30%)	286,65	257,98 €
hr. v mm		m2 v balíku		3,00	(vrátane 30% príplatku za rezanie)			
		Počet balíkov	3	0,90				
		Spolu		9,00				

Spolu bez DPH

UPOZORNENIE: DOSKY XPS SA DODÁVAJU IBA NA UCELENÉ BALIKY III

Rovné dosky do plochy	ks	m3	m2	Materiál	cena €/m2	Cena SPOLU €
XPS STYRODUR 3000 CS						
hr. v mm 100	0,600 x 1,250	Potrebná plocha:	414,13	XPS STYRODUR 3000 CS	22,20	9 257,40 €
	m2 v balíku		3,00			
	Počet balíkov	139	41,70			
hr. v mm 50	0,615 x 1,265	Potrebná plocha:	414,13	XPS STYRODUR 3000 CS	13,32	5 594,40 €
	m2 v balíku		6,00			
	Počet balíkov	70	21,00			
		Spolu	62,70			

Spolu bez DPH

SPOLU REÁLNA SPOTREBA	m3	67,14	BEZ DPH	S DPH 20%
KLINY			1 272,73 €	1 527,27 €
ROVNÉ DOSKY			14 851,80 €	17 822,16 €
			16 124,53 €	19 349,43 €

Poznámka: Cenová ponuka a kladačský plán bol vypracovaný na základe doručených podkladov od objednávateľa. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za vzniknuté zmeny medzi projektovaným a skutočným stavom objektu, ktoré je potrebné zamerať na mieste /zabezpečiť pre objednávateľa realizátor stavby/. Objávateľ je povinný skontrolovať správnosť a obsah ponuky, rozmery zadania a skutočného stavu na stavbe, čím preberá zodpovednosť za dodané množstvo materiálu a správnosť uloženia podľa navrhovaného kladačského plánu. Saint-Gobain Construction Products s.r.o. nezodpovedá za správnosť ponuky v prípade konštrukčnej a rozmerovej nejasnosti dodaných podkladov, nezohľadnených a reálnym stavom prípadne iných neočakávaných skutočností na stavbe a nie je povinný prijať späť materiál objednaný na základe podkladov, ktoré mu dodal objednávateľ a za ktorých správnosť zodpovedá.

pondelok, august 15, 2022

Bc. Akos Mészáros
Sales Specialist
+421 911 250 674

RE: Kalinkovo

Predmet: RE: Kalinkovo

Od: "Meszaros, Akos" <Akos.Meszaros@saint-gobain.com>

Dátum: 22. 6. 2022, 10:19

Pre: "info@europrojektsro.sk" <info@europrojektsro.sk>

Kópia: "Comova, Erika" <Erika.Comova@saint-gobain.com>, "Paulovic, Branislav" <Branislav.Paulovic@saint-gobain.com>

Dobrý deň,

Ďakujeme za Váš dopyt. Vašu žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky evidujeme cez stavebniny DEK DS, cenovú ponuku Vám vypracujeme a pošleme cez nich.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať

S pozdravom / Best regards / Üdvözlettel

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Bc. Akos Mészáros
Product manager


**Saint-Gobain Construction
Products, s.r.o.
Divízia Isover**

Stará Vajnorská 139 • Bratislava • Slovensko
Tel: +421 2 49212121 • Mobile: +421 911 250
674

E-mail: akos.meszaros@saint-gobain.com

www.isovert.sk


SAINT-GOBAIN

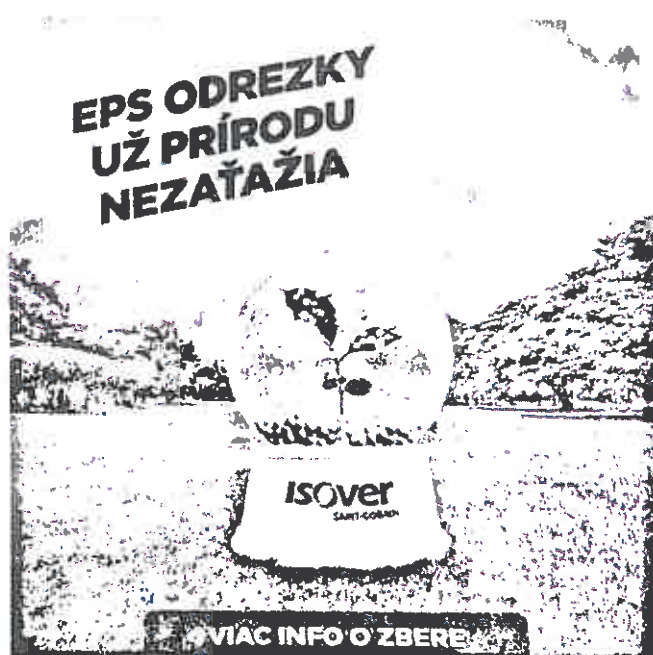

-----Original Message-----

From: Comova, Erika <Erika.Comova@saint-gobain.com>

Sent: Wednesday, June 22, 2022 8:57 AM

To: Nemcek, Jozef <Jozef.Nemcek@saint-gobain.com>; Meszaros, Akos <Akos.Meszaros@saint-gobain.com>

Subject: FW: Kalinkovo

-----Original Message-----

From: EUROPROJEKTD S-PLUS s.r.o., Verébová <Info@europrojektsro.sk>

Sent: Tuesday, June 21, 2022 3:45 PM

To: objednávky, zapad <objednavkyzapad@isovert.sk>

Subject: Kalinkovo

Dobrý deň,
podľa v prílohe uvedenej výkresy poprosíme naceniť na strechu izolácie spád.polys.-t a styrodur...
kont.na stavbyved.: p. Lelkes, tel.č.:0907373300....

S pozdravom
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

—
Táto správa bola skontrolovaná na prítomnosť vírusov programom Avast Antivirus.
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A_www.avast.com_antivirus&d=DwlDaQ&c=tkg6qBpVKaymQv9tTEpyCv5e23C4oKrSdZwjE7Q68Ts&r=DE2Y3cWHmmNz_Bt9RheIkMwq8abFFqK6ym7ef4yZwRY&m=b3DTgCEO0lhTe4N_avKThv_espMjchVsbulpazkLdHpvsTqdWD1yk6VLJCJag2Ph&s=l1BE_bgkRmAiDYdZORBGCJzbt7Q1G6lj_cEMX0alyis&e=

7

17.08.2022

Styrodur XPS 2800C hr.100mm (alternatíva za hrúbku 200mm)300m² x
14,08€/m² bez DPH

min.vata 3cm - 120m² x 4,45€/m² bez DPH

min.vata 10cm-380m² x 12,1€/m² bez DPH

20. 157

min.vata 20cm-500m² x 24,2€/m² bez DPH

min.vata 30cm-60m² x 36,3€/m² bez DPH

Platobná podmienka:predfaktúra

S pozdravom

Bc. Erich Malán

konateľ

Mob.: +421 905 601 057

www.comdet.sk

Comdet s.r.o.

Strojárska 8800/1B

917 00 Trnava

IČO:36280402

IČ DPH: SK 2022134125

Dobrý deň,

prosím o záverečné odsúhlasenie objednávky. Nakoľko sa menili položky a vymazávali sa niektoré veci a nerád by som aby sa niečo zle objednalo.

pol. 136, 137	Styrodur XPS 3000CS hr.100mm.....	300m ² x 14,08€/m ² =4224€	bez DPH
pol. 146	ISOVER EPS floor hr.40mm.....	120m ² x 4,45€/m ² =534€	bez DPH
pol. 149	minerálna doska hr.100mm.....	380m ² x 12,1€/m ² =4.598€	bez DPH
pol. 147	minerálna doska hr.200mm.....	500m ² x 24,2€/m ² =12.100€	bez DPH
	minerálna lamela hr.300mm.....	60m ² x 36,3€/m ² =2.178€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin A 20-40mm.....	135,75m ² x 8,57€/m ² = 1.163,37€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin B 40-60mm.....	123,00m ² x 14,3€/m ² = 1.758,90€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin C 60-80mm.....	99,75m ² x 20,01€/m ² = 1.995,99€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS rovná doska A hr.60mm.....	157,5m ² x 8,58€/m ² = 1.351,35€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS rovná doska A hr.120mm.....	84,00m ² x 17,16€/m ² =1.441,44€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin X1 10-40mm.....	29,25m ² x 7,14€/m ² =208,85€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin X2 40-70mm.....	18,75m ² x 15,71€/m ² =294,56€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS klin X3 70-100mm.....	9,0m ² x 24,47€/m ² =220,23€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS hr.100mm.....	40m ² x 14,08€/m ² =563,20€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS hr.100mm.....	200m ² x 14,08€/m ² =2.816€	bez DPH
	Styrodur XPS 3000CS hr.120mm.....	909m ² x 17,16€/m ² =15.598,44€	bez DPH

s pozdravom Erich Malán 0905/601057
Comdet s.r.o.
8.09.2022



Odberateľ : Europrojekt-Kalinkovo

Kontakt:

Dátum: 31.8.2022

CENOVÁ PONUKA

Číslo CP: 0791 - 2022

Druh reziva:	
Natúr	R
Plocha strechy:	m ²
Sklon strechy:	

Stavebné rezivo:

Názov položky	šírka v cm	výška v cm	dĺžka v m	ks	Objem v m ³	Cena za m ³	Cena za položku
	15	15	7	4	0,630	430	270,90
	15	15	5	2	0,225	430	96,75
	8	20	6	23	2,208	430	949,44
	8	20	8	7	0,896	430	385,28
	15	20	3	2	0,180	430	77,40
	15	20	6	4	0,720	430	309,60
	6	15	7	8	0,504	430	216,72
	6	12	4	2	0,058	430	24,77
	6	20	4	2	0,096	430	41,28
	6	20	2	6	0,144	430	61,92
					Celkom v m³:	5,661	
						Celkom v EUR:	2 434,06

Cena po zľave: 2 434,00 EUR

Iné stavebné rezivo:

Názov položky	šírka v cm	výška v mm	dĺžka v m	ks	Plocha v m ²	Cena za m ²	Cena za položku
tatranský profil	15	20	4	29	17,40	20,00	348,00
						Cena po zľave:	348,00 EUR

Názov položky	šírka v m	hrúbka v mm	dĺžka v m	ks	Plocha v m ²	Cena za kus	Cena za položku
OSB doska	1,25	22	2,5	39	121,88	56,00	2 184,00
						Cena po zľave:	2 184,00 EUR

Výpis položiek v cenovej ponuke sa doporučuje konzultovať a realizovať firmou. Úspešnosť výpočtov závisí od presnosti dodaných podkladov. Pri akejkoľvek odchýlke od stavebnej dokumentácie je nutné upraviť výpočet podľa nových údajov!

Cena obsahuje prepravu a vykládku hydraulickou rukou. Cenová ponuka platí 2 týždne.

Vypracoval: Brezovský Ladislav
Kontakt: Pužsár Peter
0915 750 981

Preprava: S DPH km

Spolu po zľave: 4966,0 EUR

DEK

ponuka
NAB-620-22-00868

dodávateľ

Stavebniny DEK s.r.o.
Pobočka Dunajská Streda
Kračanská cesta 1239/42
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

dátum vystavenia:
9.9.2022
platí do:
15.9.2022

IČO: 43821103
IČ DPH: SK2022484849

DIČ: 2022484849

so sídlom:
Kamenná ul. 6, 01001 Žilina

odberateľ

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
92901 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487886
DIČ: 2120487886

so sídlom:
Kračanská cesta 690/23, 92901 Dunajská Streda

č. pol.	popis a poznámka	množstvo MJ	cena MJ cenník bez DPH	zľava	cena MJ po zľave bez DPH	cena MJ po zľave s DPH	cena spolu bez DPH
3025101030	CETRIS BASIC 18mm 3350x1250mm (25ks/paleta) Skladom DEK DS <i>pol. 1G6</i> 33,5m ²	8,00000 ks	106,36	23,00 %	81,90	98,28	655,18
3025101045	* CETRIS BASIC 22mm 3350x1250mm (20ks/paleta) skladom v Stúpave <i>pol. 1G7</i> 8,375m ²	2,00000 ks	131,32	23,00 %	101,12	121,34	202,23
3010510002	SKLADOM DEK DS		89,80	19,00 %	73,63	88,70	188,80

upozornenie pre zákazníka:

- Tovar označený:
 - Je atypický tovar, ktorý sa bežne nedrží skladom a bude sa objednávať výlučne pre Vašu zákazku. Vrátenie tohto tovaru nie je možné. Kúpujúci je povinný si tento tovar po jeho naskladnení na výzvu predávajúceho prevziať. V prípade, že si kúpujúci tovar v stanovenom termíne neprevzme, považuje sa tovar, po uplynutí lehoty na jeho prevzatie, za dodaný a predávajúci je oprávnený vystaviť k tomuto tovaru daňový doklad a požadovať úhradu jeho kúpnej ceny.
- Ak nie je u jednotlivých položiek uvedené inak, jedná sa o tovar alebo služby obvyklé kvality.
- Množstevné údaje v tejto cenovej ponuke sú len orientačné. Za vzniknuté rozdiely medzi množstvom uvedeným v tejto ponuke a skutočnou spotrebou na konkrétnej stavbe nezodpovedáme.
- V prípade, že požadujete zabezpečenie dopravy tovaru, vyžiadajte si, prosím, cenovú kalkuláciu dopravy.

poznámka:

Cenová ponuka neobsahuje dopravný poplatok

Máme skladom DEK DS: cetris 18mm a OSB 12 mm
Cetris 22 mm drží skladom Stúpava

cena bez DPH	1 267,30 EUR
základ DPH 20 %	1 267,30 EUR
DPH 20 %	253,47 EUR
zaokrúhlenie	0,00 EUR
spolu	1 520,77 EUR
k úhrade	1 520,77 EUR

tožime
sa na
spoluprácu

informácia k zakázke:
kontaktná osoba:
telefón:
e-mail:
akcia:
objednávka:

vystavil: Konkoly Attila, Mgr.
telefón: +421902950389
e-mail: attila.konkoly@dek-sk.com

Zapísaný v OR, vtedzora Okresným súdom v Žilne,
oddel: Sro, vložka 82313/L



PROKOM SR, s.r.o., Galvaniho 2/a, Bratislava 821 04

Tel: +421911554666 / +421243414021, E-mail: prokom@prokom-sr.sk, Web: www.prokom-sr.sk

Oficiálny dodávateľ materiálu ThermoWood® od finskeho výrobcu Lunawood pre Slovenskú republiku

pol-100

Love for the Forest

Zákazník: EUROPROJEKTOS-BLUS s.r.o. Mgr. Máhešová Katarína 907 727 177

Platnosť: I.S. 15.8.2022

Cenová ponuka dodávky drevených profilov ThermoWood

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám predložiť cenovú ponuku na dodávku materiálu.

Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Iisalmi, Fínsko.

Materiál: Fínska borovica, tepelne upravená pri teplote 212°C (Thermo-D - stabilita - exteriér).

Životnosť: Minimálne 30 rokov vo vonkajšom prostredí (dokladáme certifikátom BRE).



Oy Lunawood Ltd je členom TWA - Medzinárodná asociácia výrobcov ThermoWood®
www.thermowood.fi

Všetky ceny v tabuľke sú uvedené bez DPH.

ThermoWood® profily			Σ bm	€/bm	Po zľave	Celková cenníková cena	Celková cena so zľavou
Názov:	Terazový profil Luna Deck 2 26x137 mm s UCHYTOM		Σ m²	€/m²	22%		
Dĺžka:	Dostupné skladové dĺžky						
Počet ks:	3m / 3,6m / 4,2m / 4,8m						
	Počet bm profilu/m²	8,2 bm	29,80	57,40 €	44,77 €	1 659,00 €	1 294,02 €
	Celkový počet čistých m²:						
Názov:	Samočistiaci lak SPP Aquadeck		Σ bm	€/bm	Po zľave:	Celková cenníková cena	Celková cena po zľave
Dĺžka:	3,00	4,20			22%		
Počet ks:	0	18	25,0	8,00 €	6,24 €	604,80 €	471,78 €
Kotviace príslušenstvo			Σ ks	€/ks	Po zľave:	Celková cenníková cena	Celková cena po zľave
Názov:	NIP 180 C/47 x 80 (základová sada) - SADA (80 ks)				22%		
Sada:	80 ks KLIP LIGO C/47 + 80 ks nerez. skrutka 4,8x47 mm						
Počet bal.:	7		560	0,500 €	0,390 €	280,00 €	208,80 €
Ošetrojúce prostriedky OWATROL			Σ litrov	Celkom v €	Po zľave:	Celková cenníková cena	Celková cena po zľave
Názov:	Konzervačné prostriedok OWATROL PEO 81				22%		
Balenie:	300 ml / 12,50 €	1 l / 25,00 €					
Počet bal.:	0	1	1	25,00 €		25,00 €	19,75 €
Názov:	Náter OWATROL AQUATHERAS (Honey / Teak / Grey)		Σ litrov	Celkom v €	Po zľave:	Celková cenníková cena	Celková cena po zľave
Balenie:	1 l / 29,20 €	5 l / 112,50 €			22%		
Počet bal.:	1	1	6	141,70 €		141,70 €	109,39 €
Poplatok za dopravu tovaru							
Služba:	Doprava PROKOM SR / EMONS Kľučová / DPD					0,00 €	
Sumarizácia cenovej ponuky:			Zľava z cenníkovej ceny bez DPH:	596,31 €	Vaša nákupná cena:		
			Celková cenníková cena bez DPH:	2 710,50 €	Celková cena bez DPH:	2 114,19 €	
			Celková cenníková cena vrátane DPH 20 %:	3 252,60 €	Celková cena s DPH 20%:	2 537,83 €	

Dodacia lehota:

Doprava k objednávateľovi:

Platobné podmienky:

Orientačne 3 - 10 pracovných dní.



ZDARMA na miesto určenia v rámci celej SRI

Zálohová faktúra / v hotovosti pri dodaní *





* výber dobierky je spoplatnený sumou 2,00 € bez DPH / 2,40 € s DPH

11 pol-100

Zoznam profilov ThermoWood®

Názov	Obrázok
Terasová doska	 <p>LunaDeck 2 26x117 s bočným úchytom</p>
Konštrukčný hráňol	 <p>SHP 42x68</p>

Zoznam príslušenstva

Názov	Popis	Obrázok
OWATROL AQUATHEM	<p>Je penetračný náter na vodnej báze s UV ochranou. Poskytuje matný a dlhotrvajúci vzhľad s rýchlou metódou aplikácie pre všetky typy drevin. Vďaka obsahu UV filtra chráni drevo pred poškodením vplyvom poveternostných podmienok. Dostupný v troch farebných odtieňoch</p>  <p>Balenie - 1L / 5L.</p>	
OWATROL PCD 91	<p>Je konzervačný prostriedok na vodnej báze, ktorý slúži na konzerváciu otvorených rezných plôch (čiel). Rezná plocha je miesto, kde do dreva ThermoWood® preniká najviac nežiadúcej vlhkosti. Aplikáciou na otvorené rezy udrží PCD 91 drevo celistvé a zakonzervované proti prieniku vlhkosti.</p> <p>Balenie - 300 ml / 1L.</p>	
WATERPROOFING SYSTEM LISO 42	<p>Je kotviaci prvok pre terasové profily s označením "s bočným úchytom". Sada obsahuje - 80 ks spodná platnička s krídlami, 80 ks horná prítláčná platnička, 80 ks nerez. skrutka z čiernej temperovanej ocele 4,8 x 47 mm (vhodné aj pre rošt hrúbky 26 mm). Vďaka spodnej platničke výrazne zlepšuje ventiláciu kontaktnej plochy dosky s hranolom. Balenie - 80 ks (sada).</p>	

Dodávateľ

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Diakovce



IČO 36360376
DIČ 2022190896
IČ DPH SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Ponuka č.: 22NA00263
Dátum zápisu: 07.09.2022
Platné do: 23.09.2022

IČO 50781570
DIČ 2120487886
IČ DPH SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel.:

KONŠTRUKČNÁ PONUKA

Dodávka a montáž ocelevej konštrukcie na akciu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - Zábradlie medzi hlavným schodišfom	1 subor	950,00	950,00

SPOLU ZA AKCIU

950,00

pol. 111

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním **cenovú ponuku aktualizovať a overiť** dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil: **Nikoleta Latičová**
laticova@proimpex.sk

13

Predmet: CP Marmoleum_220906_Kalinkovo
Od: <filip@delphy.sk>
Dátum: 5. 11. 2022, 22:41
Pre: <info@europrojektsro-vo.sk>

Dobrý deň,

V tabuľke nižšie posielam cenovú ponuku na podlahu z Marmolea podľa zadania a všeobecné podmienky z našej strany. Aktualizoval som položky, tam, kde je suma 0,00 sa bude riešiť podľa reality. Riešená plocha je cca 1160m², bohužiaľ výpočtové tabuľky neradi poskytujeme, posielam našu štandardnú cenovú ponuku.

K Vaším dotazom: Dodacie podmienky v prípade skladových zásob u výrobcu sú 2 týždne od objednania (objednávky uzatvárame vždy v pondelok). V prípade, že by neboli dostatočné skladové zásoby by sme Vás informovali a riešili by sme s Vami možnosti, ako a kedy by sme materiál vedeli zabezpečiť. Showroom, v ktorom by sme vedeli s investorom prejsť všetky vzorky máme v Bratislave na Radlinského 27, vieme sa dohodnúť na konkrétnom termíne stretnutia.

Prosím, prezrite si ponuku, v prípade otázok ma kontaktujte.

názov	spolu bez DPH v €
Marmoleum 2,5mm real/vivace xxxx 1160m ²	35450,00
Zvarovacia šnúra xxxx	682,00
Poplatok za rez	26,00
Disperzné lepidlo Marmoleum	2637,55
Silikón NCS	820,00
Marmoleum - lepenie, frézovanie, zváranie	9254,56
Sokľovanie z materiálu	1530,00
Samonivolačná sieťka do 4mm	10989,79
Vybrúsenie poteru diamantom	2313,64
Dodávka a montáž obvodových dilatácií (1,70€/bm)	0,00
Zošľvanie prasklín a dilatácií (16,50€/bm)	0,00
Odvoz a likvidácia odpadu	250,00
Režijné náklady	600,00
Spolu v € bez DPH	64553,54
DPH 20%	12910,71
Spolu v € s DPH	77464,25

I.) POŽIADAVKY PRED POLOŽENÍM PODLAHY:

- Cementový podklad musí byť:
 - rovný, hladký, povolená odchýlka max. 2 mm na 2 m ,
 - suchý, dovoľená zostatková vlhkosť max. 2,0 %, podľa merania CM metódou, v prípade podlahového kúrenia 1,6 %,
 - v prípade anhydridového/ kalcium sulfátového poteru dovoľená zostatková vlhkosť max. 0,5 %, podľa merania CM metódou, v prípade podlahového kúrenia 0,3 %,
 - pevný v tlaku a v ťahu,
 - čistý - bez prachu a mastných škvŕn,
 - izolovaný proti zemnej vlhkosti,
- Teplota pri inštalácii neamie byť nižšia ako 18°C a vyššia ako 25°C. Optimálna teplota je 20°C.

II.) TERMÍN DODANIA:

- 2 týždne, ak je materiál vyrobený a naskladnený u výrobcu.

III) PLATOBNÉ PODMIENKY:

- Fakturovať sa budú skutočne spotrebované množstvá
- Splatnosť faktúry 7 dní po ukončení a odovzdaní diela

IV.) ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

- Záruka na materiál podľa podmienok výrobcu
- Záruka na prácu 24 mesiacov
- Platnosť ponuky je 14 dní od jej zaslania

S pozdravom

S pozdravom

Ing. arch. Filip Hlísta
DELPHY, s.r.o.
tel.: +421 903 794 080
mail: filip@delphy.sk

delphy
FLOORING SYSTEMS

VELUX17
pol 23

Odberateľ: 12160968
 IČ DPH / DIČ:
 IČO:
 VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
 x

Korešpondenčná adresa: 12160968
 VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
 x

Dodacie miesto: 12160968
 VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
 x

Objednávajúci: 12160968
 VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
 x

Naša značka
 LCE.V-SK

Zákazník číslo
 12160968

Vaša referencia

Číslo objednávky
 4449515

Dátum cenovej ponuky
 07.04.2022

Platné do
 09.05.2022

Produktová špecifikácia: 24257064

Z dôvodu vysokého dopytu, ktorý ovplyvňuje dostupnosť niektorých produktov, môže dochádzať k predĺženiu dodacích lehôt. Aktuálne platný dodací termín Vám bude potvrdený po objednaní.

Dodacie podmienky
 DAP Dodacia adresa

Položka	Množstvo	Materiál	v prac.dňoch	Cena za jednotku bez DPH	Zľava v %	Hodnota v EUR
		Jednotka				
10	4 ks	CFP 100100 0073QV Neotvárací svetlík	2 Dni	477,50		1.910,00
20	4 ks	ISD 100100 0010A POLYKARBONÁTOVÁ KUPOLA ČIRÁ	9 Dní	330,83		1.323,32
CENA NETTO						3.233,32
DPH					20,00 % z 3.233,32	646,66
Celkom s DPH						3.879,98
Celková hmotnosť		Čistá hmotnosť	Položky celkom		Celkový objem	
208,340 kg		190,800 kg	8		2,744 M3	

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.

Galvaniho 17/A
 821 04 Bratislava 2
 IČO 31348611
 IČ DPH / DIČ SK2020291460
 Registrácia v OR Okr. Súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka c. 4901/B

Telefón 02/33 000 551
 Fax 02/33 000 556
 Internet www.velux.sk

e-mail objednaj@velux.com

Banka BNP Paribas Fortis SA/NV

IBAN CZ2863000644506101220018

SWIFT GEBACZPPXXX

Konšt. symb.: 008

Dodávateľ:

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Dlakovce



IČO: 36380376
DIČ: 2022190896
IČ DPH: SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Odberateľ:

IČO
DIČ
IČ DPH:

50781570
2120487886
SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel.:

Ponuka č.: 22NA00265
Dátum zápisu: 28.06.2022
Platné do: 12.07.2022

Konečný príjemca:

Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na akciu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - nosná konštrukcia pod svedlík	1 súbor	745,00	745,00

SPOLU ZA AKCIU **745,00**

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním cenovú ponuku aktualizovať a preveriť dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikolaeta Latičová
laticova@proimpex.sk

15
p.d.
26

16

Dodávateľ:

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Diakovce



IČO: 36360376
DIČ: 2022190896
IČ DPH: SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

Odberateľ:

IČO: 50781570
DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel.:

Ponuka č.: 22NA00266
Dátum zápisu: 12.09.2022
Platné do: 26.09.2022

Konečný príjemca:

Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie na akciu: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kallnkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - požiarly rebrík	1 súbor	475,00	475,00

SPOLU ZA AKCIU**475,00**

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním cenovú ponuku aktualizovať a preveriť dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dlelenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného odpadu.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikoleta Latičová
laticova@proimpex.sk



Zaluman s.r.o.

Ulice: Kračanská cesta 40
PSC, město: Dunajská Streda
Telefon: +421917283358
Fax:
E-mail: suke@zaluman.sk

NABÍDKA č.: ZS Kalinkovo

Klient:

Ulice:
PSC, město:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Obsahuje: konstrukce, sklo, montáž, lakování

Popis:

Hliníkové konstrukce v systémech: **ALUPROF S.A. (MB-86 ST)**
Počet pozicí: **2**. Počet konstrukcí: **2**
Celková plocha: **36,2 m²**.
Celkový obvod: **35,1 m**.
Barva profilů: **X) RAL 8R7016 - standardní**.
Barva kování: **8R7016 [antracit]; 7R9005 [černá]**
Skla: **4-16TGI-4-16TGI-4 44mm; 1,5 AL-41-1,5AL; 3.3.1VSG-16TGI-6-16ESG-6 50 mm; 3.3.1VSG-16TGI-4-16TGI-4ESG 46mm**

Položka: 1	Počet x 1	Systém: MB-86 ST	Barva profilů: X) RAL 8R7016 - standardní Barva kování: 8R7016 [antracit]; 7R9005 [černá]
			<p>Konstrukce: Poz. 1 1MB-86 ST5 2273 310X) RAL 8R7016 - standardní; 8R7016 [antracit]; 4-16TGI-4-16TGI-4 44mm; 1,5 AL-41-1,5AL; 3.3.1VSG-16TGI-6-16ESG-6 50 mm; 17,074</p>
			<p>Barva profilů: X) RAL 8R7016 - standardní Barva kování: 8R7016 [antracit] Výplně: 4-16TGI-4-16TGI-4 44mm; 1,5 AL-41-1,5AL; 3.3.1VSG-16TGI-6-16ESG-6 50 mm</p>
			<p>Cena bez DPH: Celkem: 6 017,03 Cena: 6 017,03</p>

Poznámky:

Cenová ponuka obsahuje:

Dodávku, dopravu a montáž AL výrobkov
Profily olepené ochrannou páskou.
Zameranie a vytýčenie pre náš rozsah prác.
Poplatok za zariadenia staveniska pre Zaluman.

Cenová ponuka neobsahuje:

Nezohľadňuje požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov Zákon č.555/2005 Zb. CP bola kalkulovaná na základe výpisu prvkov.

Bezpečnostné zasklenie čírym sklom - fasády.

Bezpečnostné zasklenie (P4A) - okenné konštrukcie.

Tieniace žalúzie a tieniacu techniku.

Sieťky proti hmyzu.

Reklamné polepí.

Parapety.

Okenné magnetické kontakty.

Ochrana namontovaných výrobkov pred poškodením stavbou.

Kontaktný zatepľovací systém.

Sadrokartónové dosky RIGIPS HABITO a napojenie na nosný oceľový profil.

Nosné a pomocné oceľové konštrukcie, oceľové výmeny.

Oplechovanie + pomocné plechové profily.

Prípadné použitie žeriavu pre potrebu zásobovania.

Teplotné technické a akustické výpočty autorizovanou osobou.

Upozornenie:

Pri tepelne neupravovaných sklách sa môže vyskytnúť jav zvaný „Termálny šok skloviny“, teda že sklo lokálnym prehriatím a nedostatočným odvetraním skloviny, praskne.

Preto je potrebné neumiestňovať priamo na sklo akýkoľvek materiál (papier plagáty, vývesky a pod.), prípadne v blízkosti skla neumiestňovať akékoľvek predmety a zdroje tepla.

Termín dodávky:

Naša spoločnosť je pripravená nastúpiť na plnenie predmetu diela 4 až 6 týždňov od podpísania Zmluvy o dielo a odsúhlasenia realizačného projektu predmetu dodávky.

Termín ukončenia prác a celkový priebeh budú upresnené v Časovom harmonograme dodávok, ktorý bude zosúladený s Harmonogramom výstavby celej stavby.

Platobné podmienky:

Platobné podmienky – Pred zadaniem zákazky do výroby požadujeme zálohovú platbu vo výške minimálne 50% z celkovej sumy, predpoklad mesačnej fakturácie, splatnosť 30 dní, prípadne iná dohoda.

Platnosť cenovej ponuky je 30 dní. Cena je platná za ponúkaný objem ako celok

Záruky:

Zhotoviteľ poskytuje záruku v dĺžke 60 mesiacov na okná, dvere, okenné výplne, dverné výplne a montážne práce. Na ostatné časti diela a výkony najmä, murárske práce, kovanie, rolety, kľučky, parapety, žalúzie a pod. poskytuje dodávateľ záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záruka na funkčnosť okien a kovanie je 36 mesiacov pri správnom zaobchádzaní a v prípade, že montáž vykonala autorizovaná montážna firma a na výrobkoch je prevádzaný pravidelný servis a údržba. Viditeľné, zreteľné vady (prasknuté sklo, nefungujúce krídlo, poškodené profily, kovanie a pod.) ste povinný reklamovať okamžite pri podpísaní dodacieho listu resp. montážneho listu. Špeciálna záruka na farbastosť hliníkových profilov je 5 rokov.


Vypracoval: *Norbert Sůke*

Zaluman s.r.o.
Križna 1273/2
929 01 Dunajská Streda
mobil: 00421 (0)917 283 358
e-mail: suke@zaluman.sk
web: www.zaluman.sk

MBK okno s r.o.
 Kračanská cesta 5145/40A
 92901 Dunajská Streda
 mobil: 0918 652 191 Sošová
 0907 892 932 Tataiova
 email: mbkokno2@mbkokno.sk

20-07-2022

18



Europrojekt Kalinkovo ZŠ 1

CENOVÁ PONUKA

Ponuka č.: 220805

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za Váš záujem. Na základe Vášho dopytu Vám zasielame cenovú ponuku na výplne stavebných otvorov z Nemeckého profilového systému Kömmerling 76 vyrobené v Berlíne. stavebná hĺbka je 76mm.

*Popis použitého materiálu pri štandardnom vyhotovení.

-Celoobvodové „srieborné“ bezpečnostné okenné kovanie SIEGENIA TITAN AF SAFETY „na dvere sa používa MACO a KfV

-Zasklenie - výrobky sú zasklené s izolačnými trojsklami 4mm-12-4mm-12-4mm LOW E+Argon

-podľa požiadavky -sklá tepelnoizolačné, zvukovoizolačné, sklá s protisúšnečnou ochranou, bezpečnostné sklá, VSG

Doplnky - parapetné dosky, klúčky, predokenné/nadokenné rolety, žalúzie vertikálne/horizontálne, siečky proti hmyzu a garážové brány HORMANN


- Dodacie lehoty 3-5 týždňov /po zaplacení zálohy /
- Platobné podmienky.....70% platba vopred - 30% po prevzatí otvorov
- Záruka na výrobok 60 mesiacov
- Súčiniteľ prechodu tepla okna U=0,79- 1,23 W/m2K
- Súčiniteľ prechodu tepla skla U= 0,6 Wm2K
- Sklo.....4-12-4 12-4 LOW E +Argon U=0,6
- Sklo nad 2,5 m2.....6-14-6-14 6 LOW E +Argon U=0,6

Občianstvo vol. výška vonkajších výplní otvorov

(A3) - Pol 1+2+3+4+5+6

Poz: 1	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2000	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2000x2050)




Element	:		
Farba profilov	:	Antrazit	
Rám	:	372.07	☐ ☐ ☐ ☐
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm	
Krídlo	:	2= 395.67	☐ ☐ ☐ ☐
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	
Príd. prof.	:	Bas: 145R	☐
Príd. prof.	:	Drpíte: 352 hr.spojka	☐
Poznámka :	:	A3	

Celkom : 864.24 € x 1 = 864.24 €

Poz: 2	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1920	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1920x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 372.07
Zasklenie : 1= ESG-Float-VSG-44mm
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : A3



Celkom : 926.32 € x 1 = 926.32 €

Poz: 3	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2025	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2025x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 395.67
Kovanie : 1= OS pravé Okenna klucka HOPPE
Príd. prof. : Droite: 355 roh.spojka
Poznámka : A3




Celkom : 1 053.00 € x 1 = 1 053.00 €

Poz: 4	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2045	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2045x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 2= 395.67
Kovanie : 2= OS favé Okenna klucka HOPPE
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : A3




Celkom : 1 007.92 € x 1 = 1 007.92 €

Poz: 5	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2000	Výška: 2050
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2000x2050)



Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
Príd. prof. : Bas: 145R
Príd. prof. : Bas: 363/120/
Príd. prof. : Bas: 362 (60mm)
Príd. prof. : Bas: 360_15mm
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Poznámka : A3



Celkom : 894.15 € x 1 = 894.15 €

Poz: 6	Ref:	Počet: 1	Šírka: 980	Výška: 2050
--------	------	----------	------------	-------------

1:100 Type: ***** (980x2050)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 372.07 / 7788
Zasklenie : 1= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 379.67
Kovanie : 1= Vchod.dv.P Dverová kľučka JOWIS92 K+K
Poznámka : brano
: A3

Celkom : 712.39 € x 1 = 712.39 €

Poz: 7	Ref:	Počet: 2	Šírka: 1930	Výška: 2480
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1930x2480)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1-3= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 2= 395.67
Kovanie : 2= OS Favé Okenna kľučka HOPPE
Kridlo : 3= 395.67
Kovanie : 3= OS pravé Okenna kľučka HOPPE
Príd. prof. : Bas: 145R
Príd. prof. : Haut: 352 hr.spojka
Poznámka : A6

Celkom : 1 068.36 € x 2 = 2 136.72 €

Poz: 8	Ref:	Počet: 2	Šírka: 1930	Výška: 680
--------	------	----------	-------------	------------

1:50 Type: ***** (1930x680)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1= 44mm THX=0,58
Poznámka : A6

Celkom : 174.51 € x 2 = 349.02 €

Poz: 9	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2200
--------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2200)




Element :
Farba profilov : Antrazit
Rám : 390.06
Zasklenie : 1-3= ESG-Float-VSG-44mm
Kridlo : 1= 395.67
Kovanie : 1= Sklopné do v910 Okenna kľučka HOPPE
Kridlo : 3= 395.67
Kovanie : 3= OS Favé Okenna kľučka HOPPE
Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
Príd. prof. : Haut: 360_15mm
Príd. prof. : Bas: 360 (30mm)
Poznámka : B1

Celkom : 967.67 € x 3 = 2 903.01 €

(M) 1 WP Pol. S + 10 + 11 + 12 + sieťka + vnúť pav + voni pav. stb M

Poz: 10	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (1805x2200)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm		
Krídlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		
Príd. prof.	:	Bas: 145R		
Príd. prof.	:	Droite: 144 (JPP)		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm_		
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/		
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)		□ □ □ □
Poznámka :	:	B1		
Celkom	:	923.69 €	x 3 =	2 771.07 €

Poz: 11	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (1805x2200)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm		
Krídlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		
Príd. prof.	:	Bas: 145R		
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm_		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		
Príd. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka		□ □ □ □
Poznámka :	:	B1		
Celkom	:	877.65 €	x 3 =	2 632.95 €

Poz: 12	Ref:	Počet: 3	Šírka: 1805	Výška: 2250
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2250)




Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1-3= ESG-Float-VSG-44mm		
Krídlo	:	2= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		
Krídlo	:	3= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	3= OS pravé Okenna klucka HOPPE		
Príd. prof.	:	Bas: 145R		
Príd. prof.	:	Haut: 360_15mm_		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		
Poznámka :	:	B1		
Celkom	:	927.40 €	x 3 =	2 782.20 €

32) Počet 13+14+15+16 = 52 kusov + 1 kus 1200 + 1 kus 1200 + 1 kus 1200

Poz: 13	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (1805x2200)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1-3= ESG-Float-VSG-44mm		
Krídlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Krídlo	:	3= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	3= OS Tové Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka		
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm		□ □
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		□ □
Poznámka	:	B2		□ □
Celkom	:	967.67 €	x 1 =	967.67 €

Poz: 14	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (1805x2200)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm		
Krídlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Bas: 145R		□ □
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm		□ □
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		□ □
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/		□ □
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)		□ □
Poznámka	:	B2		□ □
Celkom	:	900.73 €	x 1 =	900.73 €

Poz: 15	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1875	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (1875x2200)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm		
Krídlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Bas: 145R		□ □
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm		□ □
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		□ □
Príd. prof.	:	Droite: 363/120/		□ □
Príd. prof.	:	Droite: 360 (30mm)		□ □
Príd. prof.	:	Droite: 355 roh.spojka		□ □
Poznámka	:	B2		□ □
Celkom	:	1 043.56 €	x 1 =	1 043.56 €

Poz: 16	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1810	Výška: 2250
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (1810x2250)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1-3= ESG-Float-VSG-44mm		
Kridlo	:	2= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Kridlo	:	3= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	3= OS pravé Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R		□
Prid. prof.	:	Haut: 360_15mm		
Prid. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		□ □
Poznámka :	:	B2		□ □
Celkom	:	929.17 €	x 1 =	929.17 €

Poz: 17	Ref:	Počet: 2	Šírka: 600	Výška: 1250
---------	------	----------	------------	-------------

1:50 Type: ***** (600x1250)



Element	:	20 Pol. 17 + silika + vlna por. 20 M		
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1= 44mm THX=0,56		
Kridlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= OS pravé Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R		□
Poznámka :	:	B3		
Celkom	:	182.81 €	x 2 =	365.62 €

Poz: 18	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1970	Výška: 600
---------	------	----------	-------------	------------


1:50 Type: ***** (1970x600)



Element	:	25 Pol. 18 + silika + vlna por. 20 M		
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1= 44mm+VSG		
Kridlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R		□
Poznámka :	:	B4		
Celkom	:	288.35 €	x 1 =	288.35 €

Poz: 19	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1645	Výška: 1250
---------	------	----------	-------------	-------------


1:50 Type: ***** (1645x1250)



Element	:	25 Pol. 19 + vlna por. 20 M		
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		□ □ □ □
Zasklenie:	:	1,2= 44mm THX=0,56		
Kridlo	:	1= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	1= OS ľavé Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Kridlo	:	2= 395.67		□ □ □ □
Kovanie	:	2= OS pravé Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Prid. prof.	:	Bas: 145R		□
Poznámka :	:	B5		
Celkom	:	422.94 €	x 1 =	422.94 €

Poz: 20	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2120	Výška: 1450
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2120x1450)



Element	: (36) Pol. 10 + veta. pos. + vn. pos. + vn. pos. + vn. pos. + vn. pos.	
Farba profilov	: Antrazit	
Rám	: 390.06	□ □ □ □
Zasklenie:	: 1,2= 44mm+VSG	□ □ □ □
Kridlo	: 1= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	: 1= OS ľavé Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Kridlo	: 2= 395.67	□ □ □ □
Kovanie	: 2= OS pravé Okenna klucka HOPPE	□ □ □ □
Príd. prof.	: Bas: 145R	□
Poznámka :	: B6	
Celkom	:	614.99 € x 1 = 614.99 €

Poz: 21	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1000	Výška: 1990
---------	------	----------	-------------	-------------


1:50 Type: ***** (1000x1990)



Element	: (10) Pol. 11	
Farba profilov	: Antrazit	
Rám	: 372.07 / 7788	□ □ □ □
Zasklenie:	: 1= RENOLIT Standard 36/1L	□ □ □ □
Kridlo	: 1= 379.67	□ □ □ □
Kovanie	: 1= Vchod.dv.P Dverová klúčka JOWIS92 K+K	□ □ □ □
Poznámka :	: vetracia mrležka	
	: B10	
	: brano	
	: garáž	
Celkom	:	650.22 € x 1 = 650.22 €

Poz: 22	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2060	Výška: 2300
---------	------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2060x2300)



Element	: (AD) Pol. 12	
Farba profilov	: Antrazit	
Rám	: 390.06	□ □ □ □
Zasklenie:	: 1,2= ESG-Float-VSG-44mm	□ □ □ □
Kridlo	: 2= 373.67	□ □ □ □
Kovanie	: 2= Vchod.dv.P Dverová klúčka JOWIS92 K+K	□ □ □ □
Poznámka :	: A4	
Celkom	:	1 200.79 € x 1 = 1 200.79 €

Poz: 23	Ref:	Počet: 1	Šírka: 3230	Výška: 2300
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (3230x2300)



Element	: (AD) Pol. 13	
Farba profilov	: Antrazit	
Rám	: 372.07	□ □ □ □
Zasklenie:	: 1,2= ESG-Float-VSG-44mm	□ □ □ □
Kridlo	: 2= 373.67	□ □ □ □
Kovanie	: 2= POS L	□ □ □ □
Poznámka :	: A5	
	: kl kl	
Celkom	:	2 246.91 € x 1 = 2 246.91 €

Poz: 24	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1470	Výška: 1470
1:50 Type: ***** (1470x1470)				
Element	:	Ⓚ1	Pot. 15 + vchod. poz + vnut. poz + dverová spojka	
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06	□	□
Zasklenie:	:	1,2= ESG-Float-VSG-44mm	□	□
Krídlo	:	1= 395.67	□	□
Kovanie	:	1= OS ľavé Okenna klucka HOPPE	□	□
Krídlo	:	2= 395.67	□	□
Kovanie	:	2= O pravé Okenna klucka HOPPE	□	□
Príd. prof.	:	Bas: 145R		□
Poznámka	:	B7		
Celkom	:		537.00 €	x 1 = 537.00 €

Poz: 25	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2120	Výška: 2000
1:100 Type: ***** (2120x2000)				
Element	:	Ⓚ5	Pot. 15 + vchod. poz + vnut. poz + dverová spojka	
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06	□	□
Zasklenie:	:	1,3,4= ESG-Float-VSG-44mm	□	□
	:	2= 44mm THX=0,56		
Krídlo	:	1= 395.67	□	□
Kovanie	:	1= OS ľavé Okenna klucka HOPPE	□	□
Krídlo	:	2= 395.67	□	□
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	□	□
Krídlo	:	3= 395.67	□	□
Kovanie	:	3= O pravé Okenna klucka HOPPE	□	□
Krídlo	:	4= 395.67	□	□
Kovanie	:	4= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE	□	□
Príd. prof.	:	Bas: 145R		□
Poznámka	:	B8		
Celkom	:		1 098.17 €	x 1 = 1 098.17 €

Poz: 26	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2040	Výška: 2910
1:100 Type: ***** (2040x2910)				
Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	372.07	□	□
Zasklenie:	:	1= 44mm+SATIN	□	□
Príd. prof.	:	Bas: 145R		□
Príd. prof.	:	Droite: 352 hr.spojka		□
Poznámka	:	5		
	:	conex		
Celkom	:		716.10 €	x 1 = 716.10 €


Poz: 27	Ref:	Počet: 1	Šírka: 1000	Výška: 2910
1:100 Type: ***** (1000x2910)				
Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	372.07 / 7768	□	□
Zasklenie:	:	1,2= 44mm+SATIN	□	□
Krídlo	:	1= 378.67	□	□
Kovanie	:	1= Vchod.dv.P Dverová klúčka JOWIS92 K+K	□	□
Poznámka	:	5		
	:	conex sklo		
Celkom	:		861.74 €	x 1 = 861.74 €

Ⓚ5 vid. vyraz + unifikovaných vyplni otvorov
Pot 16+17

AD Pol. 17+15
Pol. 17+15 - dvere s dvierovými kľúčkami

Poz: 28	Ref:	Počet: 2	Šírka: 995	Výška: 2100
---------	------	----------	------------	-------------

1:100 Type: ***** (995x2100)




Element :
 Farba profilov : Antrazit
 Rám : 372.07 / 7788
 Zasklenie : 1= 44mm+VSG
 Kridlo : 1= 378.67
 Kovanie : 1= Vchod.dv. L Dverová kľúčka JOWIS92 K+K
 Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
 Poznámka :
 : vetracia mriežka
 : A2
 : brano
 : B11
 : panílkovo

Celkom : 722.71 € x 2 = 1 445.42 €

Poz: 29	Ref:	Počet: 2	Šírka: 1155	Výška: 2100
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1155x2100)




Element :
 Farba profilov : Antrazit
 Rám : 390.06
 Zasklenie : 1= 44mm+VSG
 Príd. prof. : Bas: 145R
 Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
 Poznámka :
 : A2
 : B11

Celkom : 393.52 € x 2 = 787.04 €

Poz: 30	Ref:	Počet: 1	Šírka: 2055	Výška: 2100
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (2055x2100)




Element :
 Farba profilov : Antrazit
 Rám : 390.06
 Zasklenie : 1,2= ESG-Float-VSG-44mm
 Príd. prof. : Bas: 145R
 Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
 Poznámka :
 : A7

Celkom : 822.97 € x 1 = 822.97 €

Poz: 31	Ref:	Počet: 1	Šírka: 995	Výška: 2100
---------	------	----------	------------	-------------

1:100 Type: ***** (995x2100)




Element :
 Farba profilov : Antrazit
 Rám : 372.07 / 7788
 Zasklenie : 1= ESG-Float-VSG-44mm
 Kridlo : 1= 378.67
 Kovanie : 1= Vchod.dv. L Dverová kľúčka JOWIS92 K+K
 Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
 Poznámka :
 : A7

Celkom : 720.49 € x 1 = 720.49 €

31) 2x20 Pol. 2+32+37+23 + 3145g + unil. pav. + unil. pav. par. 11


Poz: 32	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------



- Element :
- Farba profilov : Antrazit
- Rám : 390.06
- Zasklenie: : 1-3= 44mm+VSG
- Kridlo : 1= 395.67
- Kovanie : 1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
- Kovanie : 3= 395.67
- Kovanie : 3= OS ľavé Okenna klucka HOPPE
- Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
- Príd. prof. : Haut: 360_15mm_
- Príd. prof. : Bas: 360 (30mm)
- Poznámka : B1

Celkom : 900.53 € x 4 = 3 602.12 €


Poz: 33	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------



- Element :
- Farba profilov : Antrazit
- Rám : 390.06
- Zasklenie: : 1,2= 44mm+VSG
- Kridlo : 1= 395.67
- Kovanie : 1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
- Príd. prof. : Bas: 145R
- Príd. prof. : Droite: 144 (JPP)
- Príd. prof. : Haut: 360_15mm_
- Príd. prof. : Bas: 360 (30mm)
- Príd. prof. : Droite: 363/120/
- Príd. prof. : Droite: 360 (30mm)
- Poznámka : B1

Celkom : 801.87 € x 4 = 3 207.48 €

Poz: 34	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2200
---------	------	----------	-------------	-------------




- Element :
- Farba profilov : Antrazit
- Rám : 390.06
- Zasklenie: : 1,2= 44mm+VSG
- Kridlo : 1= 395.67
- Kovanie : 1= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE
- Príd. prof. : Bas: 145R
- Príd. prof. : Haut: 360_15mm_
- Príd. prof. : Bas: 360 (30mm)
- Príd. prof. : Droite: 352 hr.spojka
- Poznámka : B1

Celkom : 755.83 € x 4 = 3 023.32 €

Poz: 35	Ref:	Počet: 4	Šírka: 1805	Výška: 2250
---------	------	----------	-------------	-------------

1:100 Type: ***** (1805x2250)



Element	:			
Farba profilov	:	Antrazit		
Rám	:	390.06		
Zasklenie:	:	1-3= 44mm+VSG		□ □ □ □
Kridlo	:	2= 395.67		
Kovanie	:	2= Sklopné do v910 Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Kridlo	:	3= 395.67		
Kovanie	:	3= OS pravé Okenna klucka HOPPE		□ □ □ □
Príd. prof.	:	Bas: 145R		
Príd. prof.	:	Haut: 360 15mm		
Príd. prof.	:	Bas: 360 (30mm)		□ □ □ □
Poznámka :	:	B1		
Celkom	:	853.47 €	x 4 =	3 413.88 €

Výrobky celkom : 48 899.67 €

Príplatky:

pánikové kovanie	2.00 €	x 394.14 =	788.28 €
AL parapety 400 mm	27.23 €	x 68.36 =	1 861.44 €
PVC parapety 260 mm	19.90 €	x 68.36 =	1 360.36 €
poz. 7/A6 SPH	71.00 €	x 1.00 =	71.00 €
poz. 9/B1 SPH 302,5 x 110	150.00 €	x 1.00 =	150.00 €
poz. 12/B1/SPH 302,5 x 110	150.00 €	x 1.00 =	150.00 €
poz. 13/B2/SPH	50.00 €	x 1.00 =	50.00 €
poz. 16/B2 SPH	50.00 €	x 1.00 =	50.00 €
poz. 17/B3 SPH	37.50 €	x 1.00 =	37.50 €
poz. 18/B4 SPH	29.50 €	x 1.00 =	29.50 €
poz. 20/B6 SPH	38.00 €	x 1.00 =	38.00 €
poz. 24/B7 SPH	25.00 €	x 1.00 =	25.00 €
poz. 25/B8 SPH	40.00 €	x 1.00 =	40.00 €
poz. 32/B1 SPH 302,5 x 110	200.00 €	x 1.00 =	200.00 €
poz. 35/B1 SPH 302,5 x 110	200.00 €	x 1.00 =	200.00 €

Príplatky celkom :

5 051.09 €

Cena bez DPH	:	53 950.76 €
DPH 20 %	:	10 790.15 €
Cena s DPH	:	<u>64 740.91 €</u>

-Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

-V prípade ďalších dotazov sa obráťte na pracovníkov obchodného oddelenia.

-Cenova ponuka platí 15 dní.

- Štandardné farby sú:

Weis, Golden Oak, Nussbaum, Sapeli, Antrazitgrau, Antrazit **Ulti matt**, Antrazitgrau glatt, Schiefergrau glatt, Quarzgrau, Basaltgrau, Cremweiss, Eiche dunkel, Eiche grau, Grau, Schokobraun, Braun Maron, Eiche Dunkel, Eiche Rustikal, Bergkiefer, Oregon 4, Weinrot, Signalgrau glatt, Moosgrün, Dunkelgrün, Streifen Douglasie, Mooreiche, Schwarzbraun, Stahlblau, Black Cherry, Achatgrau, Lichtgrau, Metbrush Silver, Betongrau, Irish Oak, Metbrush Platin, Metbrush Quarzgrau, Metbrush Antrazitgrau, Quarzgrau matt, Rustic Cherry, Schwarzgrau matt, Umbragrau glatt, Black **ulti matt**, Winchester.

-Príplatok +15 % za ostatné neštandardné farby.

- Cenová ponuka obsahuje vonkajšie hliníkové parapety v základných farbách: biela, antrazit, bronz a hnedá.

- Vonkajšie hliníkové parapety (Neštandardné farby): sa striekajú do všetkých odtienov RAL za príplatok.

-(Podľa STN 73 0540-2 od 01.01.2021 vonkajšie otvorové konštrukcie musia spĺňať hodnotu $U_w 0,85 \text{ W/m}^2/\text{K}$)

Ak si želáte okná s nevyhovujúcim koeficientom U_w , prehlasujete že ste bol o platnosti STN informovaný.

-Podľa zákona 122/2013 z.z.o ochrane osobných údajov týmto slobodne dávate súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, adresa, tel. číslo, e-mailová adresa našej spoločnosti a zároveň prehlasujete že všetky údaje sú aktuálne a pravdivé.





Vypracovala :Annamária Soósová
tel:+421 918 521 191
email:mbkokno2@mbkokno.sk

podpis dodávateľa:

podpis objednávateľa:

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.stetier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Výkaz vonkajších výplní otvorov	mierka: 1:100	č. výkr. 13

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS				
A1		<p>ROHOVÝ STĚPĚK 80/80 mm</p> <p>Presklená vstupná rohová zostava s dvoma dvojkrídlovými dverami, celopresklenými a pevným nadsvetlíkom a pevnými zaskleniami, hliníkovej konštrukcie</p> <p>Dvorné krídla šírky 900 mm, otváranie v smere úniku (do exteriéru)</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Dvere mín. priechovej šírky 1800 mm Profily farby RAL 7016 antracit Bez vnútorného a vonkajšieho parapetu Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
miestnosť 1.02			<p>(B) + (S) + (K)</p> <p>(B) – BEZPEČNOSTNÉ SKLO (S) – SKLO (4mm) (K) – KALENÉ SKLO</p>	1		
A2		<p>(B) + (S) + (K)</p> <p>Únikové dvere von otvárajú, celopresklené, s pevným zasklením na jednej strane, plastovej konštrukcie</p> <p>Dvorné krídlo ľavé otváranie von Dvere mín. priechovej šírky 900 mm Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Stavebný otvor 2150/2100 mm Rám RAL 7016 Antracit</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
miestnosť 1.03						
A3		<p>ROHOVÝ STĚPĚK 80/80 mm</p> <p>Presklená vstupná rohová zostava s jednokrídlovými celopresklenými vstupnými dverami, so sklenným, dvoma otvárajavo-sklennými oknami a pevnými zaskleniami, plastovej konštrukcie</p> <p>Dvorné krídlo pravé šírky 900 mm, von otvárajú</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Dvere mín. priechovej šírky 900 mm Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
miestnosť 1.13			<p>(B) + (S) + (K)</p>	1		

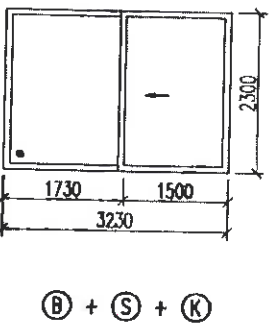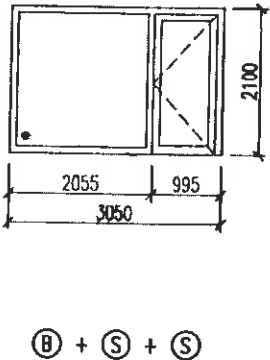OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
A4 miestnosť 2.04		<p>Dvere na terasu jednokrídlové, celopresklenné, otváraťo-sklpné s pevným zasklením na jednej strane plastovej konštrukcie.</p> <p>Hlavné dvamé krídlo ľavé otváranie (do interiéru) Dvere min. priechoďnej šírky 800 mm</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čieré Stavebný otvor 2150 x 2300 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. a ext.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
A5 miestnosť 2.03		<p>Dvere na terasu jednokrídlové, celopresklenné, posuvné s pevným zasklením na jednej strane plastovej konštrukcie.</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čieré Stavebný otvor 3230 x 2300 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. a ext.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
A6 miestnosť 1.22 2.18		<p>4-dielne okno s otváraťo-sklpným a otvárazým krídlom so stredovým stĺpikom, pevným zasklením nadsvetlíka a spodnej časti, plastovej konštrukcie.</p> <p>Okenné krídla sľmetrické otváranie (do interiéru)</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čieré Stavebný otvor 1930 x 3160 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. Sľefka proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1	1		2
A7 miestnosť 3.02		<p>Dvere na strechu jednokrídlové, celopresklenné, s pevným zasklením na jednej strane plastovej konštrukcie.</p> <p>Hlavné dvamé krídlo ľavé otváranie (do interiéru) Dvere min. priechoďnej šírky 900 mm</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čieré Stavebný otvor 3050 x 2100 mm. Profily farby RAL 7016 antracit</p> <p>Kovanie s kľukami v int. a ext.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>			1	1

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
<p>B1</p> <p>miestnosť</p> <p>1.23</p> <p>1.24</p> <p>1.25</p> <p>2.20</p> <p>2.21</p> <p>2.22</p> <p>2.23</p>		<p>Okenná zostava plastovej konštrukcie, s oknami otváravo-sklonnými, sklennými a pevným zasklením</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Vnútorý parapet 260mm, vonkajší parapet 6 x 240 mm, 1 x 340 mm Stavebný otvor 7400 x 2250 mm Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				<p>3</p> <p>4</p> <p>7</p>
<p>B2</p> <p>miestnosť</p> <p>1.26</p>		<p>Okenná zostava rohová plastovej konštrukcie, s oknami otváravo-sklonnými, sklennými a pevným zasklením</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Vnútorý parapet 260mm, vonkajší parapet 240 mm Stavebný otvor 5650 x 2250 mm a 1825 x 2250 mm Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				<p>1</p> <p>1</p>
<p>B3</p> <p>miestnosť</p> <p>1.09</p> <p>1.10</p>		<p>Okno plastovej konštrukcie, otváravo-sklonné.</p> <p>Izolačné trojsklo Sklo číre! Vonkajší parapet 240 mm Stavebný otvor 600 x 1250 mm Profily farby RAL 7016 antracit Sieťka proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				<p>2</p> <p>2</p>
<p>B4</p> <p>miestnosť</p> <p>1.11</p>		<p>Okno plastovej konštrukcie, sklenné.</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Vnútorý parapet 260mm, vonkajší 240 mm Stavebný otvor 2000 x 600 mm Profily farby RAL 7016 antracit Sieťka proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>				<p>1</p> <p>1</p>

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
B5 miestnosť 1.18	<p>KRYCÍ PRVK PŘEČKA 115mm</p> <p>1200 1250 15 750 15 750 15 15 1615 15 1645</p> <p>⊙ + ⊙ + ⊙</p>	<p>Okno plastovej konštrukcie, dvojkrídlové otváravo-eklopné, krycí prvok (priečka 115mm).</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre! Vonkajší parapet 240 mm Stavebný otvor 1645 x 1250 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
B6 miestnosť 2.01 schodisko	<p>1500 1450 15 15 1060 1060 15 15 2120 15 2150</p> <p>⊙ + ⊙ + ⊙</p>	<p>Okno plastovej konštrukcie, dvojkrídlové otváravo-eklopné a sklópne krídlo</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre! Vnútorný parapet 260 mm, vonkajší 240 mm Stavebný otvor 2150 x 1500 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
B7 miestnosť 2.16	<p>1520 1470 15 15 735 735 15 15 1470 15 1500</p> <p>⊙ + ⊙ + ⊙</p>	<p>Okno plastovej konštrukcie, dvojkrídlové otváravo-eklopné a sklópne.</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre! Vonkajší parapet 240 mm Stavebný otvor 1500 x 1520 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
B8 miestnosť 3.01	<p>2000 1950 15 15 1060 1060 15 15 2120 15 2150</p> <p>⊙ + ⊙ + ⊙</p>	<p>Okno plastovej konštrukcie, štvorkrídlové a otváravo-sklópny a otváravým krídlom, a dvoma sklópnymi krídlami v hornej časti.</p> <p>Izolačné trojsklo – sklo číre! Vnútorný parapet 260 mm, vonkajší 240 mm Stavebný otvor 2150 x 2000 mm</p> <p>Profily farby RAL 7016 antracit.</p> <p>Pred vymbením premerať otvor na mieste tvaru!</p>			1	1
B9 miestností 1.04 2.05 1.05 2.06 1.08 2.07 1.14 2.08 1.15 2.11 1.21 2.17	<p>2200 2150</p> <p>⊙ - SIEŤKA PROTI HMYZU</p>	<p>Pôvodné okná plastovej konštrukcie, otváravé, otváravo-sklópne a sklópne.</p> <p>Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo číre! Stavebný otvor 2150 x 2200 mm</p> <p>Výmena vonkajšieho parapetu na 240 mm Doplnenie sieťkami proti hmyzu</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	10	14		24

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU
B10 miestnosť 1.11		<p>Dvere von otvárate, bezpečnostné, exteriérové, plastovej konštrukcie osadené do zárubne.</p> <p>Výplň píná, s vetracou mriežkou 450/450 mm v spodnej časti krídla (pre prívod vzduchu). Dvere ľavé priečhodnej šírky 900 mm, otváranie v smere úniku (do exteriéru). Štandardné kovanie a dőzický zámok. samozatvárač.</p> <p>Povrchová úprava antracitovej farby.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1
B11 miestnosť 2.02		<p>Dvere únikové jednokrídlové exteriérové, celopresklenné, s pevným zasklením na jednej strane, plastovej konštrukcie.</p> <p>Dverné krídlo šírky 900 mm, otvárate von. Bezpečnostné izolačné trojsklo – sklo čieré. Rám RAL 7016 Antracit.</p> <p>Samozatvárač, bezpečnostné kovanie s vložkovým zámkom.</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>		1		1
B12 miestnosť 1.11		<p>Sekcionálna výsuvná brána</p> <p>Stavebný otvor 3000 x 2000 mm.</p> <p>Povrchová úprava, farba RAL 7016 antracit.</p> <p>S elektrickým ovládaním</p> <p>Pred vyrobením premerať otvor na mieste tvaru!</p>	1			1

hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder zodpov. projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori projektu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák projektanti: Ing. arch. Stanislav Novák, Ing. Denisa Csáderová stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN	ODC bývanie s.r.o. Lipnická 3125 900 42 Dunajská Lužná 0903 755 588, odc.atelier@gmail.com www.odc.wbl.sk	
názov stavby: Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO	dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: ARCHITEKTÚRA	názov výkresu: Výkaz vnútorných výplní otvorov	mierka: 1:100
		č. výkr. 14

OZN.	SCHÉMA, ROZMERY	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	
1		<p>Dvere píné (interiérové) osadené do obložkovej zárubne.</p> <p>Veľkosť dvierneho krídla 600x1970 mm.</p> <p>Štandardné kovanie a dôzický zámok.</p> <p>Pred vyrobením prameňiť otvor na mieste tvaru!</p>	L'	3			3
			P				
2		<p>Dvere píné, interiérové osadené do obložkovej zárubne.</p> <p>Veľkosť dvierneho krídla 700x1970 mm.</p> <p>Štandardné kovanie a dôzický zámok.</p> <p>Pred vyrobením prameňiť otvor na mieste tvaru!</p>	L'	1	1		2
			P	1	2		3
3		<p>Dvere píné, interiérové osadené do obložkovej zárubne.</p> <p>Veľkosť dvierneho krídla 800x1970 mm.</p> <p>Štandardné kovanie a dôzický zámok.</p> <p>Pred vyrobením prameňiť otvor na mieste tvaru!</p>	L'	2	1		3
			P	3	3		6
4		<p>Dvere píné, interiérové osadené do obložkovej zárubne.</p> <p>Veľkosť dvierneho krídla 900x1970 mm.</p> <p>Štandardné kovanie a dôzický zámok.</p> <p>Pred vyrobením prameňiť otvor na mieste tvaru!</p>	L'	3	4		7
			P	4	6		10
5	<p>• - PEVNÉ ZASLONIE</p>	<p>Interiérová zasklená stena, a dverami jednokrídlovými, konštrukcia z plastových profilov, a pevným zasklením nadsvetlíku a pevným zasklením po strane.</p> <p>Jednoduché zasklenie bezpečnostným lepeným - vrstveným sklom CONNEX - napriehadným</p> <p>Dverné krídlo pravé, zasklené, svetlej farby 900 mm.</p> <p>Stavebný otvor 3050 x 2870 mm</p> <p>Rám RAL 7016 Antracit</p> <p>Bezpečnostné kovanie a vložkovým zámkom a kľúčami.</p> <p>Pred vyrobením prameňiť otvor na mieste tvaru!</p>			1		1

Ponuka vystavená

CP2022 0945

Dodávateľ

Danter brány s.r.o.
 Bratislavská cesta 5608
 92901 Dunajská Streda
 IČO: 48058467
 DIČ: 2120041330
 IČ DPH: SK2120041330
 Tel.: 031/5515353
 Fax:
 e-mail: ponuky@danter.sk
 www:

Sp. zn.: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35444/T.

Odberateľ

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23
 92901 Dunajská Streda
 Slovensko
 IČO: 50781570
 DIČ: 2120487886
 IČ DPH: SK2120487886

Dátum vystavenia 30.09.2022

Dátum platnosti od 30.09.2022

Dátum platnosti do 07.10.2022

Dátum vybavenia

Označenie dodávky	Katalóg	Počet MJ	MJ	Cena za MJ	Sadzba	DPH	Celkom s DPH
Garážová brána AF500 antracit. STD	3010*2230	1,0000	ks	2568,2000	0%	0,00	2 568,20Eur
DNT - Pohon BT1000 /2ks DO/	BT 1000	1,0000	ks	300,6000	0%	0,00	300,60 Eur
DNT - kofajnica retazova do 3,3m	DNTRAIL3,3	1,0000	ks	66,2000	0%	0,00	66,20 Eur
Inšalačný materiál	Ištal	1,0000	ks	15,0000	0%	0,00	15,00 Eur
Montáž	Montáž	1,0000	ks	170,0000	0%	0,00	170,00 Eur
Cestovné náklady	CN	1,0000	ks	35,0000	0%	0,00	35,00 Eur

Sadzba DPH	Základ	Výška DPH	Celkom
Nulová 0%	3 155,00	0,00	3 155,00
Znížená 10%	0,00	0,00	0,00
Základná 20%	0,00	0,00	0,00
CELKOM	3 155,00	0,00	3 155,00 Eur

Rozpis DPH uvedený v mene Eur

206 255
 150
 16

produkt	šírka	výška	plocha	parametre	cena/ks bez DPH	počet	cena spolu bez DPH / s DPH
Z90 - motor SOMFY IO	2940 mm	2970 mm	8.73 m ²	Ovládanie: na stred Lamela: 8005 - RAL 7016 Typ vodiacej lišty L: VL1 Typ vodiacej lišty P: VL1 Farba vodiacej lišty L: 8005 - RAL 7016 Farba vodiacej lišty P: 8005 - RAL 7016 Farba závažia: RAL 7016 Farba konzoly L: -1 - žiadna/ nelakovaná Farba konzoly P: -1 - žiadna/ nelakovaná Typ ovládača: vlastný Typ motora: Somfy J406 io protect [6Nm] (DO) Typ konzoly L: žiadna Typ konzoly P: žiadna Počet držiakov profilu: 4 Počet konzol L: 0 Počet konzol P: 0 Vodiaci štít-kov: áno	647.73 €	12	7772.74 € 9405.01 €
Z90 - motor SOMFY IO	3700 mm	2450 mm	9.06 m ²	Ovládanie: na stred Lamela: 8005 - RAL 7016 Typ vodiacej lišty L: VL7 Typ vodiacej lišty P: VL7 Farba vodiacej lišty L: 8005 - RAL 7016 Farba vodiacej lišty P: 8005 - RAL 7016 Farba závažia: RAL 7016 Farba konzoly L: -1 - žiadna/ nelakovaná Farba konzoly P: -1 - žiadna/ nelakovaná Typ ovládača: vlastný Typ motora: Somfy J406 io protect [6Nm] (DO) Typ konzoly L: žiadna Typ konzoly P: žiadna Počet držiakov profilu: 5 Počet konzol L: 0 Počet konzol P: 0 Vodiaci štít-kov: áno	652.43 €	15	9786.48 € 11841.64 €
Z90 - motor SOMFY IO	1850 mm	2450 mm	4.53 m ²	Ovládanie: na stred Lamela: 8005 - RAL 7016 Typ vodiacej lišty L: VL7 Typ vodiacej lišty P: VL7 Farba vodiacej lišty L: 8005 - RAL 7016 Farba vodiacej lišty P: 8005 - RAL 7016 Farba závažia: RAL 7016 Farba konzoly L: -1 - žiadna/ nelakovaná Farba konzoly P: -1 - žiadna/ nelakovaná Typ ovládača: vlastný Typ motora: Somfy J406 io protect [6Nm] (DO) Typ konzoly L: žiadna Typ konzoly P: žiadna Počet držiakov profilu: 3 Počet konzol L: 0 Počet konzol P: 0 Vodiaci štít-kov: áno	470.32 €	2	940.64 € 1138.17 €
Ovládače EZ	0 mm	0 mm	1.00 m ²	Typ ovládača: SOMFY Smoove Origin 2 IO (1800204)	56.64 €	20	1132.80 € 1370.69 €
Ovládače EZ	0 mm	0 mm	1.00 m ²	Typ ovládača: SOMFY Situa S IO Pure (1870328)	59.54 €	4	238.14 € 288.15 €
Senzory/ Čidla	0 mm	0 mm	1.00 m ²	Typ: SUNIS Wirefree II IO	106.45 €	2	212.90 € 257.60 €
Ostatné náklady							1129.75 € 1367.00 €
SPOLU BEZ DPH							21213.45 €
SPOLU S DPH							25668.27 €

pol 15
170
10

produkt	šírka	výška	plocha	parametre	cena/ks bez DPH	počet	cena spolu bez DPH / s DPH
Krycí plech - predokenný	2940 mm	280 mm	2.94 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držáku plechu: DK 5A Typ nadstavca držáka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=280 B=70 Počet držákov: 4	151.83 €	12	1822.02 € 2204.64 €
Krycí plech - predokenný	2940 mm	280 mm	2.94 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držáku plechu: DK 5A Typ nadstavca držáka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=280 B=70 Počet držákov: 4 Bočnica L/ príložená: 1 Bočnica P/ príložená: 1	153.05 €	12	1836.60 € 2222.29 €
Krycí plech - predokenný	3750 mm	270 mm	3.75 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držáku plechu: DK 5A Typ nadstavca držáka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=270 B=140 Počet držákov: 5 Bočnica L/ príložená: 1 Bočnica P/ príložená: 1	193.37 €	15	2900.53 € 3509.64 €
Krycí plech - predokenný	2000 mm	270 mm	2.00 m ²	Typ: Vonkajší nástrek plechu Veľkosť boxu: Krycí plech do 280mm Typ krycieho plechu: KPP1 Farba krycieho plechu: RAL7016 Typ držáku plechu: DK 5A Typ nadstavca držáka KP: Nástavec 215 (výška KP 230-310) Rozmery: A=270 B=140 Počet držákov: 3 Bočnica L/ príložená: 1 Bočnica P/ príložená: 1	113.97 €	2	227.94 € 275.80 €
Ostatné náklady							688.43 €
							833.00 €
SPOLU BEZ DPH							7475.52 €
SPOLU S DPH							9045.38 €

Dodávateľ

PROIMPEX s.r.o.
1107
925 81 Diakovce



ICO: 36360375
DIČ: 2022190896
IČ DPH: SK2022190896
E-mail: proimpex@proimpex.sk
www.proimpex.sk

IČ DPH:

ICO
DIČ
IČ DPH

50781570
2120487886
SK2120487886

EUROPROJEKTDS -PLUS s.r.o.
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Tel:

Ponuka č.: 22NA00267
Dátum zápisu: 07.09.2022
Platné do: 21.09.2022

Kontaktná osoba:

Dodávka a montáž ocelevej konštrukcie na akciu: Adaptacia, prestavba, prístavba a nadstavba ZŠ Kalinkovo

Označenie dodávky	Množstvo	J. cena	EUR Celkom bez DPH
Dodávka a montáž OK - bránka dvojkridlové dvere k smetným nádobám + výplň celris	1 kusov	1 500,00	1 500,00

SPOLU ZA AKCIU**1 500,00**

pol. 276

Ceny na trhu sa neustále menia, preto je potrebné pred objednaním **cenovú ponuku aktualizovať** a preveriť dostupnosť materiálov.

Presná váha bude upresnená podľa dielenskej dokumentácie.

Cenová ponuka nezahŕňa náklady spojené s likvidáciou stavebného **odpadu**.

Veríme, že naša ponuka bude vyhovovať Vaším požiadavkám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Na práce poskytujeme záruku 60 mesiacov.
V cene sa neuvažuje so zádržným.

Vystavil:

Nikoleta Latičová
laticova@proimpex.sk

Dobrý deň.

Zasielam Vám náčrt kabeláže a cenovú ponuku. Nakreslené je to len tak jednoducho nemáme AUTOCAD a nie sme projektanti. Prechod medzi poschodiami som kreslil za predpokladu, že Prestup do parapetného žľabu je prepoj medzi poschodiami. Ak to je inak podľa toho prekreslite.

Školské hodiny ako aj Hlavné hodiny som umiestnil predpokladám do zborovne (umiestniť ich môžete kam chcete). Okrem pripojenia nakreslenej kabeláže je nutné Školské aj Hlavné hodiny pripojiť na 230VAC najlepšie na zvlášť istíť 10-16A. Taktiež ak nebudú hodiny pri zásuvkách LAN RJ45 je potrebné ku každým hodinám natiahnúť kábel FTP Cat5e.

23.09.2022

Cenová ponuka

Školské hodiny ES – 4 LAN	680.00 EUR bez DPH
NZ 12/75V	250.00 EUR bez DPH
6ks Školský zvonček 75V	192.00 EUR bez DPH
70m Kabeláže CYSY 2x1	42.00 EUR bez DPH
Inštalácia kabeláže, zariadení, dopravné náklady	800.00 EUR bez DPH
SPOLU: 1 964,00 EUR bez DPH	

Odkazy a zariadenia:

<https://www.elektrocas.sk/m/produkty-17/spinacie-hodiny-20/es-4-lan-skolsky-zvoncek-43/>

<https://www.elektrocas.sk/m/produkty-17/spinacie-hodiny-20/el-06-mp3-melodicke-zvonenie-45/> - nejde o presne túto variantu ale v podstate to vyzerá rovnako len to nebude mať MP3 modul

<https://www.elektrocas.sk/a/nz-75v-144/>

<https://www.elektrocas.sk/a/skolsky-zvoncek-75v-139/>

P.S.: Ohľadom fasádnych hodín jej ceny, inštalácie sa ešte ozveme keď spracujeme požiadavky zo včera.

V prípade otázok ma prosím kontaktujte.

s pozdravom

Mgr. Tomáš Unterländer
obchodno - technický manažér

Dobrý deň,

Alternatíva z Hliníka

1ks Fasádny kovový (Al) ciferník o priemere 180cm natretí čiernou matnou farbou (v jednom kuse ošetrení zinkovaním) + 4ks závitové tyče pr. 12mm s podporným držiakom

1 952,83 EUR bez DPH

1ks Motorový hodinový stroj 230V 1/12 oska 50cm + 1pár ručičiek

722,83 EUR bez DPH

Hlavné hodiny EL – 06 so synchronizáciou LAN + Uzamykateľná kovová skriňa 300x300x200mm

642,83 EUR bez DPH

SPOLU: 3 318,49 EUR bez DPH

†

*Inštalácia zariadení, inštalačný materiál, dopravné náklady
850,00 EUR bez DPH

** Objednávateľ zabezpečí: Kábel CYSY 3x1,5 a jeho natiiahnutie (náčres v prílohe) od miesta inštalácie Hlavných hodín až do otvoru pre uzamykateľnú skriňu, otvor pre skriňu o rozmere 300x300x200mm, na miesto inštalácie Hlavných hodín privodný kábel (postuči CYSY 3x1,5) pre napájanie trvalého prúdu 230V pokiaľ možno pripojiť v rozvodnej skrini na zvlášť istič 10-16A, na miesto inštalácie Hlavných hodín dotiahnuť kábel FTP Cat5e, ktorí s druhej strany sa zapoji do miestnej LAN siete – do racku (pokiaľ bude blízko nástenná zásuvka RJ45 je možné to aj prepojiť krátkym prepojovacím káblom - ako bežné PC), pre osku hodinového stroja vyvrtat' cez stenu otvor o priemere 40mm (presné miesto necháme na Vás resp. projektanta podľa toho v akej časti steny z vonka bude ciferník, samozrejme to platí aj o otvore pre skriňu nakoľko diera by mala byť presne v strede otvoru), pri našej inštalácii zabezpečiť nám lešenie resp. plošinu pre prístup z exteriéru.*

30.9.2022

s pozdravom

Mgr. Tomáš Unterländer
obchodno - technický manažér

Elektročas[®] s.r.o.

Hlavná 48

900 27 Bernolákovo

IČO: 35841397

IČ DPH: SK2020202734

www.elektrocas.sk

www.elektrocas.eu

elektrocas@elektrocas.sk

Elektročas® s.r.o.

Hlavná 48

900 27 Bernolákovo

IČO: 35841397

IČ DPH: SK2020202734

www.elektrocas.sk

www.elektrocas.eu

elektrocas@elektrocas.sk

tel.: 02/45993714

mobil: 0905664213

tel.: 02/45993714
mobil: 0905664213

... 02 45993714 0905664213

Ponukový list

2022

Sz & W elektro s.r.o.

Mlynská 308/11
929 01 Dunajská Streda

IČO : 50735969
DIČ : 2120465699
IČ DPH : SK2120465699

Účet

IBAN : SK80 0900 0000 0051 5440 9880

Banka Slovenská sporiteľňa, a.s.

Prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods 12 písm /j/ zákona č 222/2004 Z z

Odberaťel :

EUROPROJEKTDS PLUS s.r.o.

IČO 50781570

DIČ 2120487886

IČ DPH SK2120487886

Kračanská cesta 690/23

929 01 Dunajská Streda

Korešpondenčná adresa


EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda

Dátum vyhotovenia :

2022. 10. 03.

Názov / popis	Množstvo	MJ	Cena bez DPH	DPH	Spolu bez DPH
Material Sieťový dátový kábel FTP Cat5e, 4x2x0.51mm, PVC sivý	250	m	0.780	0%	195.000
Material Kabel CYSY 3x1,5 H05VV-F	150	m	0.870	0%	130.500
Montáž	1		350.000	0%	350.000
Celková suma bez DPH >>>					675.50



Administrator

Dodávateľ


Objednávateľ

Suma bez DPH	675,50
DPH	0,00
Suma s DPH	675,50


Celková suma :

675,50 EUR

Šesťsto sedemdesiat eur + 50/100

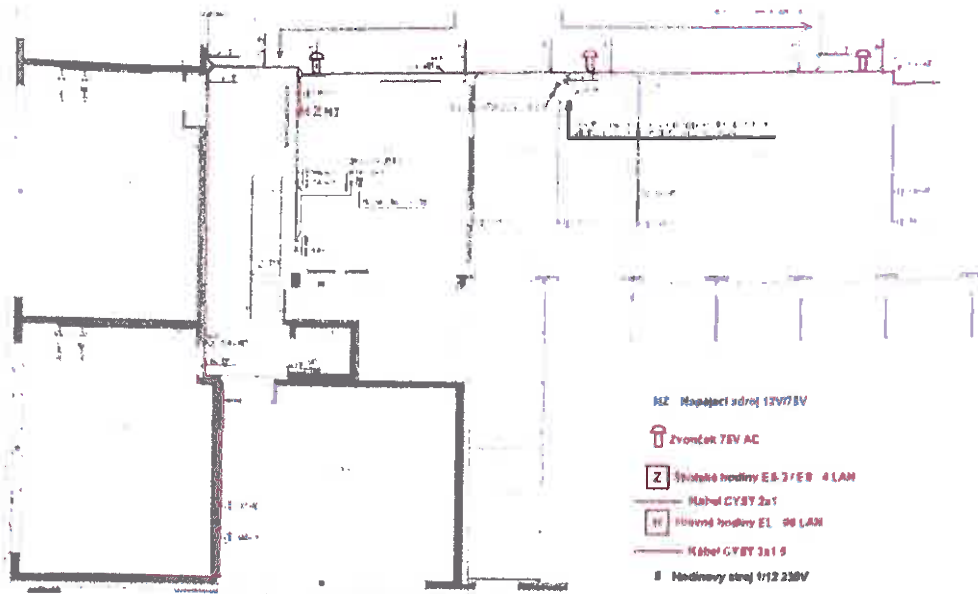

Nákres ciferníka.png

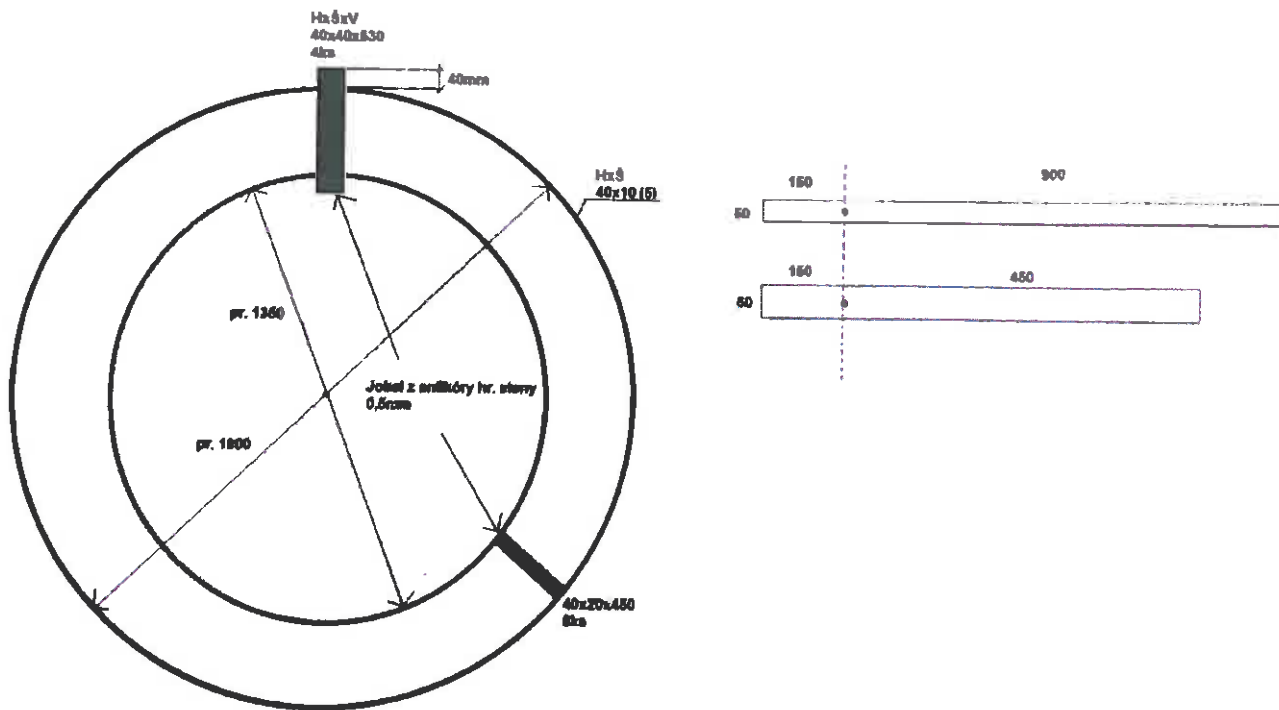


Prfilohy:

2NP.png

119 kB

Nákres ciferníka.png

31.0 kB

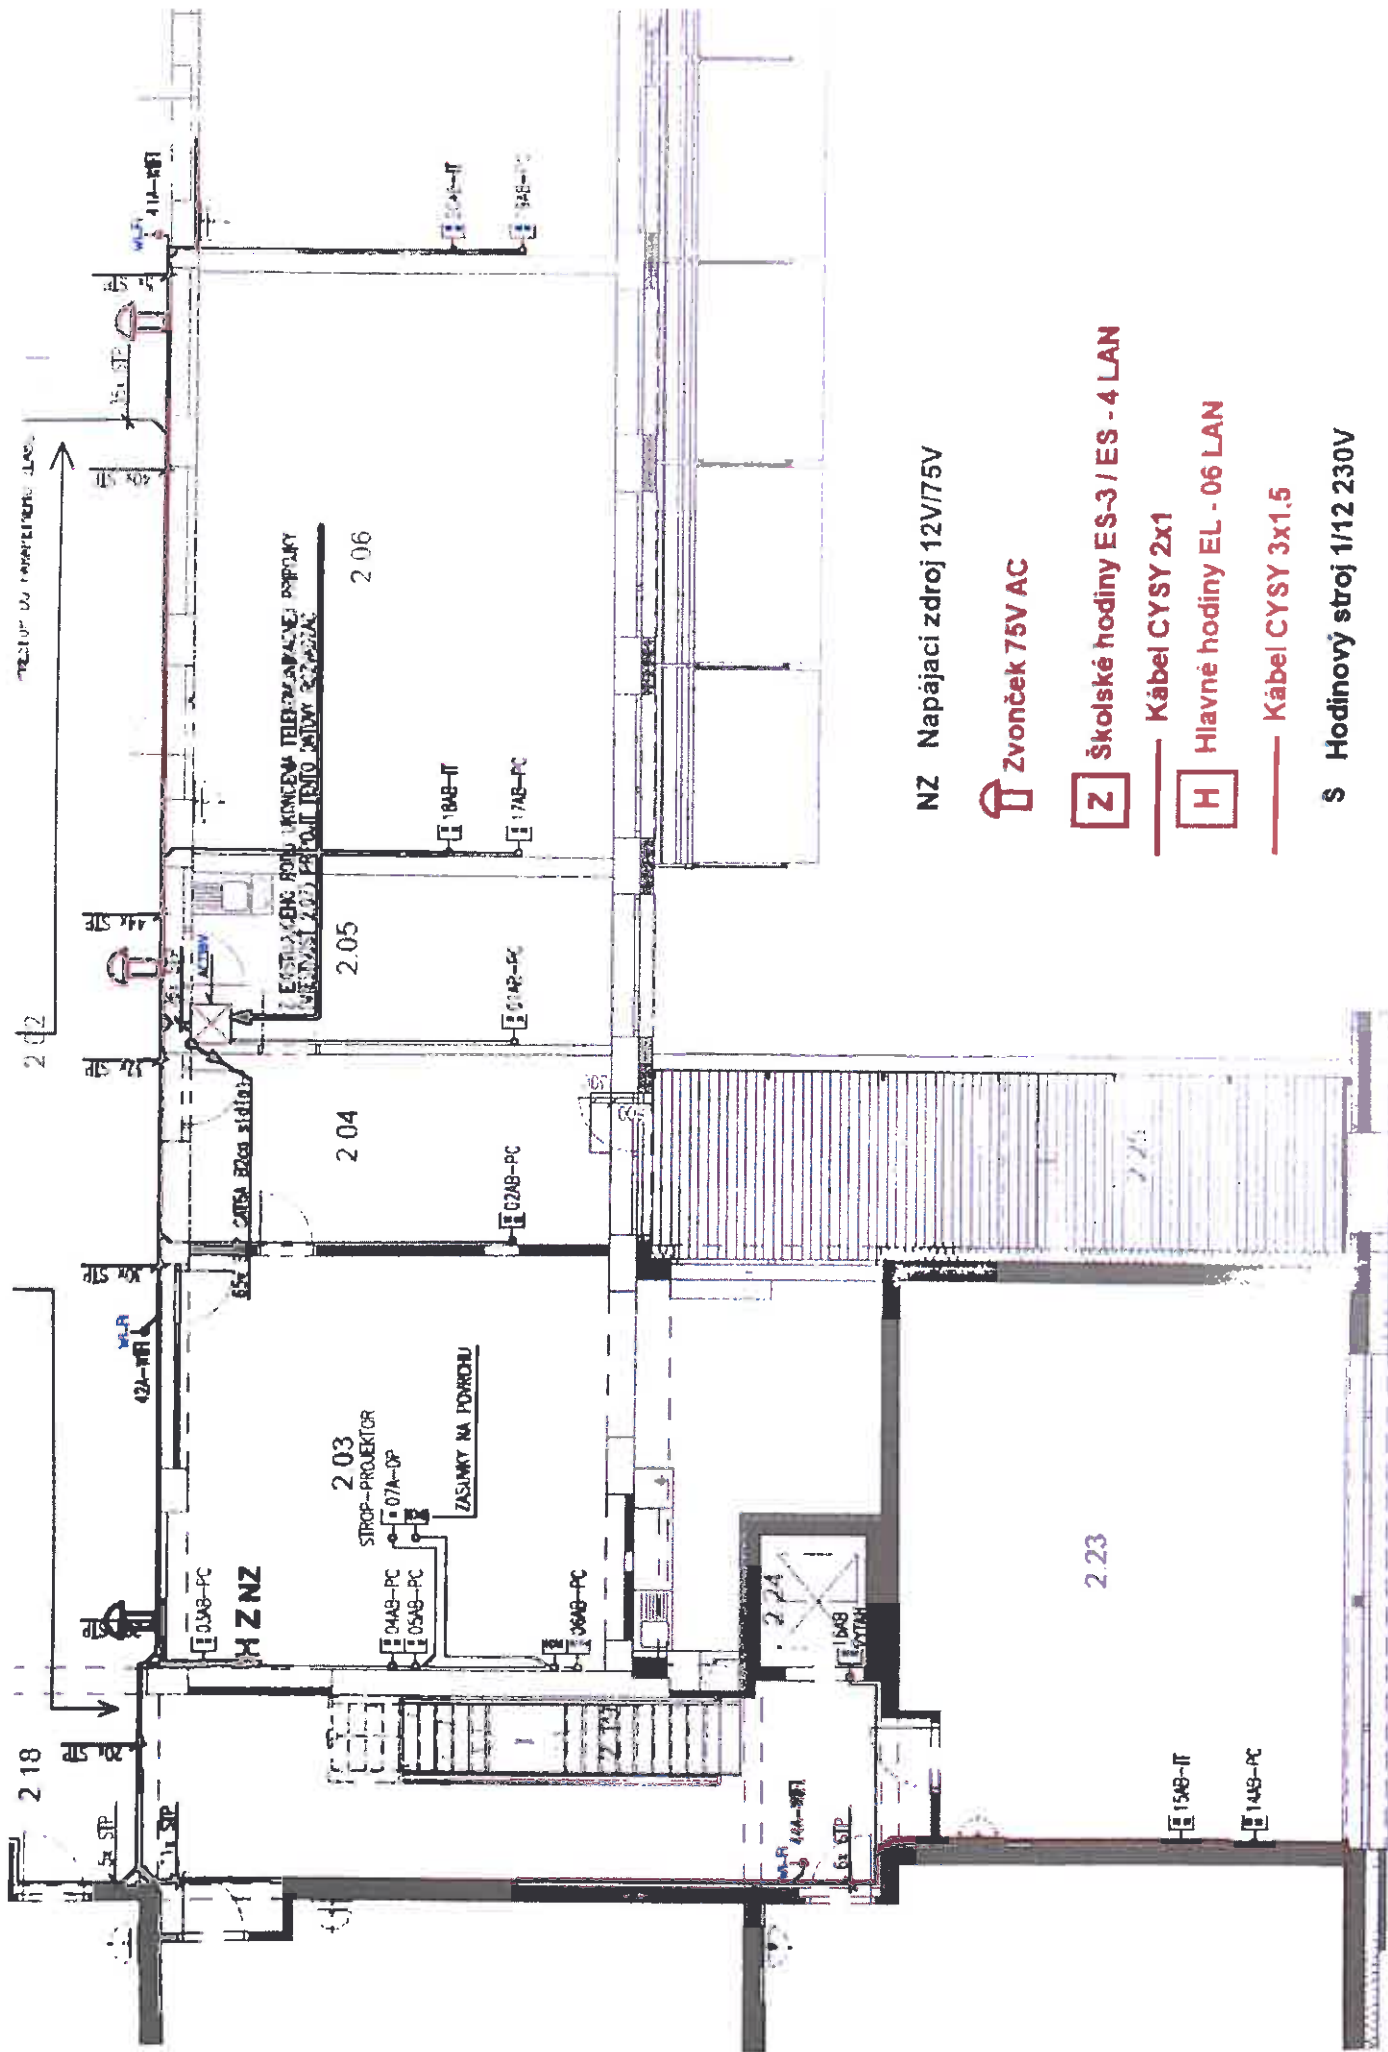

NZ Napájací zdroj 12V/75V

Zvontček 75V AC

Z Školské hodiny ES-3 / ES - 4 LAN

Kábel CYSY 2x1

H Hlavné hodiny EL - 06 LAN

Kábel CYSY 3x1,5

S Hodinový stroj 1/12 230V

5

Predmet: FW: Akcia Kalinkovo
Od: Štefan Rusnák - INGEMA s.r.o. <stefan.rusnak@ingema.sk>
Dátum: 10. 8. 2022, 16:01
Pre: "info@europrojektsro-vo.sk" <info@europrojektsro-vo.sk>
Kópia: "projekty@ingema.sk" <projekty@ingema.sk>

Dobry deň prajem,

Na základe dopytu, zasielam CP.

Dlažba QUBUS 33,3x33,3cm mat. - 12,99 Eur bez DPH/m2 pdl. KS
Dlažba 60x60cm mat. rekt. - 17,99 Eur bez DPH/m2 } pdl. KS
Obklad 30x60cm mat. rekt. - 17,99 Eur bez DPH/m2. } pdl. KS

V prílohe mailu zasielam katalógový list ponúkaných obkladov a dlažieb.
V prípade akýchkoľvek otázok, ma prosím neváhajte kontaktovať.

Ďakujem, pekný deň prajem.

SR

S pozdravom / Best regards

Ing. Štefan Rusnák
Projektový manažér / Project manager

GSM: +421 917 124 390 | E-mail: stefan.rusnak@ingema.sk | Web: www.ingema.sk

INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia, Slovenská republika
Prevádzka / poštová adresa: Močarianska 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142, DIČ: 2021766142

-----Original Message-----

From: Šimon Sabol - INGEMA s.r.o. <simon.sabol@ingema.sk>
Sent: Tuesday, August 9, 2022 1:30 PM
To: projekty@ingema.sk
Cc: Peter Pastornický - INGEMA s.r.o. <peter.pastornicky@ingema.sk>
Subject: FW: [SPAM] Akcia Kalinkovo

S pozdravom / Best regards

Mgr. Šimon Sabol
Vedúci projektového oddelenia/Head of the project department

GSM: +421 905 476 642 | Fax: 00421 56 2812 004 | E-mail: simon.sabol@ingema.sk | Web: www.ingema.sk

INGEMA s.r.o., Hlivištia 23, 073 01 Hlivištia, Slovenská republika Prevádzka / poštová adresa: Močarianska 1, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
IČO: 36575411, IČ DPH: SK2021766142, DIČ: 2021766142

-----Original Message-----

From: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. - Verejne Obstaravanie <info@europrojektsro-vo.sk>
Sent: Tuesday, August 9, 2022 1:22 PM
To: projekty@ingema.sk
Subject: [SPAM] Akcia Kalinkovo

Dobry deň,

poprosim nacenit a ponuknut nasledovny material:

Dlaždice gresové minimálna hrúbka od 10mm 214,128m2 (farba do hnedá, 30x30 alebo 33x33)

Dlaždice gresové protišmykové mrazuvzdorné minimálna hrúbka od 10mm 55,408m2 (farba môže byť taká istá ako

Obklad keramicke glazované jednofarebné hladké farba béžová množstvo 261,86m2,

je to aktuálna stavba, ale dodanie bude koncom roka alebo začiatkom budúceho roka, teraz potrebujeme iba ceny, ďakujem pekne

-- S pozdravom
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Mgr. Méhesová Katarína
+421 907 727 177
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda
IČO: 50781570

— Prílohy: —

QUBUS 2019.pdf

4,5 MB

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2022-0006
Stavba: Europrojekt - Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo

JKSO: Kalinkovo
Miesto: Kalinkovo

Objednávateľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Zhotoviteľ: Ervin Mészáros TZB PROFÍ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 8. 2. 2022

IČO: 50781570
IČ DPH: SK2120487888

IČO: 30724503
IČ DPH: SK1020256028

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

(25)
pod. vyhodnotený
4-5

Cena bez DPH			28 594,51
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	28 594,51	5 718,90
Cena s DPH v EUR			34 313,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 31.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 31.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2022-0006

Stavba: Europrojekt - Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo

Miesto: Kalinkovo

Dátum: 8. 2. 2022

Objednávateľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: Ervin Mészáros TZB PROFI

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov			
1	Vykurovanie	28 594,51	34 313,41
		28 594,51	34 313,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Europrojekt - Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo

Objekt:

1 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Zhotoviteľ:

Ervin Mészáros TZB PROFÍ

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

8. 2. 2022

IČO:

50781570

IČ DPH:

SK2120487886

IČO:

30724503

IČ DPH:

SK1020256028

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				28 594,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	28 594,51	20,00%	5 718,90	
Cena s DPH		v EUR		34 313,41

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 28.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 31.10.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Europrojekt - Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo

Objekt:

1 - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Zhotoviteľ: Ervin Mészáros TZB PROFI

Dátum: 8. 2. 2022

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	28 594,51
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	77,82
	77,82
PSV - Práce a dodávky PSV	
713 - Izolácie tepelné	7 902,79
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	745,70
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10 426,52
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 724,11
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	7 566,97
M - Práce a dodávky M	
23-M - Montáže potrubia	150,60
	150,60

ROZPOČET

Stavba:

Europrojekt - Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo

Objekt:

1 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 8. 2. 2022

Objednávateľ: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.

Projektant:

Zhotoviteľ: Ervin Mészáros TZB PROFI

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 594,51

D HSV Práce a dodávky HSV 77,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 77,82

1	K	971042231	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 150 mm, -0,00700t	ks	5,000	5,68	28,40
2	K	971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,0225 m ² , do 300 mm, -0,01700t	ks	2,000	15,43	30,86
3	K	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m ² , hr.n ad 120 mm, -0,00800t	ks	1,000	7,48	7,48
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,710	15,60	11,08

D PSV Práce a dodávky PSV 28 366,09

D 713 Izolácie tepelné 7 902,79

5	K	713482301	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	287,000	1,50	430,50
6	K	713482305	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	175,000	3,65	638,75
7	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	54,060	1,36	73,52
8	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	34,680	1,55	53,75
9	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	88,740	1,87	165,94
10	M	286210003700	Rúra plasthliníková D 16x2 mm/200 m kotúč, PeX-Al-PeX	m	287,000	1,20 15,07	344,40 4254,69
11	M	286210003900	Rúra plasthliníková D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém	m	54,060	1,856 19,37	102,55 1047,14
12	M	286210004000	Rúra plasthliníková D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém	m	34,680	3,87 26,98	133,17 936,67
13	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,085	33,35	2,83

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 745,70

14	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	124,20	124,20
15	M	484810007200	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom a bypassom M 34, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos Para RS 25/6, výkon 45/22,5 kW,	sada	1,000	621,00	621,00
16	K	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,003	167,88	0,50

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 10 426,52

17	K	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	20,000	1,43	28,60
18	K	733126195	Montáž tvarovky - závit 1/2 privarením	ks	12,000	7,47	89,64
19	M	316170019600.S	Nátrubok varný 1/2", z čiernej uhlíkovej ocele	ks	12,000	0,64	7,68
20	K	733126210	Montáž tvarovky - závit 5/4 privarením	ks	2,000	10,94	21,88
21	M	316170020800.S	Závit varný 1 1/4", dĺžky 145 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	2,05	4,10
22	K	733126285	Montáž tvarovky - dienko DN 20 privarením	ks	6,000	8,74	52,44
23	M	316170017800.S	Dienko varné DN 20 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	6,000	1,50	9,00
24	K	733167300	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 16x2	m	287,000	8,26	2 370,62
25	M	286220039800	Spojka D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	30,000	4,18	125,40
26	K	733167306	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 20x2	m	54,000	10,00	540,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	286220040000	Spojka D 20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	5,000	5,27	26,35
28	K	733167309	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 26x3	m	34,000	13,56	461,04
29	M	286220040100	Spojka D 26 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	5,000	7,31	36,55
30	K	733167312	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 32x3	m	87,000	27,77	2 415,99
31	M	286220040200	Spojka D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	10,000	9,95	99,50
32	K	733167336	Montáž plasthliníkovej spojky lisovaním D 32	ks	6,000	6,29	37,74
33	M	286210004600	Rúra plasthliníková D 32x3 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém,	m	87,000	32,67	2 842,29
34	K	733167375	Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 20	ks	1,000	3,51	3,51
35	M	286220046800	Redukcia D 20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	4,96	4,96
36	K	733167378	Montáž plasthliníkovej redukcie lisovaním D 26	ks	5,000	3,88	19,40
37	M	286220047000	Redukcia D 26/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	3,000	6,37	19,11
38	M	286220047200	Redukcia D 26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	2,000	6,66	13,32
39	M	286220047500.S	Redukcia lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 32/20 mm	ks	2,000	8,85	17,70
40	M	286220047500	Redukcia D 32/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	4,000	8,85	35,40
41	K	733167393	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	26,000	3,64	94,64
42	M	286220007700	T-kus D 16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	26,000	7,05	183,30
43	K	733167393	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 16	ks	2,000	3,64	7,28
44	M	286220008600	T-kus D 16/20/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	2,000	8,74	17,48
45	K	733167399	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 20	ks	7,000	4,10	28,70
46	M	286220008900	T-kus D 20/16/16 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	7,000	8,74	61,18
47	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	1,000	4,65	4,65
48	M	286220009700	T-kus D 26/16/26 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	13,71	13,71
49	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	1,000	4,65	4,65
50	M	286220008000	T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	14,31	14,31
51	K	733167400	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 26	ks	6,000	4,65	27,90
52	M	286220010400	T-kus D 26/26/20 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	6,000	13,92	83,52
53	K	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32	ks	1,000	6,29	6,29
54	M	286220010500	T-kus D 32/16/32 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	1,000	21,12	21,12
55	K	733167403	Montáž plasthliníkového T-kusu lisovaním D 32	ks	5,000	6,29	31,45
56	M	286220008100	T-kus D 32 mm, PeX-Al-PeX systém,	ks	5,000	21,93	109,65
57	K	733167445	Montáž plasthliníkového prechodu lisovaním D 32	ks	6,000	6,29	37,74
58	M	286220023800	Prechod D 32x1" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém,	ks	6,000	8,54	51,24
59	M	286220023400	Prechod RADOPRESS D 20x1/2" vonkajší závit, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	12,000	8,49	101,88
60	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	470,000	0,50	235,00
61	K	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,100	47,30	4,73
62	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	l	0,077	50,45	3,88

D 734

Ústredné kúrenie - armatúry

1 724,11

63	K	734200811	Demonláž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	ks	24,000	9,90	237,60
64	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,000	5,14	10,28
65	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4", páčka červená-chróm, GIACOMINI	ks	2,000	24,93	49,86
66	K	734213120	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového vykurovacích teles do G 1/2	ks	25,000	2,51	62,75
67	M	551210012100	Ventil od vzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast,	ks	25,000	12,47	311,75
68	M	551290008100	Pripojovacie skrútkovanie pre VT rohové 2-rúrový systém, EKx3/4"F, PN 10, niklovaná mosadz,	ks	25,000	25,15	628,75
69	M	1	Nákrutka so zvieracím krúžkom 16mm	bal	25,000	4,56	114,00
70	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednoduchej	súb.	25,000	1,75	43,75
71	M	551280001300	Termostatická hlavica ET35	ks	25,000	10,53	263,25
72	K	734890801	Vnútrostavenskovo premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	l	0,020	36,90	0,74
73	K	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	l	0,035	39,36	1,38

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

7 566,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	K	735111810	Demontáž radiátorov článkových, -0,023801	m2	24,000	1,30	31,20
75	K	735112035	Montáž vykurovacieho telesa článkového liatinového výšky 500 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	21,50	129,00
76	K	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	21,50	236,50
77	M	484530018300	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 400x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	2,000	165,24	330,48
78	M	484530018500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 400x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	9,000	184,70	1 662,30
79	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	10,000	21,50	215,00
80	M	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	6,000	190,38	1 142,28
81	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vxlxhl 600x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	4,000	213,26	853,04
82	K	735154213	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	21,50	43,00
83	M	484530034200	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové VK 33, vxlxhl 300x1800x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	2,000	331,78	663,56
84	K	735154214	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	21,50	43,00
85	M	484530034300	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové VK 33, vxlxhl 300x2000x155 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný,	ks	2,000	359,72	719,44
86	K	735191910	Napuslenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia, vykurovacích telies	m	480,000	0,48	230,40
87	M	484120021300	Servomotor SR 5, 230 V/50 Hz pre zmiešavač, voľiteľná ručná/automatická prevádzka pre rýchlomontážne sady DN 20 - 25 pre kotly Vitodens 100-W/111-W, VISSMANN	ks	1,000	171,00	171,00
88	K	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	12,000	0,45	5,40
89	M	5523	Rýchlomontážna sada VK pre spodné napojenie pozostáva z: ventilovej vložky, odvzdušňovacej, zátky, záslepkky, 2 konzól, 4 skrutiek, 4 hmoždínok	ks	25,000	15,60	390,00
90	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,930	46,53	43,27
91	M	2	Nosník MM-C, kotvy, izolované objímky, skrutky, patné plechy	súbor	1,000	658,10	658,10

o M Práce a dodávky M 150,60

D 23-M Montáže potrubia 150,60

92	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	150,60	150,60
----	---	-----------	--	------	-------	--------	--------

Príjemca:	EUROPROJEKT DS - Plus s. r. o.	Meno:	info@comklima.sk
Kont. osoba:		Titul:	
Akcia:	ZŠ Kašinkovo	Meno:	
Odosielateľ:	COM-KLIMA s.r.o., A. Jedlika 4554, 945 01 Komárno	Meno:	info@comklima.sk
Kont. osoba:	András Hajdú	Titul:	
Naša značka:	KN-2208-2022-AHA	Telefón:	+421 945 455 422
		Začiatok:	08.08.2022

Vážený zákazník,

V mene spoločnosti COM KLIMA, s.r.o. Vám ďakujeme za záujem a zároveň Vám zasielame realizačnú cenu za riešenie

Polozka	Názov	Množstvo	MJ	Jedn. cena	Celk. cena
Zariadenie č.1					
1.1	Vetratec jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-1-F7/M5-C6-UA (ľavá) (KOMFOVENT I ZB produkt)	12,00	kpl	3 801,60 €	45 619,20 €
	Op 600 m3/h / 200Pa				
	Qo 600 m3/h / 200Pa				
	Del 2x176W / 230V/50Hz				
	Del ohrev 2.0kW / 230V/50Hz				
	Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací panel C6.1	12,00	kpl	299,20 €	3 590,40 €
	Hmotnosť jednotky 93kg				
	Zr spätná klapka RSK250 + diletačná manžeta 250-4x	12,00	kpl	25,46 €	305,52 €
1.2	Vetratec jednotka s rotačným rekuperátorom DOMEKT-R-700-F-R1-F7/M5-C6-UA (pravá) (KOMFOVENT I ZB produkt)	1,00	kpl	3 801,60 €	3 801,60 €
	Op 600 m3/h / 200Pa				
	Qo 600 m3/h / 200Pa				
	Del 2x176W / 230V/50Hz				
	Del ohrev 2.0kW / 230V/50Hz				
	Kompletný systém MaR a vzdialený ovládač ovládací panel C6.1	1,00	kpl	281,60 €	281,60 €
	Hmotnosť jednotky 93kg				
	Zr spätná klapka RSK250 + diletačná manžeta 250-4x	1,00	kpl	25,46 €	25,46 €
1.3	Kombinovaná mriežka CVVK 250	8,00	kpl	270,30 €	2 162,40 €
1.4	Protiškvŕňová žalúzia PZ-ZN-355x355-S-RAL...	27,00	ks	48,75 €	1 292,25 €
1.5	Tímčé hliatu THR-100-250-1500 (systemair)	13,00	ks	184,45 €	2 397,85 €
1.6	Tímčé hliatu THR-100-250-1000 (systemair)	13,00	ks	194,90 €	2 533,70 €
1.7	Prívodný vetrný smenovací VVKR-A-S-400x5-B-RAL8010	52,00	ks	20,32 €	1 056,64 €
1.8	Príslušenstvo boji PB-VVK-S-400-180-S-H-D1	52,00	ks	83,75 €	4 355,00 €
1.9	Odvodná pta 260	13,00	ks	23,97 €	311,61 €
VZT potrubia kruhové BPERO					
	SR 250 (30% tv.)	286,00	bm	23,77 €	6 797,82 €
	SR 160 (10% tv.)	52,00	bm	18,19 €	941,92 €
	Teplotná izolácia potrubia samé a výfuku 15mm	82,00	m2	9,78 €	801,56 €
	Potrubie štvorcové do obvodu 1420mm (100% tv.)	10,00	ks	68,58 €	685,78 €
Zariadenie č.2					
2.1	Odvodný ventilátor TD 500/180	5,00	ks	160,91 €	804,54 €
	Qo 400 m3/h / 80Pa				
	Del 30W / 230V/50Hz				
	1x spätná klapka RSK180 + diletačná manžeta 180-2x	5,00	kpl	20,79 €	103,95 €
2.2	Odvodný ventilátor QX 100 T s časovým dobehom a spätnou klapkou	3,00	ks	73,53 €	220,59 €
	Qo 80 m3/h / 80Pa				
	Del 28W / 230V/50Hz				
2.3	Výfukové hliavo VHO 100	1,00	ks	25,73 €	25,73 €
2.4	Krycia mriežka IGC 160 - RAL...	3,00	ks	10,80 €	32,40 €
2.5	Krycia mriežka IGC 200 - RAL...	1,00	ks	15,75 €	15,75 €
2.6	Krycia mriežka IGC 100 - RAL...	1,00	ks	10,80 €	10,80 €
2.7	Tenierový ventil odvodný TVO 100	11,00	ks	7,92 €	87,12 €
2.8	Šte štvoré 180	1,00	ks	22,28 €	22,28 €
VZT potrubia kruhové BPERO					
	SR 400 (30% tv.)	11,00	bm	35,41 €	389,50 €
	SR 200 (30% tv.)	5,00	bm	18,01 €	90,07 €
	SR 160 (30% tv.)	25,00	bm	16,19 €	404,77 €
	SR 100 (30% tv.)	12,00	bm	14,97 €	179,62 €
	Krycia mriežka do dveri 460x460 - tech. miestnosť 1.11	1,00	ks	79,90 €	79,90 €
Príslušenstvo pri montáži zariadenia					
	Montážny spojovací a tesniaci materiál	1,00	kpl	3 120,88 €	3 120,88 €
	Budíky a regulátory	1,00	kpl	372,00 €	372,00 €
	Dopravné náklady	1,00	kpl	2 125,00 €	2 125,00 €

	Spolu bez DPH	83 640 €
--	----------------------	-----------------

	Cena spolu bez DPH	83 640 EUR
--	---------------------------	-------------------

DOPLNENÍ					
	Montáž VZT	1,00	kp	11 443,48 €	11 443,48 €

II. Dodacia lehota

podľa ZoD

III. Platobné podmienky

podľa ZoD

IV. Platnosť ponuky

1 mesiac

V. Záruka

podľa ZoD

Iné dojednania

CP neobsahuje istenie hlavných prívodov elektro k jednotlivým zariadeniam v rozvodovej skrině.

CP neobsahuje revíziu správu elektro (dodáva profesa elektro).

CP neobsahuje realizáciu stredných a stranových prechodov a ich vysprávk (stavba).

V prípade potreby vieme tieto položky ponúknuť a zabezpečiť.

Pre ďalšie uprosenia sme Vám k dispozícii.

S pozdravom,

S pozdravom

Andriás Hajdú
COM-KLIMA s r o
Korčáro

COM - KLIMA, s r o IČO 35 936 495
A. Jedliha 4354 DIČ 2022013147
948 01 Korčáro IČ DPH BICR22913147
Bankové spojenie:
Tetra banka s. s.
I. č.: SK07 1100 0000 0020 2484 7137
SWIFT-Code: TATRSK1

Selvi 007

Predmet: Re: Akcia Kalinkovo
Od: MAX GARDEN <maxgarden.ds@gmail.com>
Dátum: 3. 8. 2022, 17:21
Pre: EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. - verejné obstarávanie <info@europrojekt-ds-vo.sk>

Dobrý deň.

V prílohe posielam ponuku. Všetky ceny sú s DPH.

Dňa 03.08.2022 o 9:53 EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o. - verejné obstarávanie napísal(a):

ezeket szintén szeretném beáraztatni:

Súpis drevín:

Acer campestre Elsrijk 12/14 cm	ks	1,000
Prunus frubcosa Globosa 12/14 cm	ks	10,000
Sorbus aria Magnifica 12/14 cm	ks	5,000
Pinus parviflora Negishi 125/150 cm	ks	1,000
Pinus mugo Pumilio 15/20 cm	ks	10,000
Prunus laurocerasus Rotundifolia 40/60 cm	ks	27,000
Prunus laurocerasus Otto Luyken 20/30 cm	ks	50,000
Pachysandra terminalis Co 7 cm	ks	27,000
Lonicera pileata 15/20 cm	ks	86,000
Euonymus fortunei Emerald Gold 15/20 cm	ks	54,000
Spiraea japonica Goldflame 15/20 cm	ks	24,000
Spiraea japonica little Princess 15/20 cm	ks	24,000
Carex testacea Prairie Fire Co 1l	ks	23,000
Carex testacea orange Sedge Co 1l	ks	17,000
Uncinia rubra Co 1l	ks	17,000
Echinacea purpurea Co 1l	ks	13,000
Salvia nemorosa Co 1l	ks	13,000
Hemerocallis Co 1l	ks	13,000
Gaura lindheimeri Co 1l	ks	13,000
Asrer dumosus Jenny Co 1l	ks	13,000
Gypsophila paniculata Co 1l	ks	13,000
Thymus praecox Co 7 cm	ks	19,000
Geranium sanguineum Co 7 cm	ks	19,000
Origanum vulgare Aureum Co 7 cm	ks	19,000

--
S pozdravom
EUROPROJEKTDS-PLUS s.r.o.
Mgr. Méhesová Katarína
+421 907 727 177
Kračanská cesta 690/23
929 01 Dunajská Streda
IČO: 50781570

Bez virů. www.avast.com

MAX GARDEN
ZÁHRADNÉ CENTRUM

Radoslav Kochan
kancelár firmy

☎ +421 905 441 147
✉ maxgarden.ds@gmail.com
🌐 www.maxgarden.sk
📍 Dunajský Kláštor 241, 930 21

S pozdravom

Prílohy:

CP Europrojekt DS august 2022.xls

maxgarden_ds.vcf

14,0 kB

71 bajtov



			Jednotková cena	Spolu
Mulčovací kôra s dopravou	ks	73		6,2
Koly ku stromom, dĺžka 2-3m	ks	48	4,9	235,2
Polkoly	ks	16	3,5	56
Úväzový materiál ku stromom	ks	16	1	16
bm/strom v dlažbe	bm	12	0,41	4,92
Pôdny substrát - výmena pôdy ku stromom	t	4	22,5	90
Trávne semeno	kg	32	7	224
Štrk triedený 16/22 mm s dopravou	m3	2,2		0
Štrk triedený 16/22 mm big bag na strechu objektu	m3	4,5		0
Drt 16/32 mm	m3	0,8		0
Dreviny				0
Solitérny lomový kameň 8 ks s dopravou				0
Ekobrim bez klincov	bm	170	1,95	331,5
Extenzívny strešný substrát s dopravou	m3	76	165	12540
Drenážna ochranná fólia ND 4+1h	m2	750		0
Mulčovací textília	m2	140	0,4	56
Skalničkové rezky, trsy	kg	95		0

RASTLINY

Acer campestre Elsrjik 12/14 cm	ks	1	195	195
Prunus fruticosa Globosa 10/12 cm	ks	10	104	1040
Sorbus aria Magnifica 12/14 cm	ks	5	225	1125
Pinus parviflora Negishi	ks	1	140	140
Pinus mugo Pumilio 15/20 cm	ks	10	6,5	65
Prunus laurocerasus Rotundifolia 40/60 cm	ks	27	12,5	337,5
Prunus laurocerasus Otto Luyken 30/40 cm	ks	50	11	550
Pachysandra terminalis	ks	27	2,7	72,9
Lonicera pileata 15/20 cm	ks	86	2,1	180,6
Euonymus fortunei Emerald Gold 15/20 cm	ks	54	2,25	121,5
Spiraea japonica Goldflame 15/20 cm	ks	24	3,5	84
Spiraea japonica little Princess 15/20 cm	ks	24	3,5	84
Carex testacea Praire Fire Co II	ks	23	8,9	204,7
Carex testacea orange Sedge Co II	ks	17	8,9	151,3
Uncinia rubra Co II	ks	17	8,9	151,3
Echinacea purpurea Co II	ks	13	7,3	94,9
Salvia nemorosa Co II	ks	13	4,9	63,7
Hemerocalis Co II	ks	13	4,9	63,7
Gaura lindheimeri Co II	ks	13	4,9	63,7
Asrer dumosus Jenny Co II	ks	13	4,9	63,7
Gypsophila paniculata Co II	ks	13	4,9	63,7
Thymus praecox	ks	19	3,9	74,1
Geranium sanguineum	ks	19	3,9	74,1
Origanum vulgare Aureum	ks	19	3,9	74,1

RASTLINY SPOLU

5138,5

cena pozľave

4110,80 s DPH



Obec Kalinkovo 211, 900 43 Kalinkovo, tel.: 02 / 45989 206, 02 / 45989 107

Príloha č. 3

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET ZMLUVY

v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ako uchádzač týmto 'uvádzam zoznam subdodávateľov k predmetu zákazky: „Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba Základnej školy Kalinkovo”

Por. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo)	IČO alebo dátum narodenia ak nebolo pridelené identifikačné	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, pobytu, dátum narodenia)	Splnenie požiadavky podľa bodu 23.1 súťažných podkladov (odkaz na nápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo preukázanie iným spôsobom)	Register partnerov verejného sektora vložka číslo	Podiel na zákazke %	Predmet subdodávok
1.	ML-Lock s.r.o. Veľká Lúč 160 93003 Lúč na Ostrove	47515228	Ladislav Mészáros, konateľ Veľká Lúč 149, 93003 Lúč na Ostrove 16.07.1981	Registračné číslo: 2019/4-PO-F190	25927	10,35%	Elektro-inštalčné práce
2.	Ervin Mészáros TZB PROFI Veľká Lúč 381 93003 Lúč na Ostrove	30724503	Ervin Mészáros Veľká Lúč 137, 93003 Lúč na Ostrove 25.05.1968	Registračné číslo: 2019/5-FO-F498	24056	6,29%	Plyno-inštalácia, kanalizácia Zdravo-technika
3.	Zaluman s.r.o. Križna 1273/2 92901 Dunajská Streda	51043530	Norbert Süke, Lidér tejed 305, 929 01 Povoda, 23.09.1986	Registračné číslo: 2021/5-PO-F6587	28128	5,73%	Zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

4.	PROIMPEX s.r.o. č.1107 925 81 Diakovce	36360376	Attila Takács, č.676, 925 91 Kráľová nad Váhom 12.07.1977	Preukázanie na základe par32odsek1	34184	10,16%	Zváračské práce
5.	Comdet s.r.o. Strojárska 8800/1B, 917 02 Tmava	36280402	Erich Malán, Jozefa Strečanského 1232/39 919 51 Špačince 6.3.1973	Preukázanie na základe par.32odsek1	35659	8,07%	Zatepl'ovacie práce
6.	Schindler výt'ahy a eseskalátory, a.s. Karadžičova 8 821 08 Bratislava	31402828	Ing.Branislav Baláž – predseda predstavenstva Nová 6697/14 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou 24.03.1967	Registračné číslo: 2020/8- PO-F4316	10366	1,66%	výt'ah
7.	COM-KLIMA s.r.o. Ul. Á. Jedlika 4554 945 01 Komárno	35936495	Ing.Tomáš Hodúr, štatutárny orgán, Prowazekova 2, 945 01 Komárno 21.02.1974	Registračné číslo: 2021/5- PO-F6416	5486	6,21%	vzduchotechnika
8.	DELPHY, s.r.o. Lieskovská cesta 472 960 01 Zvolen	45438641	Mgr.Ján Firkál', konečný užívateľ výhod Stromová 9A/13587, 831 01 Bratislava – mestská časť Bratislava 5.12.1979	Registračné číslo: 2022/7- PO-F9780	25182	3,56%	Lepenie povlakových podláh

V Dunajskej Strede, 7.11.2022

Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:

EUROPROJEKTS-PLUS S.R.O.
Kračanská cesta 120/23, 92001 Dunajská Streda
Slovenská republika
IČO: 50781570 DIČ: 2120487886
IČ DPH: SK2120487886

Podpis a odtlačok pečiatky
