

## DODATOK Č. 7

### K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Zmluvné strany** :

**Objednávateľ** :

**Obchodné meno:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ** :

**Obchodné meno:** Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Realizačný závod: Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č. 581/B

zastúpený v zmysle podpisového poriadku spoločnosti Doprastav, a.s.:

Ing. Martin Beniač, PhD., riaditeľ závodu Žilina na základe  
plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2115

Ing. Jozef Tomčík, zástupca riaditeľa závodu Žilina na základe  
plnomocenstva reg. zn. 2022/01/2125

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Martin Beniač, PhD.

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Jozef Tomčík

stavbyvedúci: Ing. Slavomír Mečár, vedúci VS4

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK92 1100 0000 0026 4002 0009

IČO: 31 333 320

DIČ: 2020372497

IČ DPH: SK7120000206

telefón: +421 907 711 391

e-mail: [slavomir.mecar@doprastav.sk](mailto:slavomir.mecar@doprastav.sk)

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

## Preambula

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) po vzájomnej dohode v zmysle Čl. III, bod 1 a Čl. IV, bod 2. ZOD a Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0169491, 0169496 a 0169497, dopĺňajú a upravujú ZOD č. Objednávateľa 47/4/2021, č. zhotoviteľa Z1/2021/073/03 zo dňa 13.7.2021 vrátane Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 (ďalej len „Zmluva“) týmto Dodatkom č. 7 (ďalej ako „Dodatok“) nasledovne:

### Článok I. Predmet Dodatku

1. Článok IV. Čas plnenia – dopĺňa sa o bod 9. nasledovne:

„9. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu nutného prerušenia prác pri realizácii stavebného objektu D103 Chodníky v dôsledku riešenia nebezpečnej situácie na 3.dilatačnom celku autorským dozorom a v dôsledku spracovania zmeny PD D103, prílohu č. 1 – Harmonogram prác nahrádza Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 5.6.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.“

### Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy neupravené Dodatkom č. 7 ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 7 spolu s Dodatkom č. 1, Dodatkom č. 2, Dodatkom č. 3, Dodatkom č. 4, Dodatkom č. 5 a Dodatkom č. 6 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. Objednávateľa 47/4/2021, č. Zhotoviteľa Z1/2021/043/03 zo dňa 13.7.2021.
3. Obsah Dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol Zmluvnými stranami podpísaný.
4. Dodatok podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jeho zverejnení.
5. Dodatok sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Dodatok je uzavretý za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnými súčasťami tohoto Dodatku sú:

**Príloha č. 1** - Aktualizovaný harmonogram prác zo dňa 5.6.2023

**Príloha č. 2** - Kópia Zápisu zo stavebného denníka, listy č. 0169491, 0169496 a 0169497

[Podpisy Zmluvných strán]

V Trenčíne, dňa 14.6.2023


Za objednávateľa:



**Ing. Radovan Karkuš**  
riaditeľ  
Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja

V Žiline, dňa 14.6.23

Za zhotoviteľa:



**Ing. Martin Beniač, PhD.**  
riaditeľ závodu Žilina  
v súlade s podpisovým poriadkom  
Doprastav, a.s.



**Ing. Jozef Tomčík**  
zástupca riaditeľa závodu Žilina  
v súlade s podpisovým poriadkom  
Doprastav, a.s.




Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany

Harmonogram prác

Doprastav,a.s.

identifikácia	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Predchodca
1	<b>Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery - Brezany</b>	580 dni	Št 4.11.21	Str 7.6.23	
2	Dátum začatia prác	1 deň	Št 4.11.21	Pi 5.11.21	
3	Vytýčenie inžinierskych sietí, osadenie DDZ	1 deň	Po 8.11.21	Ut 9.11.21 2SS	
4	<b>D001 – Dočasná obchádzková komunikácia</b>	218 dni	Ne 18.9.22	Po 24.4.23	
5	zriadenie	25 dni	Ne 18.9.22	Št 13.10.22 43FF+14 dr	
6	odstránenie	10 dni	Pi 14.4.23	Po 24.4.23 30	
7	<b>D101 – Cesta I/64</b>	199 dni	Št 13.10.22	Ne 30.4.23	
8	búracie práce a frézovanie	30 dni	Št 13.10.22	So 12.11.22 5	
9	konštrukčné vrstvy	30 dni	Pi 31.3.23	Ne 30.4.23 28	
10	<b>D102 – Cesta III/1799</b>	184 dni	Št 13.10.22	So 15.4.23	
11	búracie práce a frézovanie	30 dni	Št 13.10.22	So 12.11.22 5	
12	konštrukčné vrstvy	30 dni	Št 16.3.23	So 15.4.23 27	
13	<b>D103 – Chodníky</b>	45 dni	Ne 23.4.23	Str 7.6.23	
14	rekonštrukcia oporného múru	14 dni	Po 24.4.23	Po 8.5.23 6	
15	prerušenie prác z dôvodu riešenia nebezpečnej situácie na 3.dilatačnom celku autorským dozorom	18 dni	Po 8.5.23	Pi 26.5.23 14	
16	chodníky	45 dni	Ne 23.4.23	Str 7.6.23 15FS-33 dn	
17	<b>D104 – Preloženie ihriska a oplotenia pri Športmotekli Raketa</b>	545 dni	Ut 9.11.21	Po 8.5.23	
18	realizácia ihriska	14 dni	Po 24.4.23	Po 8.5.23 6	
19	búranie ihriska	10 dni	Ut 9.11.21	Pi 19.11.21 3	
20	prerušenie prác 19.11.2021-19.4.2022	151 dni	Pi 19.11.21	Ut 19.4.22 19	
21	<b>D201 – Rekonštrukcia a rozšírenie mosta ponad rieku Nitra</b>	183 dni	Št 13.10.22	Pi 14.4.23	
22	búracie a výkopové práce	20 dni	Št 13.10.22	Str 2.11.22 5;43	
23	založenie mosta- mikropilóty	20 dni	Str 2.11.22	Ut 22.11.22 22	
24	spodná stavba	30 dni	So 12.11.22	Po 12.12.22 23SS+10 dr	
25	prerušovanie prác v období 16.12.2022 - 28.2.2023	45 dni	Pi 16.12.22	Po 30.1.23	
26	prerušovanie prác v období 1.3.2023 - 1.4.2023	17 dni	Po 30.1.23	Št 16.2.23 25	
27	nosná konštrukcia mosta	27 dni	Pi 17.2.23	Št 16.3.23 26FS+1 deň	
28	realizácia ríms a izolácie	15 dni	Št 16.3.23	Pi 31.3.23 27	
29	vrstvy vozovky	2 dni	Pi 31.3.23	Ne 2.4.23 28	
30	zábradlie a zvodidlá	12 dni	Ne 2.4.23	Pi 14.4.23 29	
31	<b>D301 – Úprava rieky Nitra</b>	232 dni	Ne 18.9.22	Po 8.5.23	
32	odkopy	10 dni	Ne 18.9.22	Str 28.9.22 5SS	
33	realizácia kamenného opevnenia	14 dni	Po 24.4.23	Po 8.5.23 6	
34	D601 – Prekládka káblov Slovak Telekom	12 dni	Ut 19.4.22	Ne 1.5.22 20	
35	D602 – Nasvetlenie priechodu pre chodcov	12 dni	Pi 26.5.23	Str 7.6.23 16FF	
36	<b>D701 – Prekládka STL plynovodu SPP-d</b>	163 dni	Ut 19.4.22	Št 29.9.22 20	
37	realizácia premostenia	10 dni	Ut 19.4.22	Pi 29.4.22 20	
38	dopad zistenia plynovej prípojky k Športmotelu Raketa v trase dočasnej obchádzk.komunikácie D001 - spracovanie zmeny PD D701, spracovanie a odsúhlasenie rozpočtu odstránenia prípojky	65 dni	Pi 29.4.22	Ne 3.7.22 37	
39	prekládka plynovodu	15 dni	Ne 3.7.22	Po 18.7.22 38	
40	odstránenie plynovej prípojky k Športmotelu Raketa	10 dni	Po 18.7.22	Št 28.7.22 39	
41	administratívne úkony ku kolaudácii, overenie geometrických plánov, dohody o vecných bremenách	28 dni	Št 28.7.22	Št 25.8.22 40	
42	povolenie predčasného užívania preložky STL plynovodu	32 dni	Št 25.8.22	Po 26.9.22 41	
43	ostrý prepoj	3 dni	Po 26.9.22	Št 29.9.22 42	

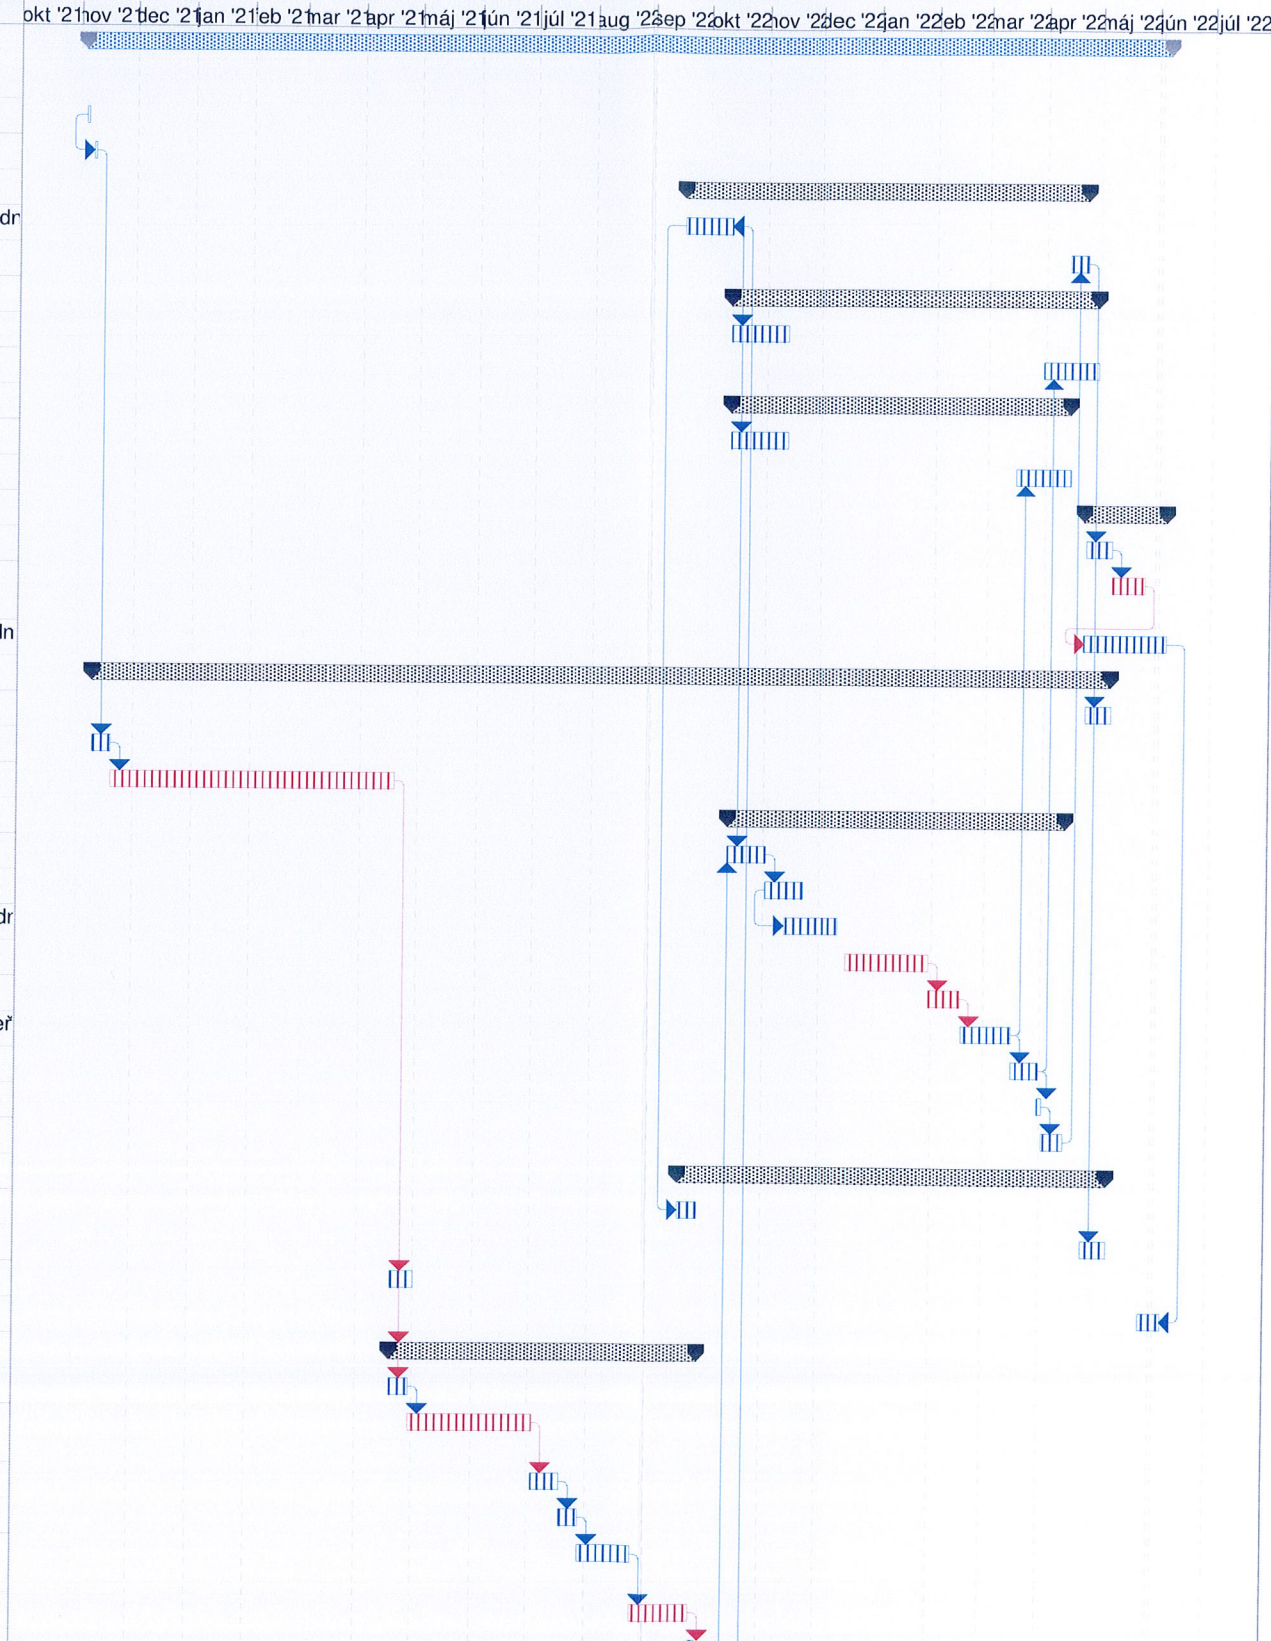

Projekt: Nedožery-Brezany Datum: 5.6.2023	Úkol		Souhrn projektu		Neaktivný súhrn		Manuálny súhrn		Externý medzník
	Rozdelení		Vnější úkoly		Manuálna úloha		Iba začiatok		Prúbeh
	Milník		Vnější milník		Iba trvanie		Iba dokončiť		Konečný termín
	Souhrnný		Neaktivný medzník		Manuálny súhrn		Externé úlohy		
