

ZMLUVA O DIELO č. 21/2011/08411/S/O

585/6131/2011

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
na uskutočnenie stavebných prác

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC – IVSC Bratislava

čl.1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

: Slovenská správa ciest

Sídlo : : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Sídlo : : Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.decembra 1995, úplné znenie pod 316/M-2005 zo dňa 14.februára 2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.mája 2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : **Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.** , generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava

so sídlom : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

IČO : 00 33 28

DIČ : 2021067785

IČ DPH : nie je platcom DPH

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č.ú.7000135433/8180
č.ú.7000183259/8180

Telefón : 02/50255389

Fax : 02/55567895

e-mail : viliam.zak@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať :

- vo veciach zmluvných : Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava

- vo veciach technických a realizačných : Ing. František Takáč, námestník úseku správy a prevádzky ciest

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ

: SKUPINA DODÁVATEĽOV
CESTY NITRA, a.s. – hlavný partner
a **Inžinierske stavby, a.s.** - partner

Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra

Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

Štatutárny orgán : predstavenstvo
Francis Grass, predseda predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva a generálny riaditeľ
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
na základe PLNOMOCENSTVA
Alain Jeziorny, člen predstavenstva

IČO : 34 128 344

DIČ : 202 0410 788

IČ DPH : SK 202 0410 788

Bankové spojenie : CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Námestie 1. Mája 18,
811 08 Bratislava

číslo účtu : 102052207/8020

Telefón : 037 6920 500

Fax : 037 6920 517

e-mail : headoffice@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Juraj Serva – obchodno-technický námestník
- vo veciach technických a realizačných : Marián Jamrich – vedúci strediska Nitra
- stavbyvedúci : František Finda-vedúci stavby,
Štefan Peterka-zástupca vedúceho stavby, Ing. Juraj Marko

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v úplnom znení. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác:

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Bratislava

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie.

2.1.2 **Miesto plnenia:** úseky ciest I. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji a Trnavskom samosprávnom kraji.

2.1.3 I/2 Holič - intravilán

2.1.4 I/51 Nitra - Levická

2.1.5 I/51 Nitra – Zoborská - Chrenovská

2.1.6 I/51 hranica okresu Nitra – Levica - Rohožnica

2.1.7 I/75 Križovatka Maláš – Tekovské Lužany

2.2. **Čas plnenia:**

2.2.1 Začatie realizácie diela dňom odovzdania staveniska

2.2.2 Dokončenie realizácie diela 2 mesiace od začatia realizácie diela

2.2.3 Odovzdanie staveniska zhotoviteľovi do 10 dní od podpísania ZoD oboma stranami

2.3. **Cena diela:**

2.3.1 Cena diela je stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Cena diela je stanovená podľa zameraných množstiev pre celú časť č. 1 na základe pevných jednotkových cien a predstavuje:

Zmluvná cena (bez DPH) v € : 819 110,95
DPH 20 % v € : 163 822,19

Zmluvná cena diela (časť č. 1) celkom s DPH v € : 982 933,14


Slovom:deväťstoosemdesiatdvatisícdeväťstotridsaťtri eur a štrnásť centov

Špecifikácia ceny (tab. „Cena prác“) tvorí prílohu č.1 k tejto Zmluve o dielo.

- 2.3.3 Platby zhotoviteľovi budú realizované v mene euro. Splatnosť faktúr je do 60 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava.
- 2.3.4 Cena zrealizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia diela - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.
- 2.3.5 Cena sa bude upravovať spôsobom uvedeným v čl. 43 a 45 Zmluvných podmienok.
- 2.3.6 Objednávateľ zabezpečí financovanie stavby podľa výšky pridelených finančných prostriedkov a zhotoviteľ zrealizuje práce podľa časového programu prác predloženého zhotoviteľom a odsúhlaseného objednávateľom.

čl.3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny v poverených osobách si budú písomne oznamovať do 5 dní.
- 3.2. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné dokumenty uvedené v poradí záväznosti :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Zmluvné údaje
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - f) Opis predmetu zákazky
 - g) Cenová ponuka zhotoviteľa
 - h) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo ako aj odstrániť všetky nedostatky diela v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a to v čase a spôsobe uvedeným v zmluve.
- 3.4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané práce dohodnutú cenu v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo v čase a spôsobom uvedeným v zmluve.
- 3.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.6. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.2 - Zoznam podzhotoviteľov pri realizácii stavebných prác, príloha č.3 – Certifikát kvality stavebných prác podľa normy ISO 9001.
- 3.7. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať všetky všeobecné záväzné právne predpisy Slovenskej republiky týkajúce sa predmetu zmluvy. V opačnom prípade sa to považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka

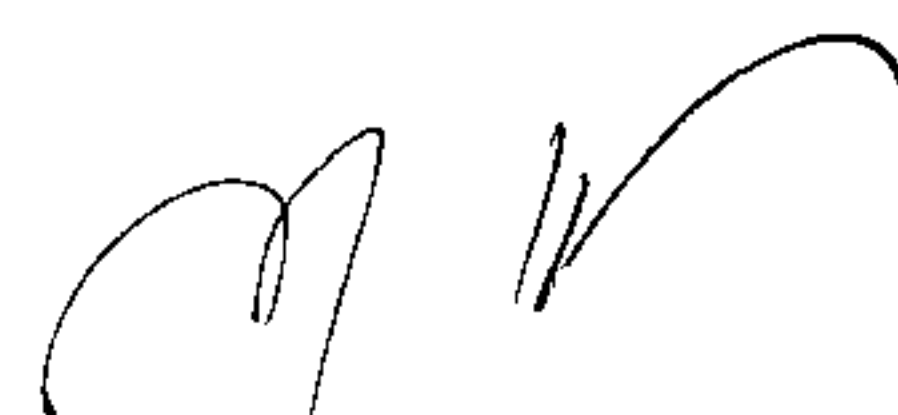


čl.4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Zhotoviteľ udeľuje súhlas so zverejnením zmluvy na webovej stránke objednávateľa.
- 4.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 4.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po tri výtlačky.
- 4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Osoby konajúce v mene štatutárneho orgánu zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.
- 4.5 Ak zhotoviteľ presne zadefinuje predmet obchodného tajomstva a nebude to odporovať ustanoveniam Obchodného zákonníka, zákona o slobodnom prístupe k informáciám a zákona č. 546/2010 Z.z., objednávateľ bude akceptovať oprávnenie zhotoviteľa chrániť určité údaje ako obchodné tajomstvo.

23. 06. 2011

Dátum:


Za objednávateľa:

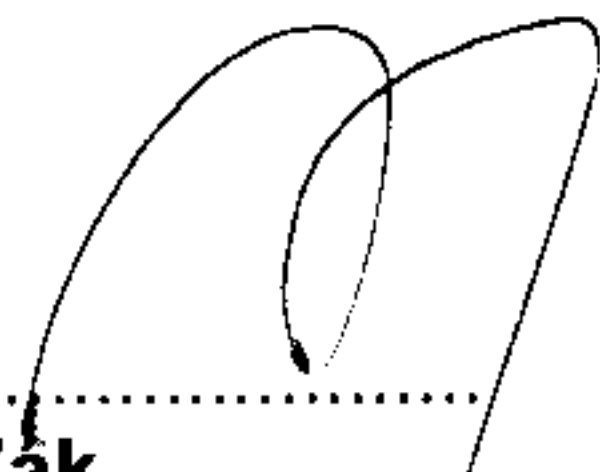

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC, IVSC Bratislava


13. 05. 2011

Dátum:

Za zhotoviteľa:


.....
Francis Grass
predseda predstavenstva
CESTY NITRA, a.s.

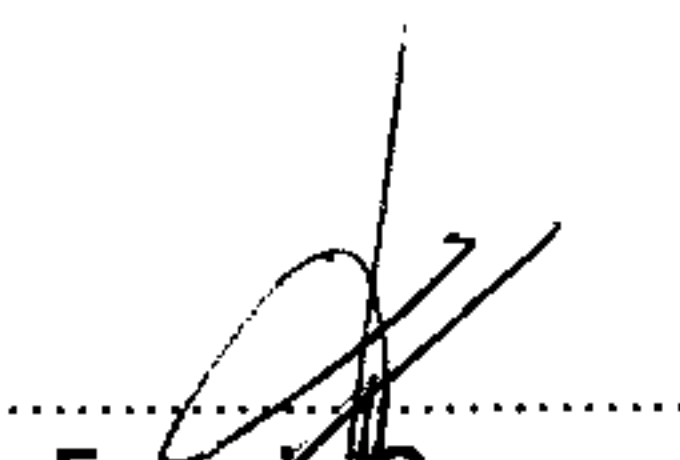
.....
Francis Grass
člen predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.


.....
Alain Jeziorny
člen predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.



REKAPITULÁCIA

Príloha č.1 k ZOD č. 21/2011/08411/S/O

Predmet zákazky:
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC

Časť č. 1 - IVSC Bratislava

Cena prác

P.č. úseku	Úseky	Cena bez DPH (Eur)	DPH 20% (Eur)	Cena spolu s DPH (Eur)
1	I/2 Holíč - intravilán - odstraňovanie bezpečnostných rizík	265 711,10	53 142,22	318 853,32
2	I/51 Nitra - Levická - odstraňovanie bezpečnostných rizík	200 002,93	40 000,59	240 003,52
3	I/51 Nitra - Zoborská - Chrenovská - odstraňovanie bezpečnostných rizík	125 043,10	25 008,62	150 051,72
4	I/51 hr. okr. NR-LV-Rohožnica - odstraňovanie bezpečnostných rizík	154 763,45	30 952,69	185 716,14
5	I/75 križ.Maláš - Tek.Lužany - odstraňovanie bezpečnostných rizík	73 590,37	14 718,07	88 308,44
Cena celkom (Eur):		819 110,95	163 822,19	982 933,14

Dátum: 13. 05. 2011



.....
podpis, pečiatka

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-

13. 05. 2011



Predmet zákazky:
Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC

Časť č. 1

Cena prác

Úsek: I/2 Holič intravilán, odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek)						
por.č. položky	Popis položky	merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Počet merných jednotiek	Cena spolu v € DPH	bez
1.	zarezanie živíč. krytu	bm	1,94	24,00		46,56
2.	odfrézovanie krytu hr. 100 mm	m2		0,00		
3.	detto hr. 50 mm vrátane odvozu do 10 km	m2	1,08	24 000,00		25 920,00
4.	spojovací postrek	m2	0,39	24 000,00		9 360,00
5.	položenie krytu AC0 11-I s PMB 50 45/80 - 75 hr. 60 mm	m2		0,00		
6.	detto hr. 50 mm	m2	8,02	24 000,00		192 480,00
7.	pružná asfaltová zálievka š. 30 mm	bm	5,39	24,00		129,36
8.	vyrovnanie nerovnosti ACp 16 - I	ks		0,00		
9.	výšková úprava kan.vpusti a poklopov, uzáverov	ks	71,41	141,00		10 068,81
10.	dočasné dopravné značenie	ks	1 231,43	1,00		1 231,43
11.	dodanie a osadenie informačnej tabule	ks	344,94	1,00		344,94
12.	výstužná geomreža 100/100 kN	m2	4,02	6 500,00		26 130,00
Cena celkom bez DPH (v €) :					265 711,10	
DPH (20 %) (v €) :					53 142,22	
Cena spolu s DPH (v €) :					318 853,32	

CESTY NITRA, a.s.
 Murgašova 6, 949 78 Nitra
 generálne riaditeľstvo
 IČO: 34 128 344
 17.

13. 05. 2011

Predmet zákazky:
ve SSC

Časť č. 1

Cena prác

Úsek: I/51 Nitra - Levická, odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek)

por.č. položky	Popis položky	merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Počet merných jednotiek	Cena spolu v € DPH	bez
1.	zarezanie živíc krytu	bm	1,94	18,00		34,92
2.	odfrézovanie krytu hr. 100 mm	m2		0,00		
3.	detto hr. 50 mm vrátane odvozu do 10 km	m2	1,08	12 600,00		13 608,00
4.	spojovací postrek	m2	0,39	12 600,00		4 914,00
5.	položenie krytu ACO 11 -I a PMB 50 45/80 -75 hr. 60 mm	m2		0,00		
6.	detto hr. 50 mm	m2	6,81	12 600,00		85 806,00
7.	pružná asfaltová zálievka š. 30 mm	bm	5,39	18,00		97,02
8.	výšková úprava kan.vpusti a pokloпов, uzáverov	ks	69,53	1,00		69,53
9.	BBTM 8-I hr. 30 mm	m2	4,30	12 600,00		54 180,00
10.	dočasné dopravné značenie	ks	748,52	1,00		748,52
11.	dodanie a osadenie informačnej tabule	ks	344,94	1,00		344,94
12.	výstužná geomreža 100/100 kN	m2	4,02	10 000,00		40 200,00
Cena celkom bez DPH (v €) :					200 002,93	
DPH (20 %) (v €) :					40 000,59	
Cena spolu s DPH (v €) :					240 003,52	

CESTY NITRA, s.r.o.
Murgašova 6, 949 73 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
47.

13. 05. 2011

Predmet zákazky:

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC

Časť č. 1

Cena prác

Úsek: I/51 Nitra - Zoborská - Chrenovská, odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek)					
por.č. položky	Popis položky	merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Počet merných jednotiek	Cena spolu v € bez DPH
1.	zarezanie živič.krytu	bm	1,94	60,00	116,40
2.	odfrézovanie krytu hr. 100 mm	m2	0,00	0,00	
3.	detto hr. 50 mm vrátane odvozu do 10 km	m2	1,08	7 500,00	8 100,00
4.	spojovací postrek	m2	0,39	7 500,00	2 925,00
5.	položenie krytu AC0 11 - I a PMB 50 45/80 -75 hr. 60 mm	m2	0,00		
6.	detto hr. 50 mm	m2	6,80	7 500,00	51 000,00
7.	pružná asfaltová zálievka š. 30 mm	bm	5,39	60,00	323,40
8.	výšková úprava kan.vpusti a poklopov, uzáverov	ks	69,45	16,00	1 111,20
9.	BBTM 8-l hr. 30 mm	m2	4,29	7 500,00	32 175,00
10.	dočasné dopravné značenie	ks	807,16	1,00	807,16
11.	dodanie a osadenie informačnej tabule	ks	344,94	1,00	344,94
12.	výstužná geomreža 100/100 kN	m2	4,02	7 000,00	28 140,00
Cena celkom bez DPH (v €) :					125 043,10
DPH (20 %) (v €) :					25 008,62
Cena spolu s DPH (v €) :					150 051,72

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
ICO: 34 128 344
17.

13. 05. 2011

Predmet zákazky:

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC**Časť č. 1**

Cena prác

Úsek: I/51 hr. okr. LV-NR-Rohožnice, odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek)						
por.č. položky	Popis položky	merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Počet merných jednotiek	Cena spolu v € DPH	bez
1.	zarezanie živíč. krytu	bm	1,94	30,80		59,75
2.	odfrézovanie krytu hr. 50 mm	m2	0,79	154,00		121,66
3.	detto hr. 30 mm vrátane odvozu do 10 km	m2	0,98	12 274,00		12 028,52
4.	spojovací postrek	m2	0,39	19 177,00		7 479,03
5.	položenie krytu AC0 11 -I a PMB 50 45/80 -75 hr. 60 mm	m2		0,00		
6.	detto hr. 50 mm	m2	6,97	19 177,00		133 663,69
7.	pružná asfaltová zálievka š. 30 mm	bm		0,00		
8.	výšková úprava kan.vpusti a pokloпов, uzáverov	ks		0,00		
9.	BBTM 8-I hr. 30 mm	m2		0,00		
10.	dočasné dopravné značenie	ks	1 065,86	1,00		1 065,86
11.	dodanie a osadenie informačnej tabule	ks	344,94	1,00		344,94
12.	výstužná geomreža 100/100 kN	m2		0,00		
Cena celkom bez DPH (v €) :					154 763,45	
DPH (20 %) (v €) :					30 952,69	
Cena spolu s DPH (v €) :					185 716,14	

CESKY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
ICO: 31 128 344
17.

13. 05. 2011

Predmet zákazky:

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC

Časť č. 1

Cena prác

Úsek: I/75 Maláš - Tek. Lužany, odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek)						
por.č. položky	Popis položky	merná jednotka	Jednotková cena v € bez DPH	Počet merných jednotiek	Cena spolu v € DPH	bez
1.	zarezanie živič.krytu	bm	1,94	14,40		27,94
2.	odfrézovanie krytu hr. 100 mm	m2		0,00		
3.	detto hr. 30 mm vrátane odvozu do 10 km	m2	0,98	150,00		147,00
4.	spojovací postrek	m2	0,39	8 640,00		3 369,60
5.	položenie krytu AC0 11 -I a PMB 50 45/80 -75 hr. 60 mm	m2		0,00		
6.	detto hr. 50 mm	m2	7,18	8 640,00		62 035,20
7.	pružná asfaltová zálievka š. 30 mm	bm	5,39	14,40		77,62
8.	vyrovnanie nerovností Acp 16-I	t	132,01	40,00		5 280,40
9.	výšková úprava kan.vpusti a pokloпов, uzáverov	ks		0,00		
10.	dočasné dopravné značenie	ks	659,48	1,00		659,48
11.	dodanie a osadenie informačnej tabule	ks	344,94	1,00		344,94
12.	výstužná geomreža 100/100 kN	m2	4,02	410,00		1 648,20
Cena celkom bez DPH (v €) :					73 590,37	
DPH (20 %) (v €) :					14 718,07	
Cena spolu s DPH (v €) :					88 308,44	

CESTY NITRA, a.s.
Murgášova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-

13. 05. 2011

Zoznam podzhotoviteľov pri uskutočnení stavebných prác

**Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy
v správe SSC - IVSC Bratislava**


Na predmetnú časť nebudeme využívať pri uskutočnení stavebných prác žiadneho podzhotoviteľa.

Dátum: 23. 06. 2011

Dátum: 13. 05. 2011


Za objednávateľa:

SLUŽBY
.....
.....
.....
.....

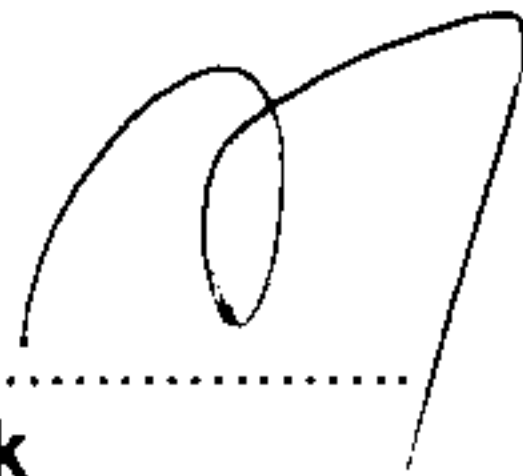

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC, IVSC Bratislava

Za zhotoviteľa:



.....
Francis Grass
predseda predstavenstva
CESTY NITRA, a.s.



.....
Francis Grass
člen predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.



.....
Alain Jeziorny
člen predstavenstva
Inžinierske stavby, a.s.



Stavebné práce:

Časť č. 1

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe IVSC Bratislava

Zmluvné údaje obsahujú špecifické údaje, na ktoré sa odvolávajú Zmluvné podmienky.

Dokumenty, ktoré tvoria zmluvu, je nutné chápať ako vzájomne sa doplňujúce a vysvetľujúce. Ak sa v zmluve neuvádza inak, **poradie záväznosti dokumentov** tvoriacich zmluvu je nasledovné:

- (1) Zmluva o dielo
- (2) Zmluvné údaje
- (3) Zmluvné podmienky zvláštne
- (4) Zmluvné podmienky všeobecné
- (5) Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
(Platné TKP SSC/MDPT SR sú uverejnené na stránke www.ssc.sk)
- (6) Opis predmetu zákazky
- (7) Cenová ponuka zhotoviteľa
- (8) Všetky ostatné dokumenty tvoriace Zmluvu o dielo

Objednávateľ (1.1) : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPaT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 7.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č.100 z mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Štatutárny orgán : Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PHD., generálny riaditeľ

Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Bratislava

so sídlom : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

IČO : 00 33 28

DIČ : 2021067785

Bankové spojenie : 7000135433/8180
7000183259/8180

Stavebný dozor (1.1): Slovenská správa ciest

Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava



Technický dozor objednávateľa (1.1)

meno:	tel. kontakt:	č. úseku:
p. Peter Maxián	0910803951	1.
asistent p. Miroslav Lamanec	0903650471	1.
p. Jozef Kubaščík	0903283847	2.
asistent Ing. Vladimír Žiak	0911897463	2.
p. Jozef Kubaščík	0903283847	3.
asistent Ing. Vladimír Žiak	0911897463	3.
p. Jozef Kubaščík	0903283847	4.
asistent Ing. Vladimír Žiak	0911897463	4.
Ing. Peter Pavlov	0903895905	5.

Adresa : Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Koordinátor BOZP (1.1): Ing. Štefan Marik

Jazyk (3.1) dokumentov tvoriacich zmluvu je **slovenský jazyk**.

Právne predpisy (3.1), ktoré sa vzťahujú na zmluvu, sú zákony a predpisy **Slovenskej republiky**.

Predpokladaný termín začatia prác (1.1) dňom odovzdania staveniska
Plánovaný termín ukončenia (1.1) 2 mesiace od začatia realizácie diela
Predpokladané odovzdanie staveniska (21.1) do 10 dní od podpísania ZoD oboma stranami

(21.1)

V prípade nepredvídaného nedostatku finančných prostriedkov na uskutočnenie stavebných prác si objednávateľ vyhradzuje právo upraviť termín ukončenia stavby, bez nároku zhotoviteľa uplatniť si náklady z titulu predĺženia.

Stavenisko (1.1) sa nachádza v TTSK v okr. Senica (úsek 1), v NT SK v okr. Nitra (úsek 2,3), okr. Nitra - Levice (úsek 4), okr. Levice (úsek 5).

Záručná doba (33.1) činí **60 mesiacov**. Záručná doba na nedostatky odstránené, prípadne reklamované v záručnej dobe je 60 mesiacov, plyní od termínu odstránenia nedostatku.

Doba na odstránenie nedostatkov (33.2) je **30 dní**. Pokiaľ klimatické podmienky nedovoľujú odstránenie reklamovaného nedostatku v stanovenej dobe, táto sa primerane predĺži a dohodne písomne medzi objednávateľom a zhotoviteľom.

Výška zmluvnej pokuty (33.9) za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je **1000,- Eur/deň**.

Minimálne poistné (12.1) zhotoviteľa proti poškodeniu, zničeniu majetku a proti usmrteniu a zraneniu je **166 000,- Eur**.

Pokuta (12.2) za nepredloženie poistných zmlúv **100,- Eur/deň**.

Mena (44.1) pre účely zmluvy - **Euro (EUR)**.

Úprava ceny (45.1) Jednotkové ceny uvedené v ponuke sú nemenné, pevné počas platnosti zmluvy. Môže sa upravovať len výkaz výmer a práce, ktoré objednávateľ požaduje navyše.

RÔZNE

Podiel zadržaných platieb (46.1) : 5%

Výška zmluvnej pokuty (47.1), (42.1) za omeškanie celého diela 1000,- Eur/deň

Prémia za predčasné ukončenie (48.1) celého diela : žiadna

Zálohové platby (49.1) Objednávateľ neposkytne preddavok.

Záruka na zákazku (50.1) sa nevyžaduje

Zhotoviteľ

Súhlasíme so všetkými podrobnosťami a jednotlivými článkami uvedenými v týchto Zmluvných údajoch:

Názov : Skupina dodávateľov
CESTY NITRA, a.s.
a Inžinierske stavby, a.s.

Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra

Právna forma : akciová spoločnosť
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa,
vložka č. 140/N

IČO : 34 128 344

Štatutárny orgán : predstavenstvo
zastúpené: Francis Grass, predseda predstavenstva
Alain Jeziorny, člen predstavenstva
Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva a generálny riaditeľ
riadne splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.
na základe PLNOMOCENSTVA

Dátum: 16.05. 2011

Podpis a pečiatka:

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-

B.2 ZMLUVNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNE

Obsah:

1. VYBAVENIE PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORA
2. PRACOVNÉ PORADY NA STAVBE
3. PODMIENKY DODÁVKY GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁČ
4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY PREVZATIA VYHRADENÝCH TECH. ZARIADENÍ
5. STAVEBNÝ DENNÍK
6. INFORMOVANIE O ČINNOSTIACH
7. ODSÚHLASENIE VYKONANÝCH PRÁČ
8. ZARIADENIE STAVENISKA
9. ZMENY VO VÝMERÁCH
10. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZHOTOVITEĽA
11. VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ
12. VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA
13. PREVÁDZKOVÉ PORIADKY
14. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY
15. NAHLASOVANIE PREDPOKLADOV ČERPANIA
16. POVODŇOVÉ PLÁNY
17. DSRS



1. VYBAVENIE PRE ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORA

- nevyžaduje sa

2. PRACOVNÉ PORADY NA STAVBE - nevyžadujú sa

3. PODMIENKY DODÁVKY GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC

- nevyžadujú sa

4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY PREVZATIA VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

- nevyžadujú sa

5. STAVEBNÝ DENNÍK

5.1 Zhotoviteľ je počas stavby povinný viesť stavebný denník (SD). V SD bude uvádzaná denná činnosť.

6. INFORMOVANIE O ČINNOSTIACH

6.1 Zhotoviteľ je povinný denne informovať stavebný dozor v dohodnutom čase o svojich činnostiach na stavenisku.

7. ODSÚHLASENIE VYKONANÝCH PRÁC

7.1 Zhotoviteľ môže požiadať o odsúhlasenie vykonaných prác na základe:

- súpisu vykonaných prác v SD podľa položiek v cene prác
- atestov zabudovaných materiálov
- výpočtu predkladaných objemov resp. plôch na základe geodetického zamerania

8. ZARIADENIE STAVENISKA - nevyžaduje sa

9. ZMENY VO VÝMERÁCH - neuplatňuje sa

10. DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY ZHOTOVITEĽA

10.1 Všetky dopravné prostriedky zhotoviteľa i podzhotoviteľov, používané na stavenisku, alebo pre dopravu osôb i materiálu na stavenisko alebo zo staveniska, musia byť označené tak, aby bola zrejmá ich príslušnosť ku stavenisku. Vyhotovenie tohto označenia určí po prerokovaní so zhotoviteľom objednávateľ. Na požiadanie objednávateľa (stavebného dozora) je zhotoviteľ povinný predložiť zoznam týchto dopravných prostriedkov vo forme a intervale určenom objednávateľom (stavebným dozorom). Objednávateľ a stavebný dozor môže takto neoznačené, či v zozname neuvedené vozidlá okamžite vylúčiť zo staveniska.

11. VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ - nevyžaduje sa

12. VYBÚRANÝ MATERIÁL A DREVNÁ HMOTA

12.1 Vybúraný použiteľný materiál a drevná hmota je majetkom objednávateľa. Určenie jeho ďalšieho použitia si vyhradzuje objednávateľ.

13. PREVÁDZKOVÉ PORIADKY - nevyžadujú sa

14. DOPRAVNÉ ZNAČENIE POČAS VÝSTAVBY

14.1 O povolenie uzávierok, resp. zvláštneho užívania ciest podľa zák. č. 135/1961Zb. o pozemných komunikáciach /cestný zákon/ v znení neskorších zmien a doplnení, požiadava počas výstavby zhotoviteľ.

14.2 Na koľko sa požadované práce budú vykonávať bez vylúčenia verejnej dopravy, zhotoviteľ zabezpečí prenosné dopravné značenie, ktorého náklad zahŕnie do jednotkových cien predložených v ponuke.

15. NAHLASOVANIE PREDPOKLADOV ČERPANIA - nevyžaduje sa

16. POVODŇOVÉ PLÁNY - nevyžadujú sa

17. DSRS - nevyžaduje sa

OBSAH

A. VŠEOBECNE

1. Definície
2. Výklad
3. Jazyk zmluvy a právne predpisy
4. Rozhodnutia stavebného dozora
5. Poverenie
6. Komunikácia
7. Poverenie k zhotoveniu iným subjektom
8. Iní zhotovitelia
9. Zamestnanci zhotoviteľa
10. Riziká zhotoviteľa
11. Riziká objednávateľa
12. Poistenie
13. Náhrady škôd a poplatky
14. Správy o prieskumoch staveniska
15. Dotazy týkajúce sa Zmluvných údajov
16. Spôsob vykonania prác zhotoviteľom
17. Ukončenie prác do plánovaného termínu
18. Schválenie pomocných prác
19. Bezpečnosť
20. Nálezy
21. Odovzdanie staveniska
22. Prístup na stavenisko
23. Príkazy
24. Spory

B. KONTROLA LEHOTY VÝSTAVBY

25. Program prác
26. Predĺženie plánovaného termínu ukončenia
27. Urýchlenie výstavby
28. Oneskorenie nariadené stavebným dozorom
29. Schôdzky vedenia stavby
30. Včasné upozornenie



C. KONTROLA KVALITY


- 31. Zisťovanie nedostatkov
- 32. Skúšky a kontroly
- 33. Odstránenie nedostatkov
- 34. Neodstránené nedostatky po ukončení výstavby

D. KONTROLA NÁKLADOV

- 35. Výkaz výmer
- 36. Zmeny vo výmerách
- 37. Zmeny
- 38. Úhrada zmien
- 39. Prognózy financovania
- 40. Faktúry
- 41. Platby
- 42. Prípady odškodnenia a poplatky
- 43. Daň
- 44. Meny
- 45. Úprava ceny
- 46. Zadržané platby
- 47. Zmluvné pokuty
- 48. Prémia
- 49. Zálohová platba a prípadná záruka
- 50. Záruka na zákazku a protokol o ukončení záručnej doby
- 51. Práca za časovú mzdu
- 52. Náklady na opravy

E. UKONČENIE ZMLUVY

- 53. Ukončenie prác
- 54. Prevzatie prác
- 55. Konečné faktúra
- 56. Odstúpenie od zmluvy
- 57. Platby pri odstúpení od zmluvy
- 58. Vlastníctvo
- 59. Zmarenie zmluvy
- 60. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

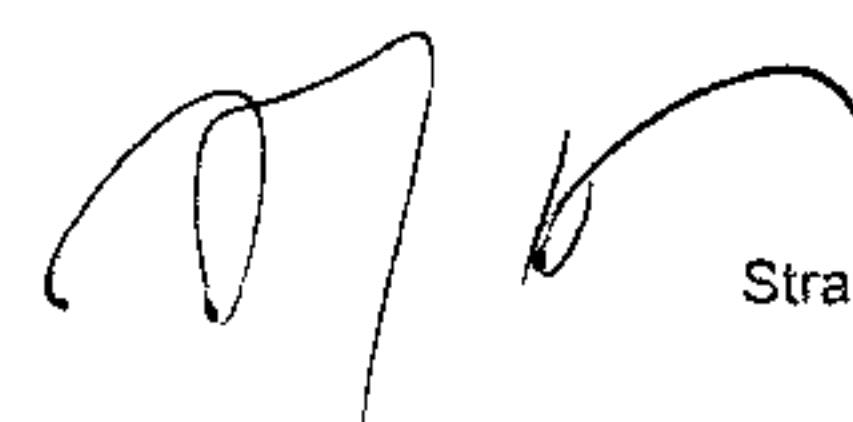

A. VŠEOBECNE

1. Definície

1.1 Pojmy

Nižšie uvedené pojmy a výrazy majú v zmluve význam podľa tu uvedeného výkladu:

Verejný obstarávateľ je právnická alebo fyzická osoba definovaná podľa osobitného predpisu (§6 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní).

Objednávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje zaplatiť cenu za vykonané dielo (§536 Obchodného zákonníka).

Zhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa v zmluve zaväzuje vykonať určité dielo (§536 Obchodného zák.), má oprávnenie na stavebné alebo montážne práce a zabezpečí výkon činnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou (§44 ods.1 stavebného zákona)

Podzhotoviteľ je právnická alebo fyzická osoba alebo jej právny nástupca, ktorá má zákonom určené oprávnenie k vykonávaniu činnosti vo výstavbe, resp. pri špeciálnych druhoch prác má oprávnenie k vykonávaniu vybraných činností (plyn, voda, VN, VVN a pod.) a je uvedená v zmluve (resp. odsúhlasená objednávateľom dodatočne) a je poverená zhotoviť časť diela.

Stavebný dozor je organizačná zložka objednávateľa, príp. právnická alebo fyzická osoba menovaná objednávateľom k vykonávaniu dozoru podľa zmluvy o dielo, ktorá zodpovedá za:

- dohliadanie na práce realizované zhotoviteľom,
- administratívne riadenie a kontrolu stavby,
- potvrdzovanie platieb zhotoviteľovi, na ktoré má tento nárok,
- schvaľovanie, oficiálne potvrdenie a ocenenie zmien a doplnkov k zmluve,
- priznanie predĺženia lehoty výstavby,
- ohodnotenie prípadov odškodnenia zhotoviteľa, ak časť týchto povinností (práv) objednávateľ neobmedzil v zmluve.

Technický dozor objednávateľa je fyzická osoba určená stavebným dozorom, je mu zodpovedná a je menovaná v Zmluvných údajoch.

Stavbyvedúci je fyzická osoba poverená zhotoviteľom vykonávaním vedenia stavby a je uvedená v zmluve.

Koordinátor BOZP je fyzická osoba poverená objednávateľom, uvedená v zmluve, ktorá zabezpečuje kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na stavenisku zo strany zhotoviteľa stavby v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.

Zmluva o dielo na uskutočnenie práce (ďalej len „zmluva“) je dvojstranný právny úkon, vykonaný písomne, ktorý má náležitosti požadované Obchodným zákonníkom. Ide o Zmluvné podmienky, Zmluvné údaje, TKP, Projektovú dokumentáciu pre ponuku, Nákladovú časť, Ponuku zhotoviteľa a ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť súčasťou zmluvy. Predmetom zmluvy je uskutočnenie prác alebo uskutočnenie prác a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto súčasťou uskutočnenia prác.

Zmluvné údaje vymedzujú dokumenty a ďalšie informácie, ktoré tvoria zmluvu.

Zvláštne zmluvné podmienky upresňujú zmluvné podmienky všeobecné a sú im nadradené.

Technicko kvalitatívne podmienky (TKP) predstavujú súhrn technických predpisov a požiadaviek objednávateľa na spôsob, zhotovenie, kontrolu a prevzatie vykonaných prác. Akákoľvek úprava týchto podmienok alebo dodatky vypracované podľa čl. 37 alebo spracované zhotoviteľom a odsúhlasené objednávateľom sa považuje za súčasť TKP platných na predmetnú stavbu.

Dokumentácia pre ponuku (DP) je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických a iných informácií slúžiacich k procesu obstarávania a uzavretiu zmluvy. Je súčasťou súťažných podkladov a slúži na vypracovanie ponúk na zhotovenie stavby.

Dokumentácia pre realizáciu stavby (DRS) je súhrn všetkých výkresov, výpočtov a technických informácií týkajúcich sa stavby a slúžiacich k vyhotoveniu stavby. Je súčasťou dokumentácie pre ponuku a slúži ako dokumentácia pre vykonanie prác.

Dokumentácia pre vykonanie prác (DVP) je súhrn všetkých výkresov a technických informácií slúžiacich na priame vykonávanie prác na stavenisku. Vypracováva sa len v nevyhnutných prípadoch na doriešenie detailov, ktoré nie sú v DRS a nemajú vplyv na cenu stavby. Zabezpečuje ju zhotoviteľ stavby.

Realizačná dokumentácia stavby je staršie označenie DVP. Pokiaľ je tento pojem použitý, rozumie sa ním DVP.

Dokumentácia skutočného realizovania stavby (DSRS) obsahuje súbor údajov, písomnosti a výkresov, ktoré dokumentujú ukončené dielo tak, ako bolo v skutočnosti realizované a určuje spôsob jeho užívania a údržby.

Zjednodušená dokumentácia stavby (ZDS) určuje zhotovenie práce postačujúcim spôsobom. Možno ju použiť ako dokumentáciu na realizáciu stavby.

Nákladová časť je úplný zoznam všetkých prác potrebných na zhotovenie stavby s uvedením ich množstva a cien, prípadne spôsobu určenia cien.

Ponuka je návrh uchádzača predložený verejnému obstarávateľovi. Obsahuje návrh zmluvy a ďalšie dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Prijatie ponuky je písomne prejavená vôľa verejného obstarávateľa uzavrieť zmluvu v znení ponuky zhotoviteľa.

Zmena je nariadenie objednávateľa (stavebného dozoru) alebo objednávateľom schválený návrh zhotoviteľa, ktorým sa mení technické riešenie, rozsah prác, technologické alebo pracovné postupy.

Deň začatia znamená deň určený pokynom objednávateľa začať práce v zmysle ustanovení čl. 17.1. Tento termín sa nemusí nutne zhodovať s niektorým z termínov odovzdania staveniska.

Lehota výstavby znamená lehotu pre zhotovenie diela a pre vydanie protokolu o odovzdaní a prevzatí VP alebo ktoréhokoľvek jeho úseku, objektu, časti, stanovenú v zmluve.

Plánovaný termín ukončenia je termín, určený pre zhotoviteľa na dokončenie stavby. Tento termín je stanovený v Zmluvných údajoch a môže byť upravený len spôsobom obsiahnutým v zmluve (formou predĺženia lehoty výstavby).

Termín ukončenia je termín vydania protokolu o prevzatí stavby alebo ktorejkoľvek jej časti.

Oznámenie o ukončení prác znamená písomné oznámenie zhotoviteľa, že objekt, skupina objektov alebo stavba je dokončená vrátane vypracovania DSRS s patričnými skúškami a atestami. Toto oznámenie obsahuje žiadosť o vypísanie preberacieho konania.

Protokol o prevzatí prác v zmysle čl. 54.8 a 54.10 zmluvných podmienok.

Zmluvná cena (cena za stavbu) je cena navrhnutá zhotoviteľom a prijatá objednávateľom, ktorú sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie určitého diela (§ 536 a § 546 Obchodného zákonníka). Táto cena sa môže meniť podľa pravidiel uvedených v zmluve.

Zadržané platby znamená súhrn čiastok zo splatných faktúr zadržaných objednávateľom.


Práce sú tak činnosti, ako aj hmotné výsledky takých činností, ktoré podľa zmluvy má zhotoviteľ vybudovať, zmontovať a odovzdať objednávateľovi.

Zhotovovacie práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok, ktoré tvoria predmet zmluvy.

Pomocné práce sú tie činnosti a ich hmotný výsledok (pomocné objekty), ktoré sú vyprojektované, vybudované, zriadené a odstránené zhotoviteľom a ktoré sú nutné pre výstavbu alebo zostavenie diela.

Nedostatok resp. vada (staršie označenie) je akákoľvek časť diela nezhotovená v súlade so zmluvou a TKP.

Technologické zariadenie – označenie pre všetky stroje a zariadenia, ktoré sú trvalou súčasťou predmetu stavby.

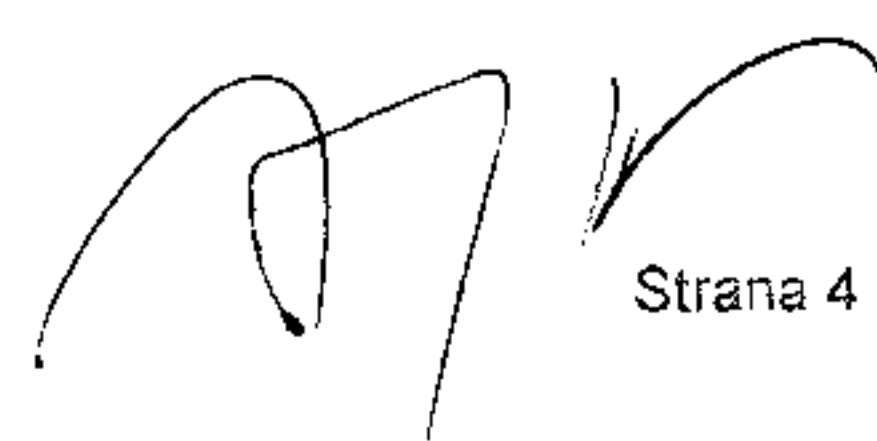

Vybavenie stavby je názov pre mechanizmy, vozidlá a zariadenia zhotoviteľa, ktoré sú dočasne na stavenisku a sú potrebné pre zhotovenie stavby, jeho údržbu až do termínu odovzdania a pre odstránenie vád a ktoré nie sú trvalou súčasťou stavby.

Stavenisko je priestor vymedzený v Zmluvných údajoch. Znamená súhrn pozemkov, budov a plôch potrebných pre zhotovenie stavby, poskytnutých objednávateľom zhotoviteľovi.

Správy o prieskumoch staveniska sú tie, ktoré boli zahrnuté do podkladov pre ponuku a poskytujú presné a inštruktívne údaje o pomeroch podložja a spodnej vody v priestore staveniska.

Deň znamená kalendárny deň.

Mesiac znamená kalendárny mesiac.

2. Výklad

2.1 Pri výklade ustanovení týchto Zmluvných podmienok jednotné číslo znamená tiež množné číslo, mužský rod znamená taktiež ženský rod a opačne. Slová „osoby“ alebo „účastníci“ zahrňujú tiež právnické osoby. Nadpisy a odkazy medzi jednotlivými článkami nemajú žiadnu dôležitosť. Slová majú svoj normálny význam v zmysle jazyka zmluvy, pokiaľ to nie je výslovne formulované inak.

3. Jazyk zmluvy a právne predpisy

3.1 Jazyk zmluvy a právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na zmluvu sú uvedené v Zmluvných údajoch.

4. Rozhodnutia stavebného dozoru

4.1 Stavebný dozor rozhoduje v zmluvných záležitostiach medzi objednávateľom a zhotoviteľom čestne a nestranne. Riešenie prípadných vzniknutých sporov upravuje čl.24.

4.2 Stavebný dozor musí dostať písomný súhlas od objednávateľa predtým, než uskutoční ktorýkoľvek z nasledujúcich krokov stanovených v Zmluvných podmienkach:

- a) prevedenie ktorejkoľvek zo svojich povinností a zodpovednosti na iné osoby podľa čl.5,
- b) schválenie iného subjektu k zhotoveniu ktorejkoľvek časti stavby podľa čl. 7,
- c) schválenie úpravy (zmeny) podmienok poistenia podľa čl. 12
- d) schválenie navrhnutých pomocných prác (objektov a konštrukcií) podľa čl. 18,
- e) predĺženie plánovaného termínu ukončenia podľa čl. 26,
- f) udelenie pokynu zhotoviteľovi, aby odsunul začatie, alebo zdržal ktorúkoľvek z prác podľa čl. 28,
- g) úprava sadziab a cien podľa čl. 36,
- h) vydanie doplnku (zmeny) podľa čl. 37 okrem mimoriadnych situácií, ktoré rozumne uváži stavebný dozor,
- i) ohodnotenie predbežných rozpočtov alebo nových sadziab pre príslušné zmeny podľa čl. 38, alebo
- j) ohodnotenie dodatočných výloh súvisiacich s prípadmi odškodnenia podľa čl. 42.

4.3 Technický dozor je určený stavebným dozorom a je mu zodpovedný.

5. Poverenie

5.1 Stavebný dozor môže so súhlasom objednávateľa previesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a zodpovednosti na iné osoby (technický dozor, asistent) okrem rozhodcu potom, čo s tým oboznámil zhotoviteľa a môže zrušiť akékoľvek poverenie taktiež po predchádzajúcom informovaní zhotoviteľa.

5.2 Akékoľvek rozhodnutie alebo stanovisko technického dozora zhotoviteľovi, ktoré je v zhode s právomocami jemu udelenými, má rovnakú účinnosť, ako keby to bolo rozhodnutie alebo stanovisko stavebného dozora.

Skutočnosť, že technický dozor porušil svoje povinnosti a schválil nejakú prácu, materiál alebo zariadenie, nebráni stavebnému dozoru túto prácu, materiál a zariadenie odmietnuť a dať pokyny pre nápravu.

5.3 Ak zhotoviteľ nesúhlasí s akýmkoľvek upozornením, rozhodnutím alebo stanoviskom technického dozora, môže sa v predmetnej záležitosti obrátiť na stavebný dozor, ktorý potvrdí, zruší alebo zmení obsah takého upozornenia, rozhodnutia alebo stanoviska.

6. Komunikácia

6.1 Komunikácia medzi jednotlivými stranami, o ktorých sa hovorí v týchto Zmluvných podmienkach, je účinná iba, ak je v písomnej forme. Upozornenie (oznámenie) nadobúda účinnosť až po obdržaní.

7. Poverenie na uskutočnenie iným subjektom

7.1 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na uskutočnenie inému subjektu. Pokiaľ zmluva nestanoví inak, môže zhotoviteľ odovzdať časť stavby k zhotoveniu inému subjektu len po predchádzajúcom súhlase objednávateľa. Tento súhlas ale nezbujuje zhotoviteľa stavby povinnosti a zodpovednosti stanovenej v zmluve.

Zhotoviteľ stavby ručí za všetku činnosť, porušenie povinností alebo zanedbanie podzhotoviteľov časti stavby a ich zamestnancov tak, ako by to bola činnosť, porušenie povinností alebo zanedbanie jeho vlastné a jeho zamestnancov. Vyššie uvedený súhlas nepotrebuje zhotoviteľ v prípadoch :

- a) zabezpečenie pracovných síl,
- b) nákupu materiálov a stavebných dielov, ktoré sú v zhode s technicko-kvalitatívnymi podmienkami,
- c) v prípade odovzdania časti stavby na uskutočnenie ďalšiemu podzhotoviteľovi, ktorý je menovite uvedený v zmluve a má oprávnenie na vykonanie týchto prác.

8. Iní zhotovitelia

8.1 Zhotoviteľ spolupracuje a využíva priestor staveniska spolu s inými zhotoviteľmi, verejnými orgánmi, správcami inžinierskych sietí a objednávateľom v rámci termínov daných v „Zozname prác (časovom pláne)“ iných zhotoviteľov. Zabezpečí im taktiež zariadenia a služby tak, ako je to uvedené v spomínanom časovom pláne. Objednávateľ môže pozmeniť tento časový plán, pričom o každej takejto zmene oboznámi zhotoviteľa.

9. Zamestnanci zhotoviteľa

9.1 Zhotoviteľ zamestná buď tých vedúcich pracovníkov, ktorí sú menovite uvedení v „Zozname vedúcich pracovníkov“ a budú vykonávať funkcie určené podľa tohto zoznamu, alebo iných pracovníkov schválených stavebným dozorom. Stavebný dozor bude súhlasiť s prípadným vystriedaním vedúcich pracovníkov iba vtedy, ak kvalifikácia, schopnosti a príslušné skúsenosti nových pracovníkov sú rovnaké, alebo lepšie než u pracovníkov uvedených v predmetnom zozname.

9.2 Ak stavebný dozor požiada zhotoviteľa, aby odvolal pracovníka, ktorý patrí do jeho personálu, alebo pracovných síl a uvedie svoje dôvody, potom zhotoviteľ musí zaistiť, že takýto pracovník opustí stavenisko do 7-ich dní a že nebude mať žiadne ďalšie väzby s prácami v rámci predmetnej stavby.

10. Riziká zhotoviteľa

10.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zničenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako dôsledok vykonávania prác v rámci zmluvy. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť v prípade výskytu udalostí, ktoré sú rizikami objednávateľa podľa čl. 11.

11. Riziká objednávateľa

11.1 Objednávateľ je zodpovedný v prípadoch výnimočných rizík, ktorými sú:

- (a) pokiaľ priamo nepriaznivo ovplyvňujú vyhotovenie diela (stavby) v krajine objednávateľa: vojna, vojnový stav, invázia, činy cudzích nepriateľov, povstanie, revolúcia, vzbura, alebo vojenský puč, alebo násilné uchvátenie moci, občianska vojna, nepokoje, násilnosti, všeobecný rozvrat (pokiaľ sa netýkajú iba zamestnancov zhotoviteľa) a kontaminácia rádioaktivitou z nukleárných palív a nukleárných odpadov alebo rádioaktívnych toxických výbušnín alebo
- (b) škody spôsobené výlučne chybným návrhom diela okrem návrhov, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ.

12. Poistenie

12.1 Zhotoviteľ je povinný zjednať nasledovné druhy poistenia v mene zhotoviteľa pre obdobie od dňa začatia stavby až do termínu vydania posledného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, alebo posledného termínu pre odstránenia závad (podľa toho, ktorý z nich je neskorší):

(a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb, spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa;

(b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou:

(i) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku;

(ii) tretím osobám, ktoré nie sú na stavenisku;

(c) poistenie proti poškodeniu stavby a materiálov počas výstavby.

12.2 Poistné zmluvy a poistné osvedčenia predloží zhotoviteľ objednávateľovi na schválenie pred dňom začatia stavby stanoveným v Zmluvných údajoch a neskôr vtedy, ak si to bude vyžadovať stavebný dozor.

12.3 Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je zodpovedný zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním Preberacieho protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené zhotoviteľom počas iných činností.

12.4 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom stavebného dozoru alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva zjednaná.

12.5 Obidve strany musia konať v súlade so všetkými podmienkami poistných zmlúv.

12.6 Zhotoviteľ je podľa Zákona o živnostenskom podnikaní č. 455/91 Zb. v znení neskorších predpisov, povinný uzatvoriť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú ich zamestnancom pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislosti s nimi.

Objednávateľ nie je zodpovedný za škody alebo náhrady vyplácané pracovníkom alebo iným osobám v pracovnom pomere so zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek podzhotoviteľom.

12.7 Zhotoviteľ má zabezpečené bežné druhy poistenia a súhlasí s poistnými podmienkami definovanými objednávateľom v článkoch 12.1 až 12.6 Zmluvných podmienok. Pokiaľ by zhotoviteľ nedodrжал poistné podmienky podľa uvedených článkov, zodpovedá podľa §§ 788 – 828 Občianskeho zákonníka za vzniknuté škody v súvislosti s prípravou a uskutočnením stavby.

13. Náhrady škôd a poplatky

13.1 Zhotoviteľ a objednávateľ v zmysle ustanovenia § 373 a násl. Obchodného zákonníka zodpovedajú za škody nimi spôsobené v dôsledku zavineného porušenia povinností zo záväzkového vzťahu. Každá zo strán je povinná poskytnúť náhradu druhej strane za škody, výdavky a nároky (reklamácie) za straty alebo poškodenie fyzického majetku, za zranenie a usmrtenie osôb, spôsobené svojou vlastnou činnosťou alebo nedbalosťou.

13.2 Tá strana, ktorá uplatňuje odškodnenie má vykonať všetky primerané kroky, aby predišla stratám a škodám, ktoré môžu nastať.

13.3 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami (zmluvou) uzatvorenými v súlade so zmluvou, odškodní druhú stranu za všetky škody a požiadavky vzniknuté následkom ním spôsobeného nedodržania povinností.

14. Správy o prieskumoch staveniska

15. Dotazy týkajúce sa Zmluvných údajov

15.1 Stavebný dozor je povinný poskytnúť vysvetlenia k dotazom týkajúcim sa Zmluvných údajov.

16. Spôsob vykonania prác zhotoviteľom

16.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo v súlade s projektovou dokumentáciou.

16.2 Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy, odstrániť všetky vzniknuté nedostatky a udržiavať stavbu až do jej konečného odovzdania. Zhotoviteľ poskytuje všetkých riadiacich, technických a kontrolných pracovníkov, pracovné sily, materiály, vybavenie stavby a všetky ďalšie veci (či sú prechodného alebo trvalého charakteru) požadované k zhotoveniu a dokončeniu prác a k odstráneniu nedostatkov.

16.3 Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód na stavenisku.

16.4 Zhotoviteľ je povinný konať vo všetkých záležitostiach v zhode s:

- (a) právnymi predpismi a všetkými výnosmi, vyhláškami alebo nariadeniami, (ktoré súvisia s vykonávaním a dokončovaním prác a odstraňovaním nedostatkov) vydanými obecnými (mestskými), okresnými a krajskými úradmi,
- (b) predpismi, nariadeniami a pravidlami všetkých štátnych a miestnych orgánov a ďalších subjektov, ktorých majetok alebo práva sú, alebo môžu byť dotknuté vykonávaním prác.

Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby nedošlo k porušeniu povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená neplnením uvedených povinností, je zhotoviteľ povinný ju nahradiť.

17. Ukončenie prác do plánovaného termínu

17.1 Zhotoviteľ môže začať práce na základe písomného pokynu stavebného dozoru. Je povinný ich vykonávať v súlade s predloženým a stavebným dozorom schváleným programom, prípadne jeho upravenou a schválenou verziou. Práce je povinný dohotoviť do „plánovaného termínu ukončenia“ určeného v Zmluvných údajoch.

18. Schválenie pomocných prác

18.1 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru projektovú dokumentáciu a Technicko-kvalitatívne podmienky pre ním navrhované pomocné práce (objekty a konštrukcie), ktorý ich odsúhlasí, ak sú v súlade s TKP.

18.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za projektovú dokumentáciu pomocných prác (objektov, konštrukcií).

18.3 Schválenie stavebným dozorom nezbuvaie zhotoviteľa zodpovednosti za návrh pomocných prác, resp. príslušnú projektovú dokumentáciu.

18.4 Ak sa to vyžaduje, je zhotoviteľ povinný zadovážiť si odsúhlasenie ním navrhnutých pomocných prác (objektov, konštrukcií) tretími stranami.

19. Bezpečnosť

19.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých činností na stavenisku.

19.2 Počas vykonávania prác je zhotoviteľ povinný udržiavať stavenisko v primeranom stave bez zbytočných prekážok a musí všetky stavebné zariadenia a prebytočný materiál uskladniť alebo odstrániť. Taktiež musí odstrániť všetky trosky, odpadky alebo dočasné konštrukcie, ktoré už nebude potrebovať.

19.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za BOZP na stavenisku v zmysle nariadení vlády SR č.396/2006 Z.z., vyhlášky č.374/1990 Zb., zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

19.4 Koordinátor BOZP objednávateľa upozorňuje zhotoviteľa na porušenia povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich bodov záznamom do stavebného denníka.

Zodpovedný zamestnanec zhotoviteľa je povinný neodkladne nedostatky odstrániť.

20. Nálezy

20.1 Akákoľvek vec cenná z hľadiska historického a iného alebo vec význačnej hodnoty, ktorá sa neočakávane nájde na stavenisku, je vlastníctvom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť stavebný dozor o takých nálezoch a konať podľa jeho pokynov.

21. Odovzdanie staveniska

21.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko naraz alebo po častiach podľa poradia a časového harmonogramu uvedeného v zmluve, ktorý zodpovedá odsúhlasenému programu prác zhotoviteľa podľa čl. 25. Neodovzdanie niektorej z častí staveniska do termínu, ktorý je stanovený v Zmluvných údajoch sa považuje za zdržanie začatia príslušných činností zo strany objednávateľa a toto sa stáva „prípacom odškodnenia“.

21.2 Vytýčenie obvodu staveniska: zhotoviteľ vytýči obvod staveniska na požiadanie stavebného dozoru. Vytýčenie musí byť v teréne dostatočne viditeľné. Zároveň zhotoviteľ zabezpečí aj omedzňovanie stavby.

21.3 V zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii a Vyhlášky č. 300/2009 Z.z. – Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov zhotoviteľ zabezpečí odborný výkon geodetických prác menovaným zodpovedným geodetom, ktorého meno bude uvedené v zozname pracovníkov navrhovaných pre riadenie prác na zákazke.

21.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky rozhodnutia a dokumenty vydané počas prípravy a výstavby. Zhotoviteľ preberá na seba zodpovednosť za ich plnenie v stanovených termínoch a určenom rozsahu.

22. Prístup na stavenisko

22.1 Zhotoviteľ je povinný umožniť oprávneným pracovníkom objednávateľa, stavebnému dozoru a komukoľvek, kto má na to povolenie od stavebného dozoru alebo objednávateľa, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonávať práce v súvislosti so zmluvou.

23. Príkazy

23.1 Zhotoviteľ musí vykonať všetky príkazy stavebného dozoru, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

24. Spory

24.1 Prípadné spory medzi objednávateľom a zhotoviteľom budú riešené vzájomnou dohodou. V prípade nedohody spory budú riešené súdnou cestou v zmysle právneho poriadku platného v Slovenskej republike.

B. KONTROLA LEHOTY VÝSTAVBY

25. Program prác

25.1 V lehote, ktorá je uvedená v Zmluvných údajoch, musí zhotoviteľ predložiť stavebnému dozoru k odsúhlaseniu pracovný program s uvedením pracovných metód, postupov, opatrení a časových plánov všetkých svojich činností pri zhotovení stavby.

25.2 Aktualizáciou spomínaného programu je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

25.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru k odsúhlaseniu aktualizovaný program prác v časových intervaloch nie dlhších, než doba uvedená v Zmluvných údajoch. Ak však zhotoviteľ v rámci stanovenej doby nepredloží aktualizovaný program prác, stavebný dozor môže z najbližšej mesačnej faktúry zdržať čiastku stanovenú v Zmluvných údajoch. V zdržiavaní takejto čiastky môže stavebný dozor pokračovať až do najbližšej platby po termíne, kedy bol oneskorený program prác predložený.

25.4 Odsúhlasenie programu prác stavebným dozorom nezbavuje zhotoviteľa jeho povinností. Zhotoviteľ môže tento pracovný program prepracovať a znovu ho predložiť stavebnému dozoru v ktoromkoľvek čase. V prepracovanom programe má byť uvedený vplyv zmien a prípadov odškodnenia.

26. Predĺženie plánovaného termínu ukončenia

27. Urýchlenie výstavby

28. Oneskorenie nariadené stavebným dozorom

28.1 Stavebný dozor môže nariadiť zhotoviteľovi, aby odsunul začatie alebo zdržal ktorúkoľvek z prác vykonávaných v rámci uskutočňovania stavby.

29. Schôdzky vedenia stavby

29.1 Buď stavebný dozor alebo zhotoviteľ môžu požadovať účasť toho druhého na schôdzke vedenia stavby. Programom schôdzky vedenia stavby je preskúmať plány pre vykonanie zostávajúcich prác a prerokovať záležitosti v súlade s procedúrou „včasného upozornenia“.

29.2 Stavebný dozor je povinný z každej schôdze vedenia stavby vyhotoviť záznam. Kópiu záznamu je povinný predložiť okrem objednávateľa každému, kto sa schôdze zúčastnil. O zodpovednosti jednotlivých strán za kroky, ktoré bude potrebné vykonať, musí rozhodnúť stavebný dozor buď na schôdzke vedenia stavby alebo po nej a toto rozhodnutie písomne oznámiť všetkým, ktorí sa schôdzky zúčastnili.

30. Včasné upozornenie

30.1 Zhotoviteľ je povinný upozorniť stavebný dozor pri najbližšej príležitosti o špecifických, pravdepodobných budúcich udalostiach alebo okolnostiach, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu prác, spôsobiť zvýšenie zmluvnej ceny, alebo predĺženie plánovaného termínu ukončenia. Stavebný dozor môže od zhotoviteľa požadovať, aby vypracoval odhad očakávaného vplyvu budúcej udalosti alebo okolnosti na zmluvnú cenu a termín ukončenia stavby. Tento odhad je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čo možno najskôr.

30.2 Zhotoviteľ je povinný spolupracovať so stavebným dozorom pri tvorbe a prerokovávaní návrhov na zamedzenie nepriaznivých účinkov takej udalosti a okolnosti alebo ich zníženie kýmkoľvek, kto sa zúčastňuje prác a vykonáva akékoľvek z nich vyplývajúce príkazy stavebného dozoru.

C. KONTROLA KVALITY

31. Zisťovanie nedostatkov

31.1 Stavebný dozor je povinný kontrolovať prácu zhotoviteľa a upozorniť ho na akýkoľvek nedostatok, ktorý nájde. Takáto kontrola nezabavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za práce. Stavebný dozor môže nariadiť zhotoviteľovi vyhľadanie nedostatku, odkrytie a odskúšanie akýchkoľvek prác (častí stavby), u ktorých predpokladá, že môžu byť vadné.

32. Skúšky a kontroly

32.1 Stavebný dozor je oprávnený kontrolovať a skúšať počas výroby, zhotovovania alebo prípravy materiály, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre stavebný dozor k miestam týchto činností prístup alebo právo ku vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezabavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

32.2 Zhotoviteľ si odsúhlasí so stavebným dozorom čas a miesto skúšok alebo kontroly materiálov. Stavebný dozor oznámi zhotoviteľovi najmenej 24 hodín vopred, že sa chce skúšky zúčastniť. Keď sa stavebný dozor ku skúške alebo kontrole nedostaví, môže zhotoviteľ vykonať skúšku ako keby tam stavebný dozor bol, pokiaľ tento nenariadi inak. Zhotoviteľ potom odovzdá stavebnému dozoru výsledky skúšok písomne a ten ich musí považovať za správne.

32.3 Keď sú miesta a termíny skúšok odsúhlasené a stavebný dozor zistí, že materiál skúšaný podľa čl. 32.2 nezodpovedá ustanoveniam Technicko-kvalitatívnych podmienok alebo skúška sa nemôže vykonať, môže materiál alebo stavebné diely vylúčiť z použitia a napíše o tom ihneď správu pre zhotoviteľa. V správe uvedie dôvody svojho rozhodnutia. Zhotoviteľ okamžite vykoná nápravu alebo preukáže, že odmietnuté materiály zmluve vyhovujú.

Stavebný dozor môže požadovať opakovanie skúšky. Náklady, ktoré vznikli objednávateľovi opakovaním skúšok, určí po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom stavebný dozor. Táto pohľadávka môže byť započítaná proti pohľadávke zhotoviteľa jednostranným úkonom objednávateľa. Stavebný dozor oznámi výšku čiastky zhotoviteľovi a kópiu oznámenia odovzdá objednávateľovi.


32.4 Stavebný dozor môže zadať kontrolu a skúšanie materiálu nezávislej osobe. Potom sa považuje táto osoba za pracovníka stavebného dozoru vo funkcii asistenta podľa čl. 5.1. Stavebný dozor to musí oznámiť zhotoviteľovi vopred.

32.5 Ak stavebný dozor nariadi zhotoviteľovi vykonať takú skúšku, ktorá nie je uvedená v Technicko-kvalitatívnych podmienkach, za účelom zistenia či niektorá z prác (častí stavby) nemá nedostatok a ak skúška ukáže, že práca (časť diela) má nedostatok, potom náklady na skúšku a skúšobné vzorky nesie zhotoviteľ. Ak sa však pri skúške nedostatok nezistí ide o „prípadoškodenia“.

32.6 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ musí umožniť stavebnému dozoru skontrolovať akýkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad stavebného dozoru. To platí aj pre základovú škáru.

Zhotoviteľ oznámi stavebnému dozoru, že časť diela alebo základová škára majú byť zakryté. Ten bez zbytočného otáľania vykoná kontrolu. Keď zistí, že kontrola nie je potrebná, oznámi to zhotoviteľovi.

32.7 Zhotoviteľ odkryje akýkoľvek časť diela a sprístupní ju stavebnému dozoru, pokiaľ to stavebný dozor v prípade potreby nariadi. Potom túto časť znovu zakryje a uvedie do pôvodného stavu. Ak však bolo splnené ustanovenie čl. 32.6 a spomínaná časť bola zakrytá so súhlasom stavebného dozoru a po odkrytí sa zistí, že je v súlade so zmluvou určí stavebný dozor, po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom, náklady na odkrytie diela a uvedenie do pôvodného stavu. Tieto budú započítané do pohľadávky zhotoviteľa, čo zhotoviteľovi oznámi. Kópiu oznámenia odovzdá objednávateľovi. V opačnom prípade nesie náklady zhotoviteľ.

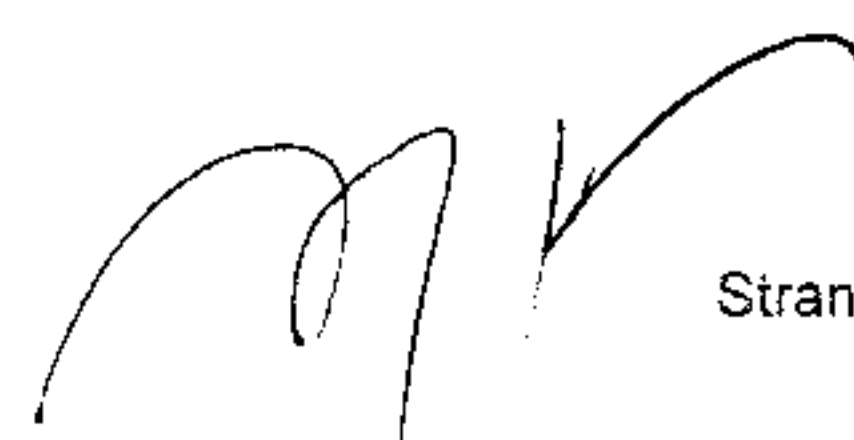

32.8 Stavebný dozor môže vydať v prípade potreby príkaz:

- (a) k odstráneniu akéhokoľvek materiálu zo staveniska, ktorý podľa jeho názoru nespĺňa požiadavky Technicko-kvalitatívnych podmienok (TKP) a to v termínoch, ktoré môže nariadiť
- (b) k výmene zabudovaných materiálov, či stavebných dielcov, pokiaľ tieto nespĺňajú podmienky TKP
- (c) k odstráneniu a opätovnému vykonaniu prác, bez ohľadu na výsledky predchádzajúcich skúšok či platieb v súvislosti s:
- materiálmi a pracovnými postupmi,
 - projektovou dokumentáciou zhotoviteľa alebo so všetkým, za čo zhotoviteľ zodpovedá, ak tieto práce nespĺňajú podľa jeho názoru požiadavky zmluvy.

33. Odstránenie nedostatkov

33.1 Stavebný dozor je povinný oznámiť zhotoviteľovi akýkoľvek nedostatok, o ktorom si je vedomý, ešte pred ukončením záručnej doby, ktorá začína dňom ukončenia stavby alebo prevzatím jednotlivých objektov do užívania.

33.2 Zakaždým po takomto oznámení (ohlásení nedostatkov) sa začína „doba na odstránenie nedostatkov“. Zhotoviteľ je počas spomínanej doby povinný ohlásený nedostatok odstrániť. Dĺžka doby na odstránenie nedostatku je stanovená v Zmluvných údajoch.

33.3 Pred ukončením záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky nedostatky, ktoré on sám spozoruje.

33.4 Aby dielo zodpovedalo po uplynutí záručnej doby rozsahu a kvalite požadovanej v zmluve, s výnimkou normálneho opotrebovania, zhotoviteľ:

- (a) dokončí čo najskôr nedokončené a dodatočné práce uvedené v protokole o prebratí prác (ktorý môže stavebný dozor vydať potom, keď zhotoviteľ dokončí dielo, alebo ucelenú časť diela a keď sa úspešne vykoná preberacia skúška predpísaná zmluvou),
- (b) vykoná také dodatočné práce, opravy a rekonštrukcie, ktoré stavebný dozor zhotoviteľovi nariadil podľa výsledkov kontroly počas záručnej doby, alebo do 14 dní po jej uplynutí.

33.5 Práce uvedené v čl. 33.4 musí vykonať zhotoviteľ na svoje náklady, keď podľa názoru stavebného dozora:

- (a) materiál alebo stavebné postupy neboli v súlade so zmluvou,
- (b) zhotoviteľ zanedbal niektorú z povinností vyjadrených alebo zahrnutých v zmluve.

Pokiaľ podľa názoru stavebného dozora potreba týchto prác vznikla z iných príčin, určí stavebný dozor dodatočnú platbu podľa čl. 38, ktorú započíta do pohľadávok zhotoviteľa, oznámi ju zhotoviteľovi a v kópii oznámenie pošle objednávateľovi.

33.6 Pokiaľ zhotoviteľ odmietne vykonať príkazy stavebného dozora v primeranej lehote, môže objednávateľ nechať práce, ktoré podľa názoru stavebného dozora je povinný vykonať zhotoviteľ, vykonať inej osobe.

Keď tieto práce má zhotoviteľ vykonať na svoje náklady, určí stavebný dozor po prerokovaní so zhotoviteľom a objednávateľom, všetky náklady objednávateľa s tým spojené a tento obnos môže byť započítaný proti pohľadávke zhotoviteľa jednostranným úkonom objednávateľa. Stavebný dozor to oznámi zhotoviteľovi a kópiu oznámenia pošle objednávateľovi.

33.7 Ak sa pred uplynutím záručnej doby objavia nedostatky a nedorobky, môže stavebný dozor nariadiť zhotoviteľovi (kópiu príkazu odovzdá objednávateľovi), aby pod vedením stavebného dozora zistil príčinu týchto nedostatkov. Pokiaľ za tieto nedostatky a nedorobky nie je zodpovedný zhotoviteľ, určí stavebný dozor po prerokovaní s objednávateľom a zhotoviteľom všetky náklady spojené s prieskumom a tento obnos sa započíta do pohľadávok zhotoviteľa. Oznámi to zhotoviteľovi a kópiu oznámenia zašle objednávateľovi. Pokiaľ je za nedostatky zodpovedný zhotoviteľ, nesie sám náklady za prieskumy a odstráni nedostatky na svoje náklady v súlade s čl. 33.5.

33.8 Stavebný dozor je povinný potvrdiť, že všetky nedostatky a nedorobky sú odstránené až vtedy, ak všetky známe nedostatky boli skutočne odstránené. Ak sa stavebný dozor domnieva, že odstránenie nejakého nedostatku nie je nevyhnutné, môže požiadať zhotoviteľa, aby mu predložil cenový návrh na zodpovedajúce zníženie zmluvnej ceny (zľavu) alebo skorší termín ukončenia prác alebo oboje. Ak stavebný dozor uzná tento cenový návrh za prijateľný, zodpovedajúca úprava v Zmluvných údajoch sa považuje za zmenu.

33.9 Výška sankcie za nedodržanie lehoty na odstránenie nedostatkov a nedorobkov je uvedená v Zmluvných údajoch.

34. Neodstránené nedostatky po ukončení výstavby

34.1 Stavebný dozor môže po ukončení stavby zadať odstránenie nejakého nedostatku tretej strane. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ takýto nedostatok neodstráni počas „doby na odstránenie nedostatku“.

34.2 Stavebný dozor je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakého nedostatku tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takýto nedostatok počas predtým spomínanej doby, stavebný dozor môže zadať odstránenie tohto nedostatku tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením nedostatku budú odpočítané zo zmluvnej ceny.

D. KONTROLA NÁKLADOV

35. Výkaz výmer

35.1 Výkaz výmer má obsahovať položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré má vykonať zhotoviteľ.

35.2 Výkaz výmer a položkový súpis prác je podkladom pre výpočet zmluvnej ceny. Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce, pri použití jednotkových cien uvedených v ponuke pre každú jednotlivú položku.

36. Zmeny vo výmerách

36.1 Ak sa pre niektorú položku konečné množstvo vykonanej práce na objekte líši od množstva uvedeného vo výkaze výmer, v rozsahu viac než 25 % alebo na celej stavbe viac ako 10%, objednávateľ na požiadanie zhotoviteľa dohodne úpravu jednotkovej ceny tak, aby takúto zmenu zohľadňovala. Pokiaľ je takáto úprava vyvolaná rozdielom v množstve prác na objekte, v úprave sa zohľadní pomer množstva na objekte k množstvu na stavbe.

36.2 Ak o to požiada stavebný dozor, zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu podrobný rozpis ktorejkoľvek jednotkovej ceny, uvedenej v ponuke.

37. Zmeny

37.1 Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s objednávateľom, nariadiť zhotoviteľovi zmeny tvarov, kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané akékoľvek a zhotoviteľ je povinný:

- a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve,
- b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu,
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác,
- d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela,
- e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela,
- f) zmeniť následnosť alebo časovú návaznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela.

Takéto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom k odstúpeniu od zmluvy a budú ocenené v súlade s čl.38. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých príčinou bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo niekým, za koho je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

37.2 Všetky zmeny musia byť zahrnuté do aktualizovaných programov prác predložených zhotoviteľom.

38. Úhrada zmien

38.1 Zhotoviteľ je povinný vyčísliť dopad navrhovanej zmeny na zmluvnú cenu a poskytnúť stavebnému dozoru predbežný rozpočet na realizáciu takej zmeny. Stavebný dozor, po konzultácii s objednávatelom, je povinný k predloženému predbežnému rozpočtu zaujať stanovisko v lehote 7 dní od požiadania alebo v inej, ním stanovenej dlhšej lehote, vždy však predtým než vydá príkaz na vykonanie predmetnej zmeny.

38.2 Ak sa práca, ktorá je predmetom zmeny, zhoduje s popisom položky uvedenom v Popise prác a ak - podľa názoru stavebného dozora - rozsah práce nevyžaduje, aby sa zmenila jednotková cena, pre výpočet úhrady takejto zmeny sa použije jednotková cena uvedená v ponuke. Ak sa však jednotková cena mení alebo ak povaha (druh) práce, ktorú je potrebné v rámci zmeny vykonať sa nezhoduje s položkami v popise prác, zhotoviteľom zostavený predbežný rozpočet musí obsahovať nové sadzby pre príslušné položky.

38.3 Ak zhotoviteľom zostavený predbežný rozpočet považuje stavebný dozor, resp. objednávatel za neprimeraný, stavebný dozor vydá po zvážení nevyhnutnosti zmeny príkaz na jej vykonanie a zmluvnú cenu upraví podľa svojho vlastného odhadu účinkov tejto zmeny. Takto stanovená zmluvná cena je platná a záväzná po dobu, v ktorej sa obidve zmluvné strany dohodnú na konečnej úprave zmluvnej ceny, prípadne kým o nej rozhodne obchodný súd.

38.4 V prípade, že naliehavosť zmeny práce by neumožnila predloženie predbežného rozpočtu a jeho ohodnotenie bez toho, aby došlo k omeškaniu prác, predbežný rozpočet sa nevypracuje a zmena sa bude považovať za „prípád odškodnenia“.

38.5 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri včasnom upozornení.

39. Prognózy financovania

39.1 Prognóza financovania stavby predpokladá v jednotlivých rokoch finančné objemy, rozvrhnuté k plánovanému termínu ukončenia stavby.

39.2 Vždy keď je aktualizovaný program prác, zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru aktualizovanú prognózu financovania.

40. Faktúry

40.1 Zhotoviteľ predloží stavebnému dozoru mesačné faktúry s ocenením vykonaných prác s rozdelením podľa objektovej skladby včítane DPH.

40.2 Stavebný dozor prekontroluje faktúru zostavenú zhotoviteľom a potvrdí obnos, ktorý má byť zhotoviteľovi uhradený.

40.3 Za hodnotu vykonaných prác sa považuje tá hodnota, ktorú stanoví (potvrdí) stavebný dozor.

40.4 Hodnota vykonaných prác predstavuje hodnotu realizovaných množstiev prác podľa jednotlivých položiek, uvedených v ponuke.

40.5 Hodnota vykonaných prác zahrňuje tiež ocenenie zmien, zálohové platby, prípady odškodnenia a zrážky (zadržané čiastky).

40.6 Stavebný dozor môže neuznať ktorúkoľvek položku potvrdenú v predchádzajúcej faktúre alebo na základe novších informácií, môže znížiť podiel ktorejkoľvek položky potvrdenej predtým.

41. Platby

41.1 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi čiastky potvrdené stavebným dozorom v lehote do 60 dní od dátumu prijatia faktúry do podateľne Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest podľa príslušnej časti.

adresy IVSC sú nasledovné : IVSC Bratislava - Miletičova 19 820 05 Bratislava.

IVSC Banská Bystrica .- Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica

IVSC Žilina - ul. M.Rázusa 104/A 010 01 Žilina

IVSC Košice - Kasárenské námestie č. 4, 040 01 Košice

42. Prípady odškodnenia a poplatky

Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa a jeho personál, prípadne sprostredkovateľov proti a od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov (vrátane právnych poplatkov a nákladov) v súvislosti s :

- a) telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou ktorejkoľvek osoby ktoré vznikli v súvislosti vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad, pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi a
- b) poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo osobného (iného než je dielo) v rozsahu a akom také poškodenie alebo strata:

- (I) vzniklo, alebo prebieha počas realizácie a ukončenia diela a odstránenia akýchkoľvek väd, a
- (II) sa dá pripísať akejkoľvek nedbalosti, úmyselnému činu alebo porušeniu zmluvy zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne sprostredkovateľmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnávanou kýmkoľvek z nich.

Objednávateľ odškodní a ochráni zhotoviteľa, jeho pracovníkov alebo sprostredkovateľov za všetky nároky, škody, straty a náklady (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) pokiaľ

- (1) súvisia s telesným ublížením, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré sú pripísateľné akejkoľvek nedbalosti, úmyselne alebo porušením zmluvy objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi a
- (2) so záležitosťami, za ktoré môže byť zodpovednosť vyňatá z poisťného krytia sa jedná o záležitosti, ktoré môžu byť vylúčené z poisťovacieho krytia, ako je uvedené článku 12 (Poistenie).

42.1 Odškodnenie za oneskorenie

Ak zhotoviteľ nebude konať v súlade s článkom 25. (Program prác), zaplatí za tento nedostatok objednávateľovi odškodnenie. Toto odškodnenie za oneskorenie bude čiastka uvedená v Zmluvných údajoch, ktorá bude zaplatená za každý deň, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre dokončenie a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác.

Celková čiastka splatná podľa tohto článku neprekročí maximálnu čiastku odškodnenia za oneskorenie (ak je stanovená), uvedenú v Zmluvných údajoch. Toto odškodnenie za oneskorenie bude jediným odškodnením, ktoré zhotoviteľ za tento nedostatok zaplatí, okrem prípadov, kedy dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa článku 56. (Odstúpenie od zmluvy) pred dokončením prác. Toto odškodnenie nezbuje zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť stavbu, ani iných povinností, záväzkov alebo zodpovedností, ktoré môže mať podľa zmluvy.

42.2 Prerušenie prác

Technický dozor môže kedykoľvek vydať zhotoviteľovi pokyn, aby prerušil práce na celej stavbe alebo jej časti. V priebehu tohto prerušenia bude zhotoviteľ chrániť, uchovávať a zabezpečovať stavbu alebo časť stavby pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. .

43. Daň

43.1 Stavebný dozor je povinný upraviť zmluvnú cenu, ak došlo k zmenám rôznych druhov daní, napr. DPH, spotrebnej dane na pohonné hmoty, dane z príjmu, cestnej dane a pod. v období medzi 14-imi dňami pred predložením ponuky na stavbu a dňom predloženia poslednej faktúry. Táto úprava bude predstavovať zmenu veľkosti dane, ktorú zaplatí zhotoviteľ za predpokladu, že takéto zmeny nie sú už zahrnuté v zmluvnej cene.

44. Meny

44.1 Platby budú uskutočnené v mene euro.

45. Úprava ceny

45.1 Pevné, nemenné jednotkové ceny položiek uvedené v ponuke budú platiť počas celej zmluvne dohodnutej doby výstavby.

45.2 Cena realizovaných prác sa určí po zameraní množstiev podľa skutočného vyhotovenia stavby - tak, ako to bude zaznamenané v stavebnom denníku – a ich vynásobením pevnými, nemennými jednotkovými cenami vyznačenými zhotoviteľom v jeho ponuke.

45.3 Navyiac práce sa pripúšťajú len tie práce, ktoré si objednávateľ objedná nad rámec ponuky. Jednotkovú cenu prípadných nových položiek zhotoviteľ spracuje na základe ním stanoveného kalkulačného vzorca a cenových databáz, ktoré predložil zhotoviteľ pre ocenenie ponuky.

46. Zadržané platby

46.1 Až do termínu ukončenia celého diela príp. ucelenej časti stavby, objednávateľ zadrží z každej faktúry jednotlivých objektov stavby percentuálnu čiastku uvedenú v Zmluvných údajoch.

46.2 Po ukončení celého diela príp. ucelenej časti stavby, bude zadržaná čiastka (tvoriaca súčet zadržaných čiastok podľa objektov) uvoľnená zhotoviteľovi vtedy, keď v protokoloch o odovzdaní a prevzatí ucelenej časti stavby, alebo celého diela, nebudú uvedené žiadne nedostatky a nedorobky. V prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí VP budú uvedené nedostatky a nedorobky, bude zadržaná čiastka uvoľnená až po odstránení všetkých nedostatkov a nedorobkov do 14 dní na základe potvrdenia stavebného dozora.

47. Zmluvné pokuty

47.1 Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu, stanovenú použitím sadzby uvedenej v Zmluvných údajoch a to za každý deň, o ktorý je termín ukončenia prác omeškaný oproti termínu plánovanému. Objedávateľ môže odpočítať túto zmluvnú pokutu z platieb prislúchajúcich zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbaňuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti.

47.2 Ak je plánovaný termín ukončenia prác predĺžený potom, čo už bola zaplatená zmluvná pokuta, stavebný dozor je povinný korigovať takýto preplatok (na strane zhotoviteľa) a to úpravou najbližšej faktúry..

47.3 Objedávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania z úhradou faktúry.

48. Prémia

48.1

49. Zálohová platba a prípadná záruka

49.1 Objedávateľ môže poskytnúť zhotoviteľovi zálohovú platbu v čiastkach a termínoch uvedených v Zmluvných údajoch, akonáhle mu zhotoviteľ predloží bankovú záruku vo forme a od banky, ktorá je pre objednávateľa prijateľná. Banková záruka bude vyhotovená na čiastku, ktorá je zhodná so zálohovou platbou. Banková záruka musí byť účinná až do doby splatenia zálohovej platby, pričom však veľkosť záruky bude postupne znižovaná o čiastky splatené zhotoviteľom.

Objedávateľ môže však poskytnúť zálohovú platbu aj bez požadovania bankovej záruky.

49.2 Zhotoviteľ použije zálohovú platbu iba na financovanie stavebného vybavenia, nákup významných tovarov a na krytie výdavkov zariadení potrebných pre vykonanie prác. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že zálohová platba bola takým spôsobom použitá. Za tým účelom predloží stavebnému dozoru kópie účtov alebo iné dokumenty.

49.3 Zálohová platba sa vyrovná odpočítaním čiastok uvedených v Zmluvných údajoch z platieb, ktoré prislúchajú zhotoviteľovi a to podľa vzťahu uvedeného v Zmluvných údajoch. Pri ohodnocovaní vykonaných prác, zmien, úprav cien, prípadov odškodnenia, prémie alebo zmluvných pokút sa neberie v úvahu zálohová platba alebo jej splácanie.

V zmluve môže byť dohodnutý aj iný spôsob vyrovnania zálohovej platby.

50. Protokol o ukončení záručnej doby

50.1 Ak je zhotoviteľ, v zhode so zmluvou, povinný doložiť záruku na zákazku, musí tak urobiť najneskôr do termínu začatia stavby. Záruka musí byť vystavená vo forme a bankou alebo ručiteľom, ktorí sú prijateľní pre objednávateľa a s označením druhu a podielu každej z mien, v ktorých sa vykonajú platby zmluvnej ceny.

Všetky náklady, ktoré vzniknú plnením tohto článku, znáša zhotoviteľ.

50.2 Záruka na zákazku musí byť vystavená tak, aby bola platná do doby vykonania a odovzdania všetkých prác a do odstránenia všetkých nedostatkov v záručnej dobe v zhode so zmluvou. Po vydaní protokolu o ukončení záručnej doby podľa čl.52.5 nie je možné uplatňovať požiadavky na záruku. Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí prác a po odstránení zistených nedostatkov a nedorobkov objednávateľ vráti zhotoviteľovi 50% zloženej záruky na zákazku. Ostávajúcich 50% zloženej záruky vráti objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní po vydaní protokolu o ukončení záručnej doby v takej forme, v akej ju prijal.

50.3 Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa o akejkoľvek reklamácií náhrady škody zaslanej inštitúcii, ktorá záruku vystavila.

50.4 Objednávateľ môže reklamovať náhradu škody u ručiteľa, ak ktorákoľvek z nasledujúcich udalostí trvá 42 dní, alebo viac:

(a) zhotoviteľ nedodržiava zmluvu a objednávateľ ho informoval, že tomu tak je;

(b) zhotoviteľ nezaplatil nejaký obnos, ktorý prináleží objednávateľovi.

50.5 Zmluva sa považuje za splnenú po vydaní a podpísaní protokolu o ukončení záručnej doby objednávateľom. V protokole sa uvedie dátum, v ktorom zhotoviteľ splnil všetky svoje povinnosti súvisiace s vykonaním prác, ich odovzdaním a odstránením nedostatkov k spokojnosti stavebného dozoru.

Protokol o ukončení záručnej doby vydá objednávateľ do 28 dní po jej uplynutí na základe stanoviska stavebného dozoru.

V prípade, že úseky a objekty majú rozdielne doby trvania záručnej doby, považuje sa uplynutie záručnej doby za ukončené uplynutím záručnej doby posledného z nich. V prípade, že boli zhotoviteľovi uložené práce na odstránenie zistených nedostatkov v záručnej dobe, ktoré nevykonal k spokojnosti stavebného dozoru počas trvania záručnej doby, je ukončením záručnej doby dátum ukončenia poslednej z týchto prác k spokojnosti stavebného dozoru.

50.6 Ak v dobe vydania protokolu o ukončení záručnej doby zostávajú nespĺnené niektoré povinnosti zhotoviteľa alebo objednávateľa v súvislosti s plnením zmluvy, zmluva medzi zmluvnými stranami zostáva v platnosti za účelom určenia druhu a rozsahu týchto povinností.

51. Práca za časovú mzdu

51.1 Sadzby časovej mzdy (hodinové sadzby) v ponuke zhotoviteľa sa použijú pre malé, dodatočné množstvá prác a to iba vtedy, ak stavebný dozor dá dopredu písomné pokyny pre dodatočné práce, ktoré majú byť honorované takýmto spôsobom.

51.2 Všetky práce, ktoré sa honorujú v časovej mzde, musí zhotoviteľ zaznamenávať na formulároch schválených stavebným dozorom. Každý vyplnený formulár musí byť prekontrolovaný a podpísaný stavebným dozorom do 2-och dní po vykonaní práce.

51.3 Zhotoviteľ dostane zaplatené za práce v časovej mzde iba vtedy, ak obdrží podpísané príslušné formuláre.

52. Náklady na opravy

52.1 Poškodenie diela alebo materiálov, z ktorých má byť zhotovené, v čase medzi dňom začatia stavby a ukončením záručnej doby, musí byť opravené zhotoviteľom na jeho náklady, ak takéto poškodenie alebo zničenie je spôsobené konaním alebo nedbalosťou zhotoviteľa.

E. Ukončenie zmluvy

53. Ukončenie prác

53.1 Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte (resp. skupine objektov), ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Na základe toho stavebný dozor vydá osvedčenie, ktorým potvrdí ukončenie prác a predloženie všetkých náležitostí v zmysle TKP a zmluvných podmienok. Po doručení tohto osvedčenia objednávateľ zvolá do 21 dní preberacie konanie.

54. Prevzatie prác

54.1 Geodetické práce sa budú vykonávať v zmysle Zákona NR SR č.215/1995 Z.z., o geodézii a kartografii, vyhlášky č. 300/2009 Z.z. – Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov, platných noriem, iných súvisiacich predpisov a podľa požiadaviek objednávateľa

54.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi (jeho zodpovednému geodetovi) body vytyčovacej siete, ktoré bude zhotoviteľ po dobu výstavby udržiavať.

54.3 Presné podrobné vytyčenie objektov zabezpečí zhotoviteľ v zmysle TKP a podľa požiadaviek objednávateľa.

54.4 Zhotoviteľ (jeho zodpovedný geodet) je povinný upovedomiť objednávateľa o možnostiach vykonať kontrolné merania podzemných sietí a iných objektov pred ich zakrytím. Kontrolné meranie predkladá zhotoviteľ vždy k mesačnému zisťovaniu vykonaných prác v dopredu dohodnutej forme a rozsahu.

Rozsah kontrolných meraní vykonaných zodpovedným geodetom zhotoviteľa určí objednávateľ.

54.5 Zhotoviteľ zabezpečí omedzníkovanie majetkovej hranice podľa platnej dokumentácie.

54.6 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v šiestich vyhotoveniach geodetickú časť dokumentácie skutočného realizovania objektu, spolu s oznámením o dokončení prác na objekte.

54.7 V prípade potreby doprojektovania zmien a doplnkov si geodetické podklady zabezpečí zhotoviteľ sám, rozsah geodetickej časti zmien určí objednávateľ.

54.8 Keď zhotoviteľ dokončí práce na objekte /resp. skupine objektov/, ktoré môžu slúžiť svojmu účelu, oznámi túto skutočnosť objednávateľovi spolu s náležitosťami v zmysle TKP, Zmluvných podmienok. Od doručenia písomného oznámenia objednávateľ zvolá do 21 dní preberacie konanie.

Po ukončení preberacieho konania spíše objednávateľ spoločne so zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce aj so súpisom prípadných nedostatkov a nedorobkov s termínom ich odstránenia v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z.z. – Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. Objednávateľ môže za účelom preberania prác zvoláť rokovanie spojené s prehliadkou.

54.9 Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie plánu užívania verejnej práce (3x). Tento predloží objednávateľovi súčasne s oznámením o dokončení prác na objekte.

54.10 Ukončením celého diela sa rozumie podpísanie preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce na všetkých objektoch stavby.

55. Konečná faktúra

55.1 Po vydaní protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru konečnú faktúru vo forme schválenej stavebným dozorom s uvedením:

- a) konečnej hodnoty prác vykonaných podľa zmluvy k dátumu uvedenému v protokole o odovzdaní a prevzatí VP,
- b) ďalších čiastkach uvedených v zmluve, ktoré mu podľa jeho názoru patria,
- c) hodnoty prác, o ktorých zhotoviteľ predpokladá, že sa stanú splatnými a že ich ešte obdrží v súlade so zmluvou. Táto čiastka bude uvedená vo faktúre pri odovzdaní prác zvlášť.

56. Odstúpenie od zmluvy

56.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy, ak je druhá strana príčinou podstatného porušenia zmluvy, čo značne obmedzí úžitky zo zmluvy vyplývajúce.

56.2 Podstatným porušením zmluvy okrem zákonnej definície v ustanovení § 345 Obch. zak. sú nasledovné prípady (nie však iba tie, ktoré sú uvedené ďalej):

- (a) Zhotoviteľ zastaví práce na 28 dní, aj keď žiadne takéto zastavenie prác nie je uvedené v najnovšom programe a nebolo schválené stavebným dozorom;
- (b) Stavebný dozor nariadi zhotoviteľovi spomaliť (zdržať) postup výstavby a takýto príkaz nie je odvolaný v priebehu 28 dní;
- (c) Objednávateľ alebo zhotoviteľ zbankrotuje alebo dôjde k jeho likvidácii (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie);
- (d) Obnos potvrdený stavebným dozorom objednávateľ nevyplatí zhotoviteľovi v lehote 84 dní od dátumu takého potvrdenia;
- (e) Stavebný dozor písomne oznámi, že neodstránenie istého nedostatku je podstatným porušením zmluvy a že zhotoviteľ neopravil takýto nedostatok v primeranej lehote (určenej stavebným dozorom);
- (f) Zhotoviteľ nepredloží požadovanú záruku.

56.3 Ak jedna zo zmluvných strán upozorní stavebný dozor na porušenie zmluvy, tento je povinný rozhodnúť, či ide o porušenie podstatné alebo nie.

56.4 Okrem horeuvedeného objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka.

56.5 Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr.

57. Platby pri odstúpení od zmluvy

57.1 Ak omeškanie zhotoviteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi zhotoviteľovi, ktorý je v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení objednávateľ dozvedel.

58. Vlastníctvo

58.1 Všetky materiály na stavenisku, technologické zariadenie, stavebné vybavenie, pomocné a trvalé konštrukcie (objekty) sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.

59. Zmarenie zmluvy

59.1 Ak je plnenie zmluvy prekazené vypuknutím vojny alebo akoukoľvek inou udalosťou úplne mimo kontroly objednávateľa alebo zhotoviteľa, stavebný dozor je povinný potvrdiť, že zmluva je zmarená. Zhotoviteľ musí zabezpečiť stavenisko a čo najskôr, po obdržaní takého potvrdenia zastaviť práce. Zhotoviteľovi sa preplatia všetky práce, ktoré vykonal až do doby, kedy obdržal spomínané potvrdenie, ako aj práce na ktoré bol zmluvne zaviazaný a vykonal ich potom.

60. Dokumentácia skutočného realizovania stavby

60.1 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby predkladá zhotoviteľ spolu s oznámením o ukončení prác na objekte. Platba za dokumentáciu skutočného realizovania stavby sa zahrnie do mesačnej faktúry, pričom zhotoviteľ predloží jej špecifikáciu na jednotlivé objekty a prevádzkové súbory. Dokumentácia skutočného realizovania stavby sa dodá okrem klasickej formy (v 6 vyhotoveniach) aj v elektronickej forme na CD. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ predloží 3x elaborát kvality (atesty a výsledky skúšok a meraní).

60.2 Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č.453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obsah DSRS zabezpečovanej zhotovovateľom stavby:

a) stavebné výkresy a technické správy v podrobnosti ako DRS, ktoré dokumentujú stavbu tak, ako bola skutočne realizovaná, spracovaná v trvanlivom vyhotovení aj v digitálnej forme v požadovanom formáte. Dokumentáciu odsúhlasuje stavebný dozor. Dokumentácia je súčasťou dodávky stavby a jej vyhotovenie je v cene dodávky,

b) manuál užívania stavby (plán užívania verejnej práce)

Manuál pozostáva z týchto častí: - pravidiel užívania objektov,
- pravidiel technických prehliadok objektov,
- pravidiel údržby a objektov

Manuál užívania stavby odsúhlasuje stavebník a autorský dozor.

c) prevádzkové poriadky určených objektov stavby.

60.3 Všetky geodetické práce vyplývajúce z činnosti zhotoviteľa, ako aj dodávka geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby sú zahrnuté v špecifikácii dokumentácie skutočného realizovania stavby jednotlivých objektov.



Technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)

sú uvedené na stránke www.ssc.sk

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-

13. 05. 2011

.....

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s. CESTY NITRA, a.s.
riadne splnomocnený zástupca na základe plnej moci

Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky pre všetky 4 časti :

- a) Uchádzač / zhotoviteľ bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy technické, strojné a výrobné zariadenia a pracovné sily v takom počte, rozsahu, kapacite a umiestnení, že bude schopný zabezpečiť realizáciu prác na všetkých predmetných úsekoch v požadovanej kvalite a stanovenom termíne.
- b) Vzdialenosť úseku od obalovacej súpravy nebude vyššia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút.
- c) Práce zabezpečované prostredníctvom podzhotoviteľov uchádzač zdokladoval oprávnením podzhotoviteľa uskutočňovať predmetné práce.
- d) Čiastočnú uzávierku ciest ako aj odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác si zhotoviteľ zabezpečí na príslušnom Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a na Dopravnom inšpektoráte.
- e) **Požadované technické a kvalitatívne požiadavky verejného obstarávateľa:**

Pre navrhnutú technológiu budú dodržané ustanovenia nasledovných STN:

- pre zhutnené asfaltové vrstvy **STN 736121, STN EN 13108, TKP MDPT SR, časť 6 (apríl 2010) „hutnené asfaltové zmesi** „ uverejnené na stránke www.ssc.sk
- pre postreky a nátery **STN 736129**

Uchádzač všetky práce na predmete zákazky vykoná v zmysle technického predpisu **TP 5/2007 „Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek“** schválený MDPaT SR.

Použitie materiály budú mať certifikáty v zmysle platných predpisov.


Pri realizácii predmetu zákazky uchádzač zabezpečí rozprestretie asfaltovej zmesi finišerom s automatickým zariadením, ktorý zabezpečí mieru zhutnenia pod hladiacou doskou, min. 90%.

Poznámka:

Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované.

Stavebné práce budú realizované v zmysle požadovaných technických a kvalitatívnych požiadaviek verejného obstarávateľa: Slovenská správa ciest , Miletičova 19, 826 19 Bratislava. Stavebné práce budú realizované v zmysle časového programu prác/harmonogramu na jednotlivých úsekoch, ktorý je záväzný pri plnení zmluvy. Podrobný časový program prác / harmonogram prác na jednotlivých úsekoch príslušnej časti zákazky s popisom výkonov v návaznosti na výkony a kapacitu strojných, výrobných a technických zariadení a osôb zodpovedných za realizáciu prác je súčasťou predloženej cenovej ponuky na predmetnú časť verejnej súťaže.

Nitra, 13.05.2011



CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-17-

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva CESTY NITRA, a.s.
riadne splnomocnený zástupca
na základe plnej moci



OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC

Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti:

- časť č. 1 - Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Bratislava
- časť č. 2 - Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Banská Bystrica
- časť č. 3 - Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Žilina
- časť č. 4 - Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Košice

Časť č. 1

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC - IVSC Bratislava

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet: 45 23 00 00 – 8

Doplňujúce predmety: 45 23 32 23 – 8

45 23 31 42 – 6

Práce budú realizované na 5-tich úsekoch ciest I. triedy TTSK a NTSK:

Úsek	kraj	okres	katastrálne územie	označenie úseku
1.	TTSK	Senica	intravilán	I/2 Holíč - intravilán -
2.	NTSK	Nitra	intravilán	I/51 Nitra - Levická
3.	NTSK	Nitra	intravilán	I/51 Nitra - Zoborská - Chrenovská -
4.	NTSK	Nitra - Levice	intravilán/extravilán	I/51 hr. okr. NR-LV-Rohožnica -
5.	NTSK	Levice	extravilán	I/75 križ. Maláš - Tek. Lužany -

Technická správa

k projektu "Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC"

Časť č. 1

Projekt rieši odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. tried v prešovskom a košickom samosprávnom kraji. Do projektu boli zahrnuté úseky ciest na základe systému hospodárenia s vozovkami a najmä úseky (mimo spoplatnených úsekov ciest), ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave. Vykazujú značné poruchy, ako sú pozdĺžne a priečne nerovnosti, množstvo vysprávok výtlkov, pozdĺžne koľaje, poklesy vozoviek, sadnutie krajníc, poklesy poklopov, sieťové rozpady a pod.. Na uvedených úsekoch ciest vzniká množstvo výtlkov, najmä v zimnom období, ktoré vzhľadom na nevhodné klimatické podmienky nie je možné okamžite opraviť a tým dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ako aj zvyšovaniu hlučnosti od premávky najmä v prietahoch miest čo má veľmi zlý dopad na životné podmienky v okolí týchto ciest. Výtlky spôsobujú aj značné škody na majetku, kde dochádza k častým poškodeniam vozidiel. Nižšie popísané úseky ciest je nevyhnutné okamžite riešiť aj z dôvodov neustálych sťažností zo strany verejnosti, prepravcov, dopravných inšpektorátov, cestného správneho úradu, ako aj médií.



- pokládka AC0 11-I s PMB 50 45/80 -75 hr. do 50 mm,
- zarezanie živičného krytu 18 bm,
- zaliatie škár pružnou asfaltovou zálievkou šírky 30 mm 18 bm,
- výškové vyrovnanie kanal. poklopov 1 ks,
- BBTM 8-I hr. 30 mm
- dodávka a polozenie výstužnej geomreže 100/100 kN 10000 m²,
- dodanie a osadenie informačnej tabule
- zabezpečenie potrebných povolení a dočasného dopravného značenia.

Spôsob vykonania opravy:

Práce budú realizované pri čiastočnej uzávierke. Pred zahájením prác sa osadí dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na základe určenia vydaného krajským úradom. Vozovka sa na začiatku a na konci úseku výmeny zapíli, odfrézuje sa existujúci kryt vozovky v hrúbke do 50 mm, realizuje sa spájací postrek, položí sa BBTM 8-I hr. 30 mm, položí sa výstužná geomreža 100/100 KN, výškovo sa upraví všetky poklopy v predmetnom úseku. Ako posledná sa uloží živičná vrstva AC0 11-I s PMB 50 45/80 -75 hr. do 50 mm a zalejú sa škáry v mieste napojenia na jestvujúci kryt.

Prístup na stavenisko: je možný po ceste I/51 a miestnych komunikáciách napojených na predmetnú cestu.

Stavba: I/51 Nitra – Zoborská - Chrenovská

Realizované aktivity: Odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek) miesto je aj v zozname KNL.

Miesto stavby: úsek sa nachádza od kruhovej Zoborská smerom ku križovatke Chrenovská v km 176,740 – 177,510 v intraviláne mesta Nitra

Popis súčasného stavu: stav tohto úseku cesty je zlý, na ceste sa nachádzajú vyjazdené koľaje, v mnohých miestach sú sieťové trhliny, na ceste je viacej plôch s väčšími výtlkmi.

Navrhovaná úprava: v rámci odstránenia nedostatkov a závad na ceste v navrhovanom úseku sa budú realizovať nasledovné práce :

- odfrézovanie krytu vozovky v hrúbke do 50 mm, vrátane odvozu do 10 km,
- aplikácia spojovacieho postreku,
- pokládka ACO 11- I. hr. do 50 mm s PMB 45/80 - 75 ,
- zarezanie živičného krytu 60 bm,
- zaliatie škár pružnou asfaltovou zálievkou šírky 30 mm 60 bm,
- výškové vyrovnanie kanal. poklopov 14 ks,
uličných vpustí 2 ks,
- dodávka a polozenie výstužnej geomreže 100/100 kN 7000 m²,
- BBTM 8-I hr. 30 mm
- dodanie a osadenie informačnej tabule
- zabezpečenie potrebných povolení a dočasného dopravného značenia.

Spôsob vykonania opravy:

- Práce budú realizované pri čiastočnej uzávierke. Pred zahájením prác sa osadí dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na základe určenia vydaného krajským úradom. Vozovka sa na začiatku a na konci úseku výmeny zapíli, odfrézuje sa existujúci kryt vozovky v hrúbke do 50 mm, realizuje sa spájací postrek, položí sa BBTM 8-I hr. 30 mm, položí sa výstužná geomreža 100/100 KN, výškovo sa upraví všetky poklopy v predmetnom úseku. Ako posledná sa uloží živičná vrstva AC 0 11-I v hrúbke 50 mm a zalejú sa škáry v mieste napojenia na jestvujúci kryt

Prístup na stavenisko: je možný po ceste I/51 a miestnych komunikáciách napojených na predmetnú cestu.

Stavba: I/51 hr. okr. NR – LV - Rohožnica

Realizované aktivity: Odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek).

Miesto stavby: ide o dva úseky a to hranica okr. NR – LV od km 203,265 – 204,150 a úsek od H. Ďúr – Rohožnica v km 205,670 – 207,285.

Popis súčasného stavu: toho času sa na ceste nachádzajú vyjazdené koľaje, miestami je povrch krytu vozovky vypratý a na mnohých miestach vykazuje sieťové rozpady a výtlky.

Navrhovaná úprava: v rámci odstránenie súčasného stavu je navrhovaná nasledovná úprava:

- odfrézovanie krytu vozovky v hrúbke do 30 mm, vrátane odvozu do 10 km,
- odfrézovanie krytu vozovky v hrúbke do 50 mm, vrátane odvozu do 10 km,
- aplikácia spojovacieho postreku,
- pokládka AC0 11- I. hr. do 50 mm s PMB 50 45/80 - 75,
- zarezanie živičného krytu 30,8 bm,
- dodanie a osadenie informačnej tabule
- zabezpečenie potrebných povolení a dočasného dopravného značenia.

Spôsob vykonania opravy:

Práce budú realizované pri čiastočnej uzávierke. Pred zahájením prác sa osadí dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na základe určenia vydaného krajským úradom. Vozovka sa na začiatku a na konci úseku výmeny zapíli, odfrézuje sa existujúci kryt vozovky v hrúbke do 30 mm, realizuje sa spájací postrek a ako posledná sa uloží živičná vrstva AC0 11-I v hrúbke 50 mm a zalejú sa škáry v mieste napojenia na jestvujúci kryt

Prístup na stavenisko: je možný po ceste I/51 a miestnych komunikáciách napojených na predmetnú cestu.

Stavba: I/75 križ. Maláš – Tek. Lužany


Realizované aktivity: Odstraňovanie bezpečnostných rizík (výmena narušených povrchov vozoviek).

Miesto stavby: ide o úsek cesty I/75 od križovatky na Maláš smerom na Tekovské Lužany v km 83,560 – 84,760.

Popis súčasného stavu: toho času sa na ceste nachádzajú mierne vyjazdené koľaje, miestami je povrch krytu vozovky vypratý a na mnohých miestach vykazuje sieťové rozpady a výtlky.

Navrhovaná úprava: v rámci odstránenie súčasného stavu je navrhovaná nasledovná úprava :

- odfrézovanie krytu vozovky v hrúbke do 30 mm, vrátane odvozu do 10 km,
- aplikácia spojovacieho postreku,
- pokládka AC0 11- I. hr. do 50 mm s PMB 50 45/80 - 75,
- zarezanie živičného krytu 14,4 bm,
- zaliatie škár pružnou asfaltovou zálievkou šírky 30 mm 14,4 bm,
- vyrovnanie nerovností z AC p 16-I
- polozenie výstužnej geomreže 100/100 kN,
- dodanie a osadenie informačnej tabule
- zabezpečenie potrebných povolení a dočasného dopravného značenia.

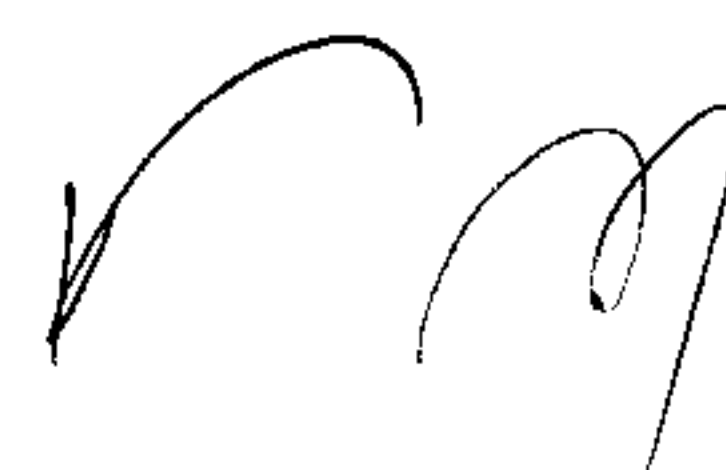

Spôsob vykonania opravy:

Práce budú realizované pri čiastočnej uzávierke. Pred zahájením prác sa osadí dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky na základe určenia vydaného krajským úradom. Vozovka sa na začiatku a na konci úseku výmeny zapíli, odfrézuje sa existujúci kryt vozovky v hrúbke do 30 mm, vyrovnajú sa nerovnosti z AC p 16-I, realizuje sa spájací postrek a ako posledná sa uloží živičná vrstva AC0 11-I v hrúbke 50 mm a zalejú sa škáry v mieste napojenia na jestvujúci kryt

Prístup na stavenisko: je možný po ceste I/75.



PLNOMOCENSTVO

č. 45/2011

udelené podľa ust. § 31 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení.

Splnomocniteľ :

Obchodné meno : CESTY NITRA, a. s.
Sídlo : Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovenská republika
iČO : 34 128 344
Obchodný register : Okresný súd Nitra, oddiel : Sa, vložka číslo : 140/N
Štatutárny orgán : **predstavenstvo spoločnosti :**
predseda - Francis Grass
člen - Alain Jeziorny
člen - Ing. Ján Hyža

Splnomocnenec :

meno a priezvisko, titul : **Ján Hyža, Ing.**
funkcia v spoločnosti : člen predstavenstva a generálny riaditeľ
číslo OP : SJ 179 415
trvalý pobyt : V.Clementisa 6485/48, 917 01 Trnava

Splnomocniteľ udeľuje splnomocnencovi v zmysle § 31 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v platnom znení plnomocnenstvo v plnom rozsahu na zastupovanie splnomocniteľa vo veci podpisovania dokladov a zmlúv týkajúcich sa stavby :

„Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách I. triedy v správe SSC“

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Bratislava

Plná moc sa udeľuje na dobu neurčitú

Plnomocnenstvo prijímam v plnom rozsahu :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-81-

Plnomocnenstvo bolo vyhotovené v slovenskom ako aj anglickom jazyku. Za záväznú sa považuje slovenská časť textu. Anglická časť textu bola vyhotovená na základe požiadavky Splnomocniteľa a má len informatívnu povahu.

POWER OF ATTORNEY

No. 45/2011

granted pursuant to section 31 et seq. of the Act No. 40/1964 Coll. as amended

Principal :

Business name : CESTY NITRA, a. s.
Registered seat : Murgašova 6
949 78 Nitra
Slovak republic
Company ID No. : 34 128 344
Commercial register : District court Nitra, section: Sa, insert No. 140/N
Statutory body : **Board of Directors :**
chairman - Francis Grass
member - Alain Jeziorny
member - Ing. Ján Hyža

Attorney :

name and surname, title : **Ján Hyža, Ing.**
position at company : Member of the Board of Directors and general director
national ID card No. : SJ 179 415
residing at : V.Clementisa 6485/48, 917 01 Trnava


The Principal grants a power of attorney according to sect.31 et seq. Of the Act no.40/1964 Coll.- Civil code amended to the Attorney in full scope to represent the Principal in the matter of signing a documents and contracts concerning the constructions:

„Disposal of bad technical parameters on 1st class roads that are in administration of SSC (Slovak Road Administration)“

Customer: Slovenská správa ciest Bratislava


The power of attorney is granted for indefinite period.

Košice 12. 05. 2011


Francis Grass

I accept power of attorney in the full scope :

Nitra 12. 05. 2011


Ing. Ján Hyža

Power of attorney has been executed in Slovak as well as in English version. As binding shall be considered Slovak wording. English wording has been executed upon Principal's request and it is only for information.

