Časový harmonogram prác

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ruňňany

Zhotoviteľ:
EUROBAU s.r.o.
Duhová 40, 040 01, Košice

Legenda značiek

- Stavebné objekty
- HSV a PSV práce
- Technologické etapy
- Technologická prestávka
- Ukončenie HSV / PSV prác

- Ⓟ - Počet pracovníkov (grafické znázornenie)
- RN - Rýpadlo-nakladač
- NA - Nákladné auto
- MM - Malá mechanizácia
- PP - Počet pracovníkov
- DT - Doba trvania

Poznámka: kontrolné dni prekrývajú v pravidelných týždňových intervaloch

EUROBAU	Technické zariadenie
Prevzatie staveniska	
Stavebné úpravy	
Práce a dodávky HSV	
Zemné práce	RN, NA
Základy	MM
Zvislé konštrukcie	MM
Vodorovné konštrukcie	MM
Povrchové úpravy	MM
Ostatné práce	MM
Práce a dodávky PSV	
Izolácie proti vode a vlhkosti	
Izolácie tepelné betónových	
Konštrukcie tesárske	MM
Drevostavby	MM
Konštrukcie klampiarske	MM
Konštrukcie stolárske	MM
Kovové doplnkové konštrukcie	MM
Podlahy a dlažby keramické	MM
Podlahy povlakové	
Nátery	
Maľby	
Vnútorná kanalizácia	
Práce a dodávky PSV	
Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	MM
Zdravotechnika - zariad. predmety	MM
Vnútorný vodovod	
Práce a dodávky PSV	
Zdravotechnika - vnútorný vodovod	MM
Zdravotechnika - zariad. predmety	
Plynofikácia	
Práce a dodávky PSV	
Zdravotechnika - plynovod	MM
Ústredné kurenie, kotolňa	MM
Dokončovacie práce - nátery	MM
Revízia	
Ústredné vykurovanie	
Práce a dodávky PSV	
Tepelné izolácie	
Vnútorný vodovod	MM
Kotolňa	MM
Rozvod potrubia	
Armatúry	
Vykurovacie telesá	
Práce a dodávky M	
Pravidelné prevádzkové revízie	MM
Vedenie rúrne vonkajšie	MM
Ostatné	
Elektroinštalácia	MM
Bleskozvod a uzemnenie	
Bleskozvod a uzemnenie	MM
Zemné práce	MM
Odovzdanie staveniska	
Kolaudácia	

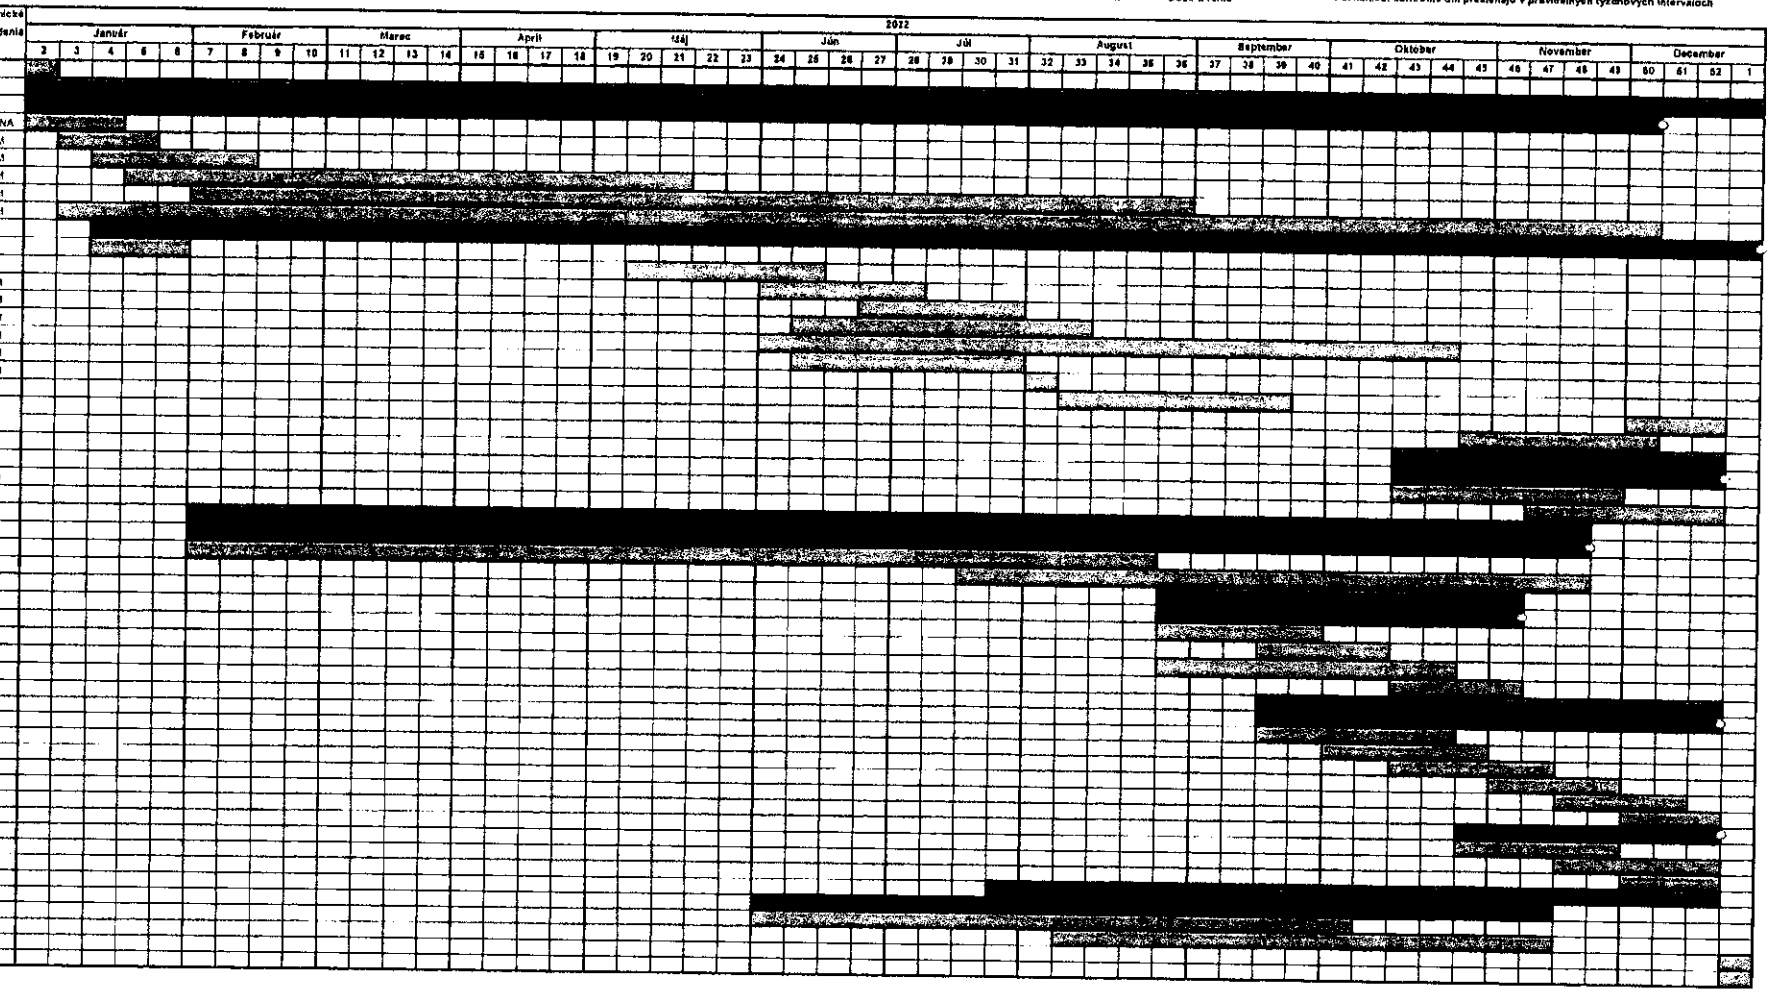
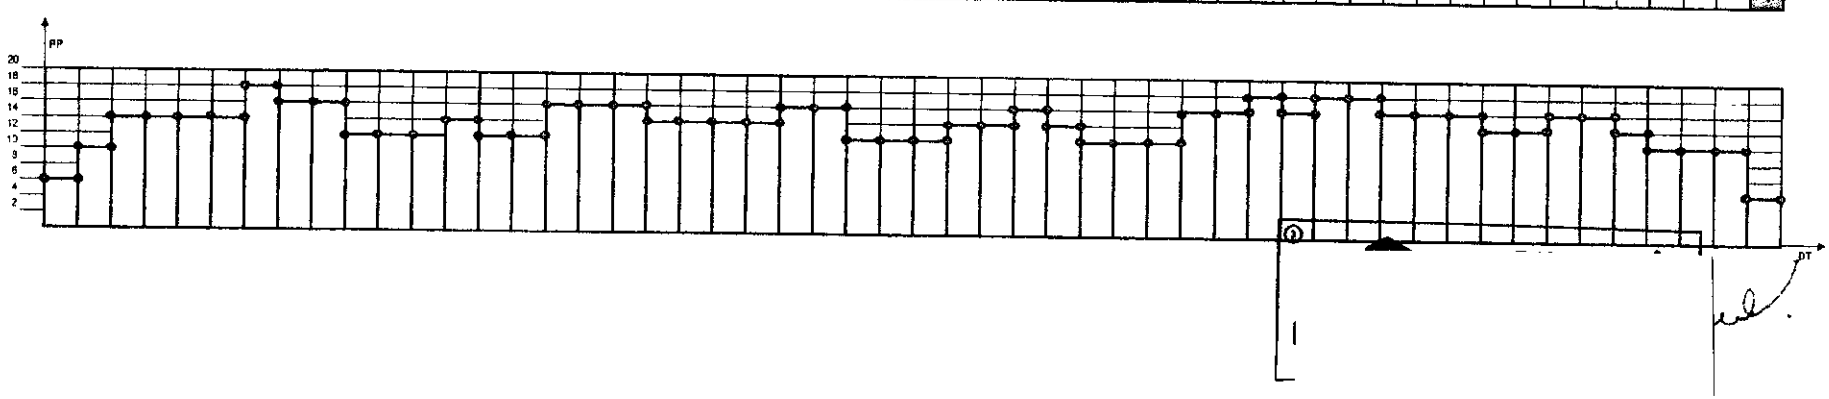
Histogram pracovníkov
