STRABAG s.r.o.

HARMONOGRAM

STRABAG

Identifi	Názov	MJ	začiatok (deň č.)	koniec (deň č.)	dĺžka trvania v dňoch	Množstvo	Plánovaný počet Pracovníkov
0	stavba: Cyklistická infraštruktúra - Divinka		1	105	105	0	
1	Prevzatie staveniska	m	1	1	1	0	
2	SO 01 Cyklotrasa	m	8	105	98	1916	
3	01.1 úsek č. 1 km 0.000 - 0.360	m	8	44	37	360	S3, P5
4	01.2 úsek č. 2 km 0.360 - 0.514	m	91	105	15	154	S3, P5
5	01.2 úsek č. 2 - oporný múr OM1	m	8	94	87	154	S3, P5
6	01.3 úsek č. 3 km 0.514 - 0.800	m	45	74	30	286	S3, P5
7	01.4 úsek č. 4 km 0.800 - 0.940	m	75	89	15	140	S3, P5
8	01.5 úsek č. 5 km 0.940 - 1.140	m	86	105	20	200	S3, P5
9	01.5 úsek č. 5 - oporný múr OM2	m	8	94	87	180	S3, P5
10	01.6 - Dopravné značenie za km 1.14014	m	75	104	30	775	S1, P5
11	SO 02 Elektrická prípojka	m	8	14	7	14	
12	Elektrická prípojka	m	8	14	7	14	P5
13	SO 03 Verejné osvetlenie	ks	15	102	88	20	
14	03.1 - úsek č. 1	ks	15	24	10	7	P5
15	03.2 - úsek č. 2	ks	95	102	8	5	P5
16	03.3 - úsek č. 3	ks	45	56	12	8	P5

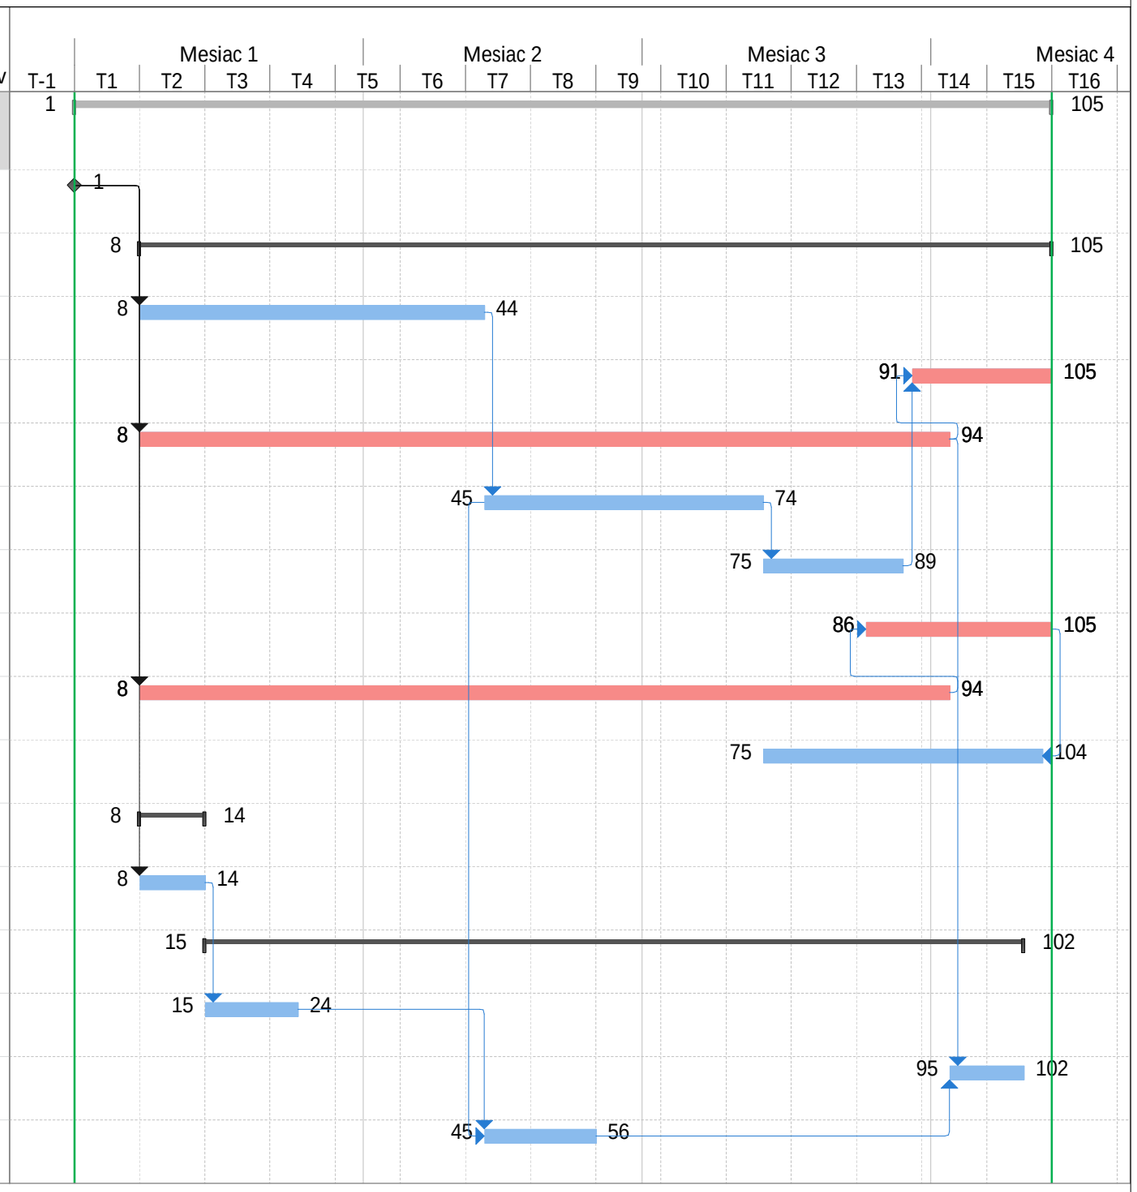

Úloha Medzník ◆ Súhrn Kritické
