Harmonogram inžinierskoprojektových činností

"ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" - projektová dokumentácia

Príloha č. 3
k 1.ČzoD č. 40/13/1313/1

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	"ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné" - projektová dokumentácia	520 dny	3.9. 13	31.8. 15
2	ŠTÚDIA REALIZOVATEĽNOSTI (ŠR)	109 dny	3.9. 13	31.1. 14
3	štúdia realizovateľnosti - technická časť	43 dny	3.9. 13	31.10. 13
4	štúdia realizovateľnosti - ekonomická časť	65 dny	1.11. 13	30.1. 14
5	dodanie ŠR	1 den	31.1. 14	31.1. 14
6	ZÁMER ŽP	64 dny	1.1. 14	31.3. 14
7	zámer ŽP	63 dny	1.1. 14	28.3. 14
8	dodanie zámeru ŽP	1 den	31.3. 14	31.3. 14
9	IČ pre Zámer ŽP	131 dny	1.4. 14	30.9. 14
10	IČ Z - zisťovacie konanie + rozsah hodnotenia	23 dny	1.4. 14	1.5. 14
11	IČ Z - správa o hodnotení	42 dny	2.5. 14	30.6. 14
12	IČ Z - pripomienkovanie a verejné prerokovanie	22 dny	1.7. 14	30.7. 14
13	IČ Z - odborný posudok (určí MŽP)	22 dny	31.7. 14	29.8. 14
14	IČ Z - zabezpečenie záverečného stanoviska MŽP SR	21 dny	1.9. 14	29.9. 14
15	IČ Z - vydanie záverečného stanoviska MŽP SR	1 den	30.9. 14	30.9. 14
16	DSZ	43 dny	1.10. 14	28.11. 14
17	DSZ	42 dny	1.10. 14	27.11. 14
18	dodanie DSZ	1 den	28.11. 14	28.11. 14
19	IČ DSZ	45 dny	1.12. 14	30.1. 15
20	IČ DSZ - prerokovanie ŽSR a zabezpečenie št. Exp. MDVRR SR	44 dny	1.12. 14	29.1. 15
21	IČ DSZ - protokol štátnej expertízy	1 den	30.1. 15	30.1. 15
22	DUR	56 dny	1.12. 14	30.3. 15
23	DUR	85 dny	1.12. 14	27.3. 15
24	dodanie DUR	1 den	30.3. 15	30.3. 15
25	IČ DUR	262 dny	1.8. 14	31.8. 15
26	IČ DUR - geodetický prieskum - overenie polygónu	21 dny	1.8. 14	29.8. 14
27	IČ DUR - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie územia	86 dny	1.8. 14	28.11. 14
28	IČ DUR - inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum	109 dny	1.8. 14	31.12. 14
29	IČ DUR - geotechnický a ekologický prieskum	66 dny	1.8. 14	31.10. 14
30	IČ DUR - archeologický prieskum	23 dny	1.10. 14	31.10. 14
31	IČ DUR - stavebno-technický prieskum	65 dny	1.9. 14	28.11. 14
32	IČ DUR - prieskum inžinierskych vedení - overenie IS	21 dny	1.8. 14	29.8. 14
33	IČ DUR - konečný prieskum	55 dny	1.9. 14	14.11. 14
34	IČ DUR - dopravno-inžinierske podklady	23 dny	1.10. 14	31.10. 14
35	IČ DUR - dendrologický prieskum	66 dny	1.8. 14	31.10. 14
36	IČ DUR - zistenie skutočného stavu a doplnenie jeho dokumentácie	43 dny	1.8. 14	30.9. 14
37	IČ DUR - prerokovanie DUR s objednávateľom	64 dny	1.1. 15	31.3. 15
38	IČ DUR - prerokovanie DUR po dodaní s OŠS, SS, os.	43 dny	1.4. 15	29.5. 15
39	IČ DUR - zabezpečenie súhlasov, verejných konaní, zmeny PS/SO, vieč.	43 dny	1.4. 15	29.5. 15
40	IČ DUR - zabezpečenie geodetických a MPV podkladov pre ÚR	43 dny	1.4. 15	29.5. 15
41	IČ DUR - podanie návrhu ÚR	1 den	1.5. 15	1.5. 15
42	IČ DUR - územné konanie	24 dny	4.5. 15	4.6. 15
43	IČ DUR - vydanie územného rozhodnutia (ÚR)	17 dny	5.6. 15	29.6. 15
44	IČ DUR - dodanie právoplatného ÚR	1 den	30.6. 15	30.6. 15
45	IČ DUR - schvaľovací proces pre DUR - ŽSR a MDVRR SR	43 dny	1.7. 15	28.8. 15
46	IČ DUR - schvaľovacie rozhodnutie MDVRR SR	1 den	31.8. 15	31.8. 15

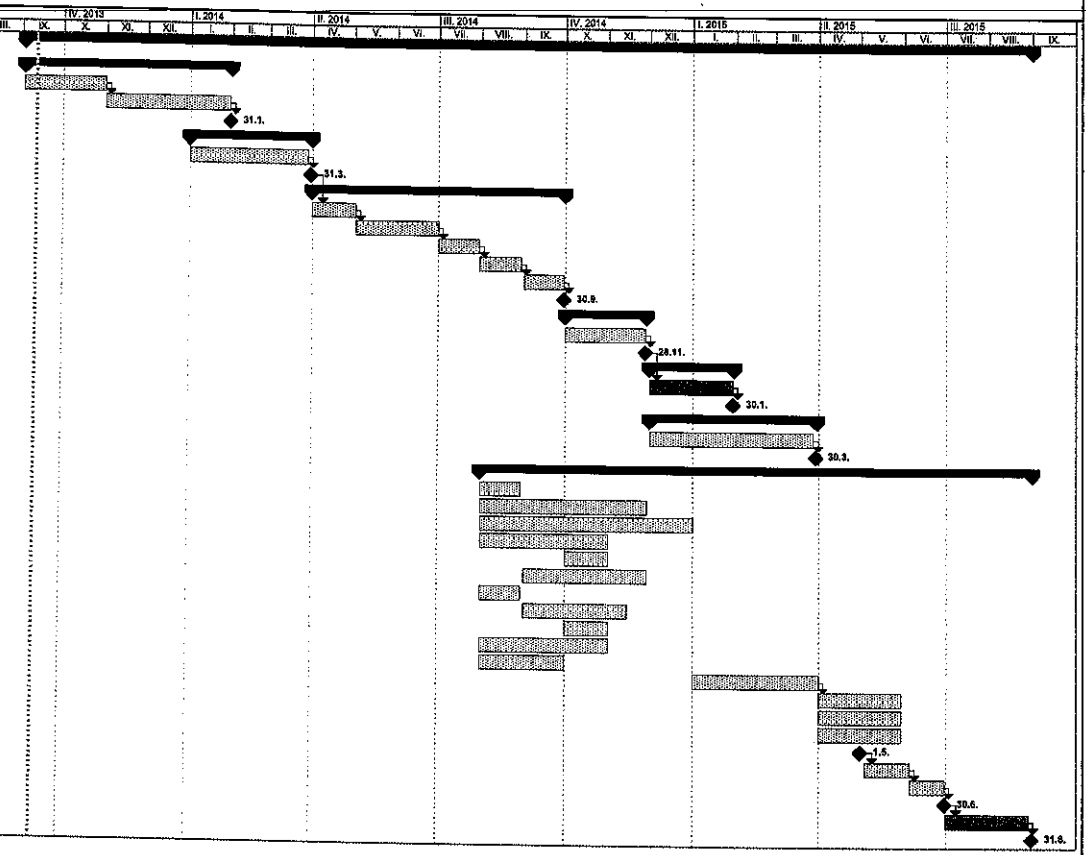

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Úkol
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník

Tmavská cesta 37, 831 04 Bratislava
