Plán činností pre stavbu Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Zhotoviteľ: Grešstav, s.r.o.

P.Č.	Kód	Popis	Dni
1		Zemné práce	6
2	1	Základy	6
3	1	Zvislé konštrukcie I.P.	11
4	2	Vodorovné konštrukcie	9
5	3	Zvislé konštrukcie II.P.	6
6	1	Konštrukcie tesárske a klampiarské	10
7	2	Výplne otvorov	4
8	2	Vodovodná prípojka	3
9	3	Kanalizacná pripojka a studňa	3
10	4	Odberné elektrické zariadenie	3
11	5	Plynová prípojka	3
12	3	Rozvody vody a kanalizácie	11
13	1	Elektroinštalácia	10
14	2	Podláhové kúrenie	5
15	1	Poter	3
16	2	Vzduchotechnika	7
17	3	Omietky	10
18	1	Kladenie dlažby a obklady	15
19	1	Maľby	5
20	2	Sanita	4
21	3	Kladenie podlahy	5
22	4	Zateplenie a zaklopenie stropov	8
23	1	Ústredné vykurovanie	7

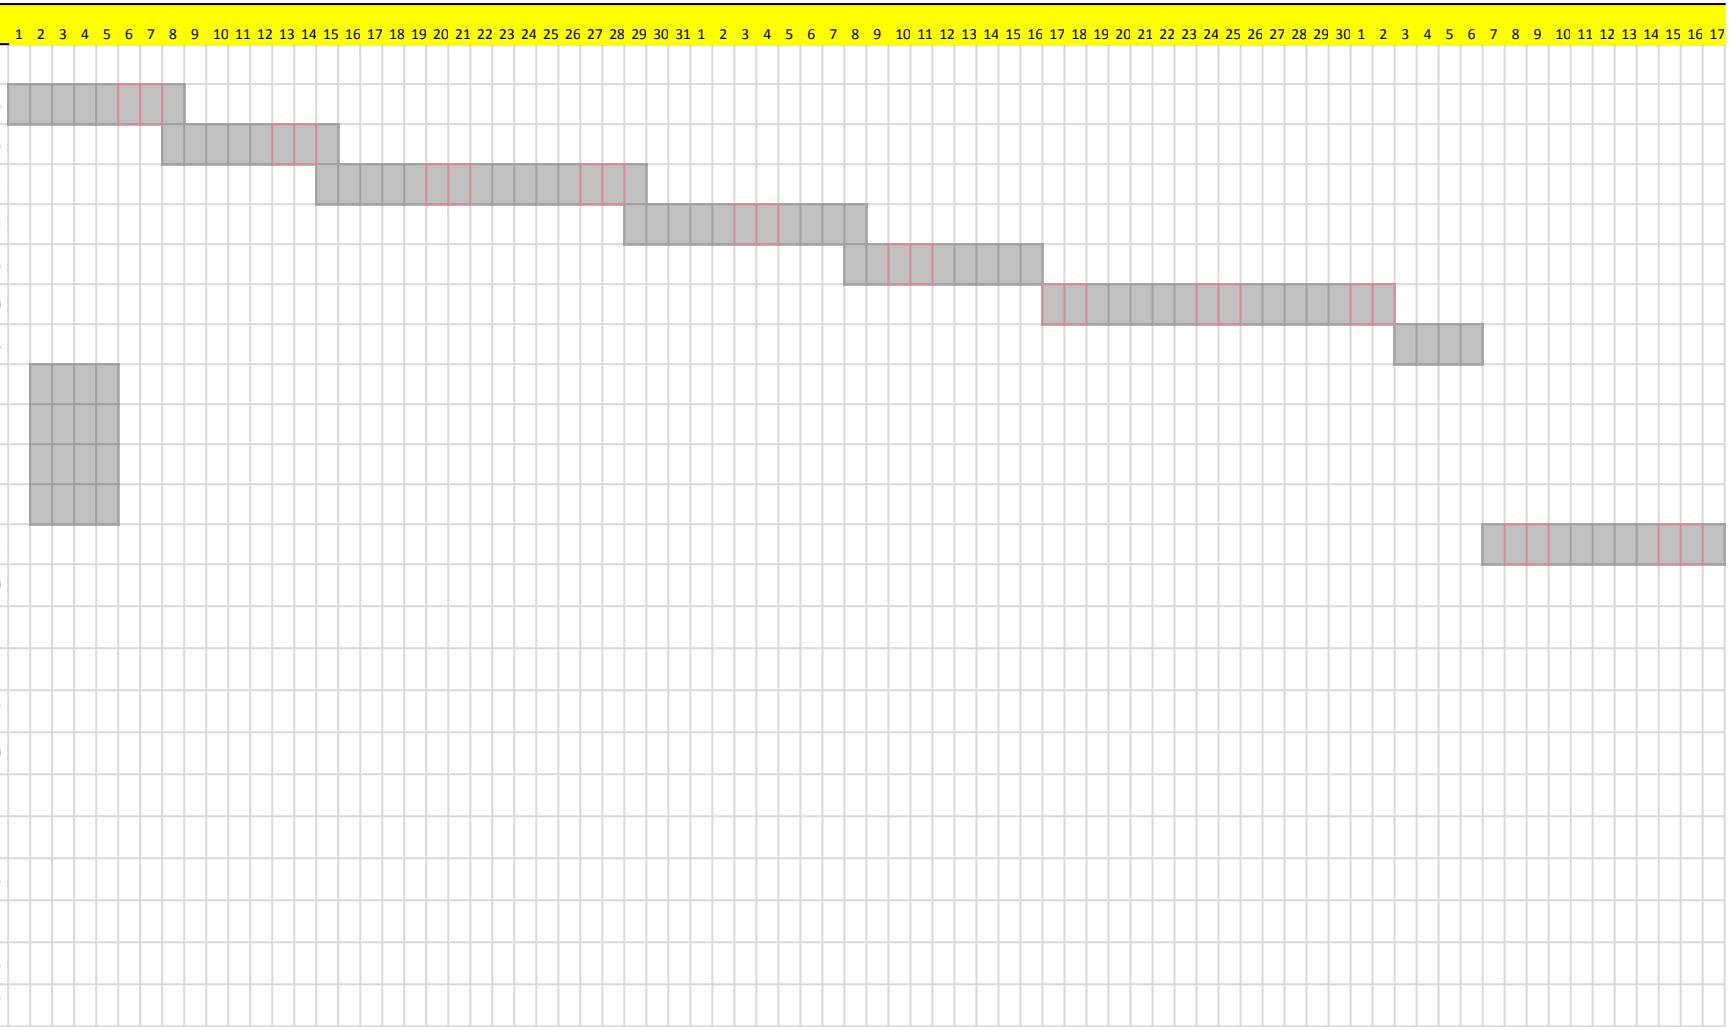

Plán činností pre stavbu Novostavba materskej školy v obci Uzovské Pekľany

Zhotoviteľ: GreŠstav, s.r.o.

P.Č.	Kód	Popis	Dni
24	2	Zateplenie obvodovej konštrukcie	16
25	3	Kompletizácia	19
26	3	Žumpa	5
27	2	Oplotenie	6
28	3	Požiarná nádrž	4
29	4	Spevnené plochy	4

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

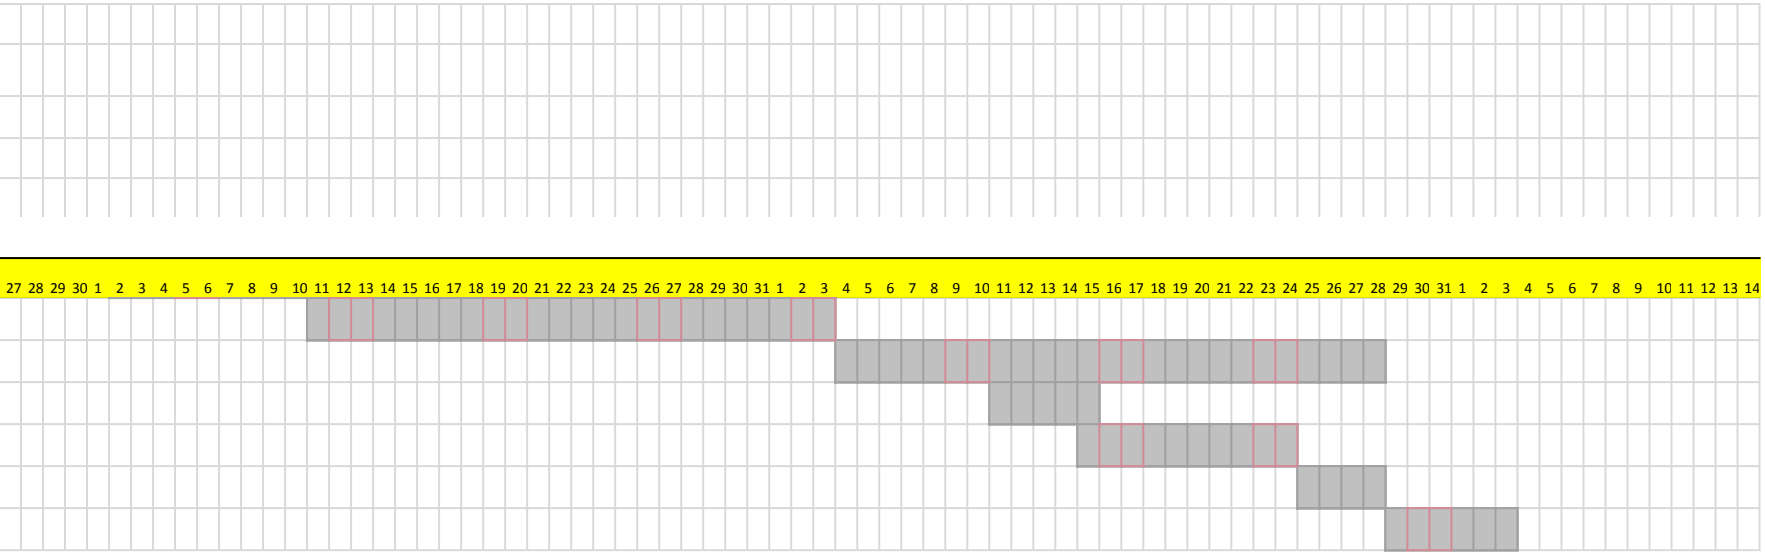
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
