Harmonogram stavby - YEMANITY s.r.o.

	Týždeň			27. T									
	Deň			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Popis	Začiatok	Koniec										
IMPORT	Priloha_c.4_vykaz vymer_ zvysenie_kapacity_MS_aktualizacia_15_03 (1)	01. 07. 2024	23. 12. 2024										
SO 01.1	Búracie práce	01. 07. 2024	13. 08. 2024										
HSV	Práce a dodávky HSV	01. 07. 2024	13. 08. 2024										
1	Zemné práce	01. 07. 2024	09. 07. 2024										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	01. 07. 2024	13. 08. 2024										
PSV	Práce a dodávky PSV	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
764	Konštrukcie klampiarske	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
766	Konštrukcie stolárske	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
776	Podlahy povlakové	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
SO 01.2	Navrhovaný stav...	01. 07. 2024	25. 11. 2024										
HSV	Práce a dodávky HSV	02. 09. 2024	20. 11. 2024										
1	Zemné práce	02. 09. 2024	10. 09. 2024										
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	11. 09. 2024	26. 09. 2024										
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	23. 09. 2024	20. 11. 2024										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	07. 10. 2024	05. 11. 2024										
99	Presun hmôt HSV	16. 09. 2024	29. 10. 2024										
PSV	Práce a dodávky PSV	01. 07. 2024	25. 11. 2024										
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	16. 09. 2024	19. 09. 2024										
713	Izolácie tepelné	30. 09. 2024	31. 10. 2024										
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
763	Konštrukcie - drevostavby	28. 10. 2024	21. 11. 2024										
764	Konštrukcie klampiarske	28. 10. 2024	06. 11. 2024										
766	Konštrukcie stolárske	28. 10. 2024	08. 11. 2024										
767	Konštrukcie doplnkové kovové	30. 09. 2024	22. 10. 2024										
771	Podlahy z dlaždíc	11. 11. 2024	15. 11. 2024										
775	Podlahy vlysové a parketové	01. 07. 2024	01. 07. 2024										
776	Podlahy povlakové	11. 11. 2024	25. 11. 2024										

781	Obklady	11. 11. 2024	21. 11. 2024
783	Nátery	01. 07. 2024	01. 07. 2024
784	Maľby	11. 11. 2024	22. 11. 2024
787	Zasklievanie	11. 11. 2024	19. 11. 2024
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	01. 07. 2024	19. 11. 2024
SO 01.3	**Zdravotechnika**	**21. 10. 2024**	**27. 11. 2024**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**21. 10. 2024**	**27. 11. 2024**
713	Izolácie tepelné	21. 10. 2024	22. 10. 2024
721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	21. 10. 2024	24. 10. 2024
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	21. 10. 2024	14. 11. 2024
725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety	18. 11. 2024	27. 11. 2024
732	Ústredné kúrenie - strojovne	21. 10. 2024	21. 10. 2024
SO 01.4	**Plynofikácia**	**21. 10. 2024**	**11. 11. 2024**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**21. 10. 2024**	**11. 11. 2024**
1	Zemné práce	21. 10. 2024	01. 11. 2024
4	Vodorovné konštrukcie	21. 10. 2024	04. 11. 2024
5	Komunikácie	28. 10. 2024	11. 11. 2024
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21. 10. 2024	06. 11. 2024
99	Presun hmôt HSV	21. 10. 2024	21. 10. 2024
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**21. 10. 2024**	**22. 10. 2024**
723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod	21. 10. 2024	22. 10. 2024
783	Nátery	21. 10. 2024	22. 10. 2024
M	**Práce a dodávky M**	**21. 10. 2024**	**23. 10. 2024**
21-M	Elektromontáže	21. 10. 2024	21. 10. 2024
23-M	Montáže potrubia	21. 10. 2024	23. 10. 2024
46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	21. 10. 2024	21. 10. 2024
OST	Ostatné	21. 10. 2024	22. 10. 2024
SO 01.5	**Vykurovanie**	**21. 10. 2024**	**18. 11. 2024**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**21. 10. 2024**	**18. 11. 2024**
713	Izolácie tepelné	21. 10. 2024	23. 10. 2024
731	Ústredné kúrenie - kotolne	21. 10. 2024	31. 10. 2024
732	Ústredné kúrenie - strojovne	21. 10. 2024	21. 10. 2024
733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	21. 10. 2024	01. 11. 2024
734	Ústredné kúrenie - armatúry	04. 11. 2024	07. 11. 2024
735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	04. 11. 2024	18. 11. 2024

HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby	21. 10. 2024	07. 11. 2024										
SO 01.6	**Elektroinštalácia**	**21. 10. 2024**	**11. 11. 2024**										
M	**Práce a dodávky M**	**21. 10. 2024**	**11. 11. 2024**										
D1	Svietidlá	28. 10. 2024	11. 11. 2024										
D2	Elektroinštalácia	28. 10. 2024	31. 10. 2024										
VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	21. 10. 2024	29. 10. 2024										
D3	Kabeláž	21. 10. 2024	28. 10. 2024										
D4	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	21. 10. 2024	24. 10. 2024										
01-Pch	**Prístupový chodník**	**21. 10. 2024**	**21. 10. 2024**										
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**21. 10. 2024**	**21. 10. 2024**										
5	Komunikácie	21. 10. 2024	21. 10. 2024										
99	Presun hmôt HSV	21. 10. 2024	21. 10. 2024										
02-Och	**Okapový chodník**	**09. 12. 2024**	**19. 12. 2024**										
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**09. 12. 2024**	**19. 12. 2024**										
4	Vodorovné konštrukcie	09. 12. 2024	19. 12. 2024										
5	Komunikácie	09. 12. 2024	09. 12. 2024										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	09. 12. 2024	10. 12. 2024										
99	Presun hmôt HSV	09. 12. 2024	09. 12. 2024										
03-Sch	**Exteriérové scho...**	**09. 12. 2024**	**23. 12. 2024**										
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**09. 12. 2024**	**23. 12. 2024**										
1	Zemné práce	09. 12. 2024	12. 12. 2024										
5	Komunikácie	16. 12. 2024	23. 12. 2024										
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16. 12. 2024	23. 12. 2024										
99	Presun hmôt HSV	09. 12. 2024	09. 12. 2024										

28. T				29. T							30. T							31. T									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7

32. T				33. T							34. T							35. T									
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4

36. T				37. T							38. T							39. T									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2

40. T				41. T							42. T							43. T									
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

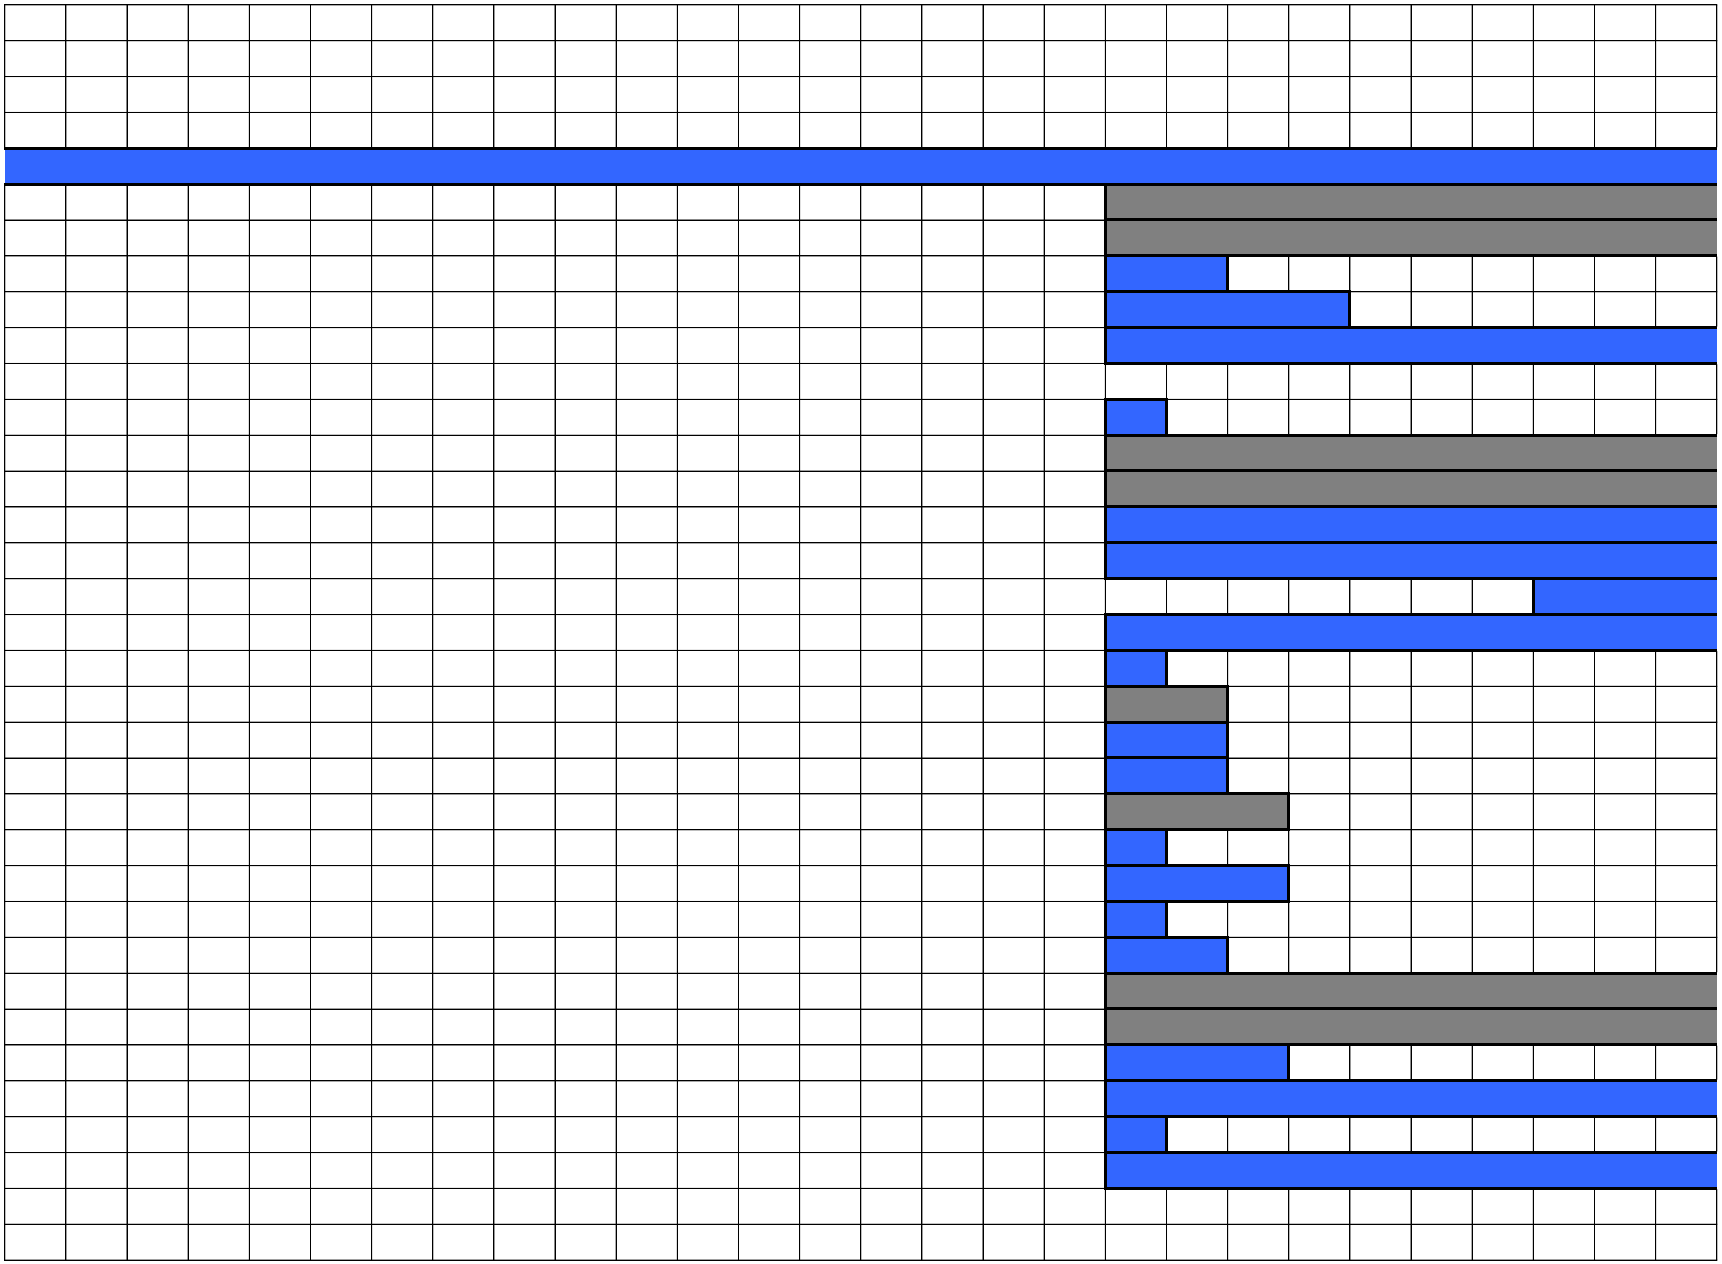

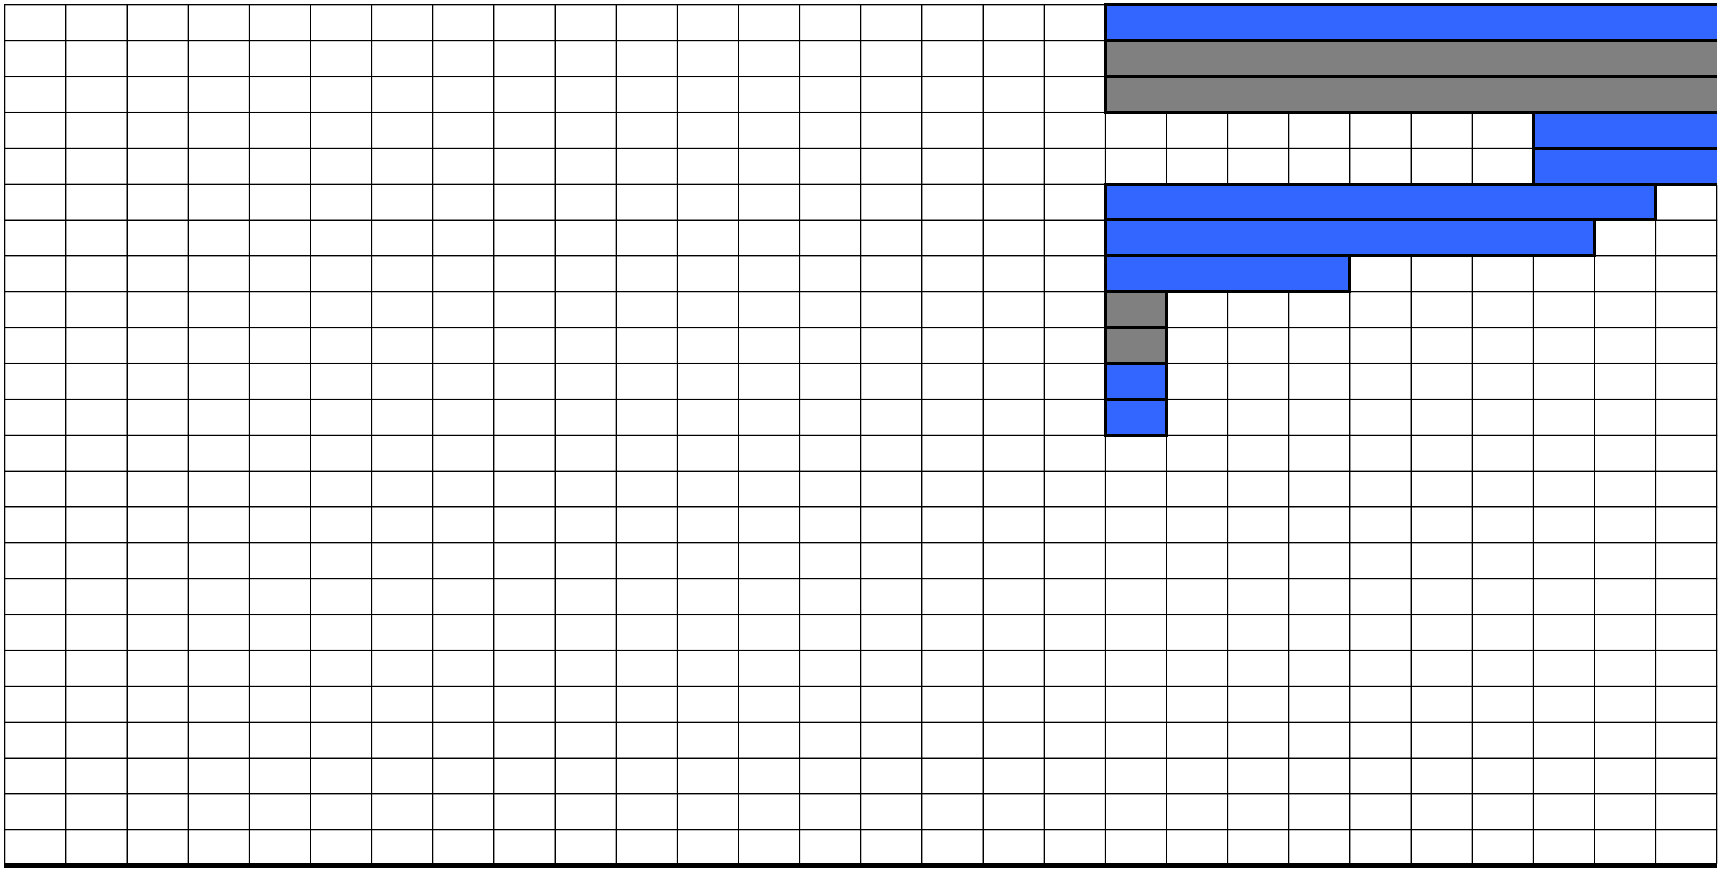

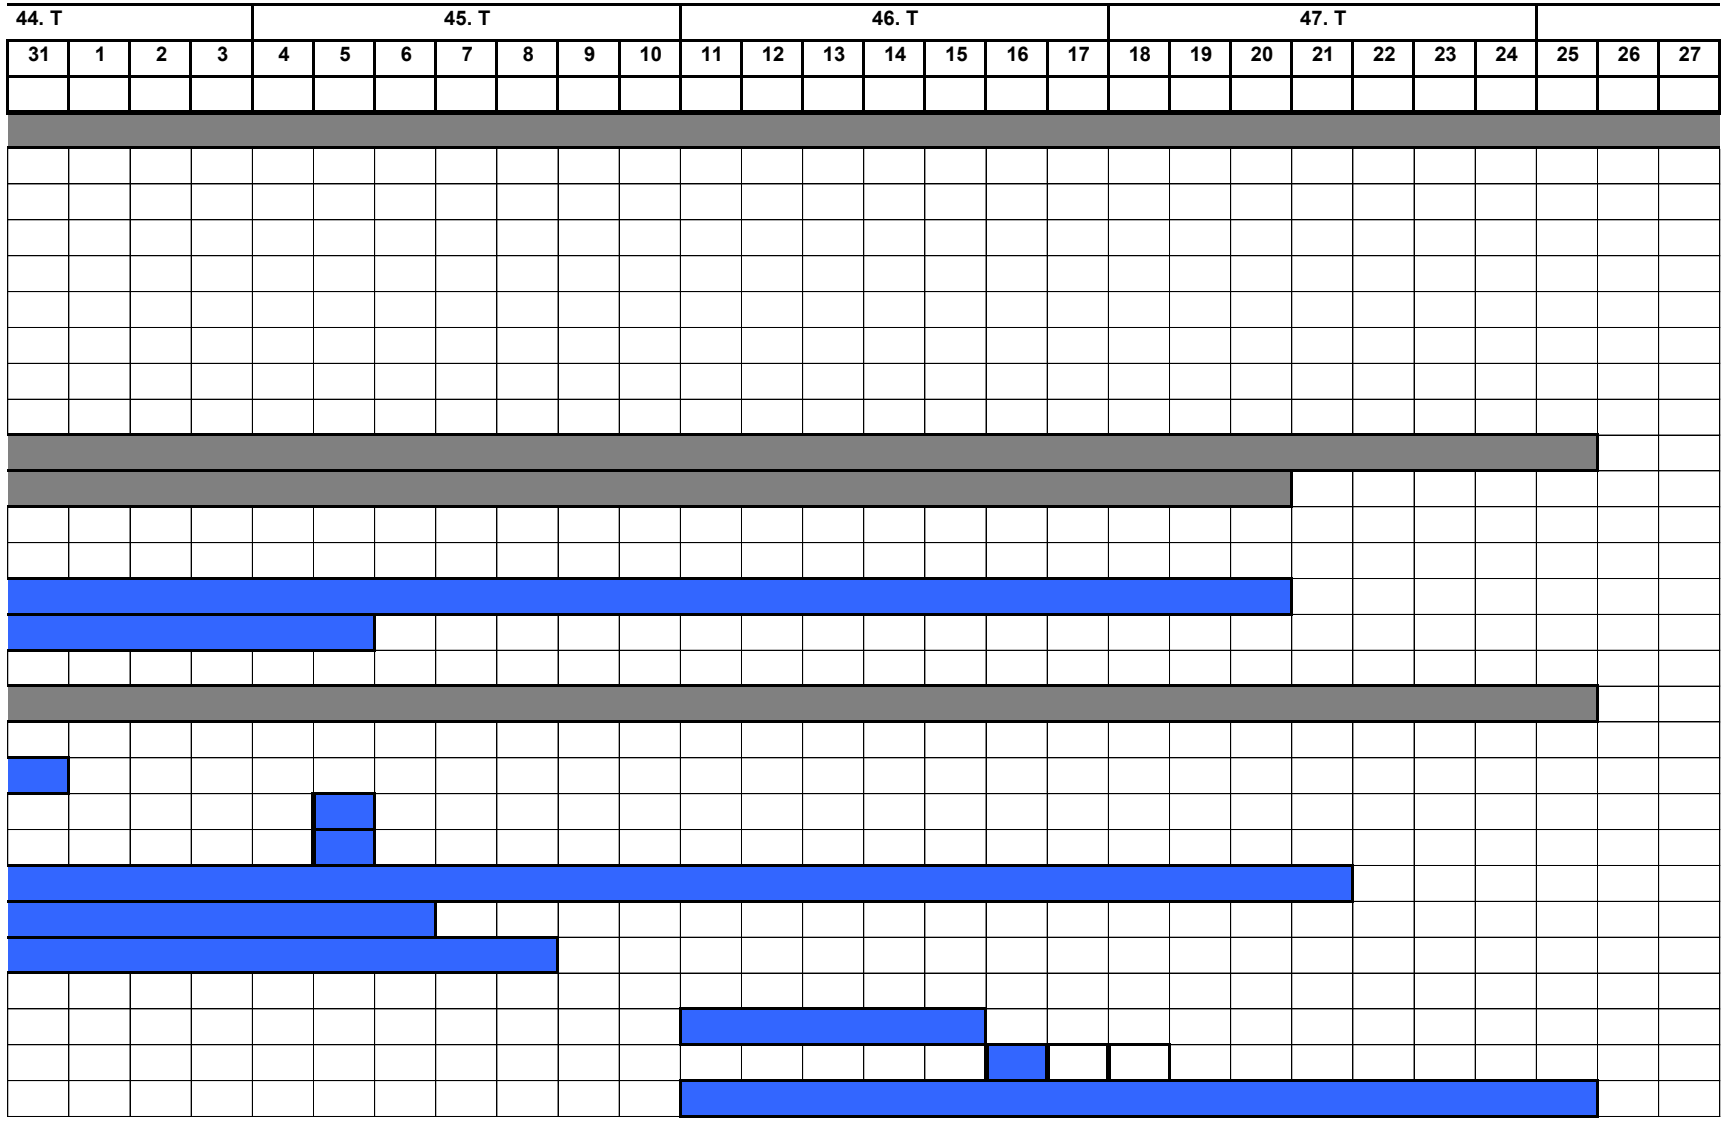
44. T
45. T
46. T
47. T
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

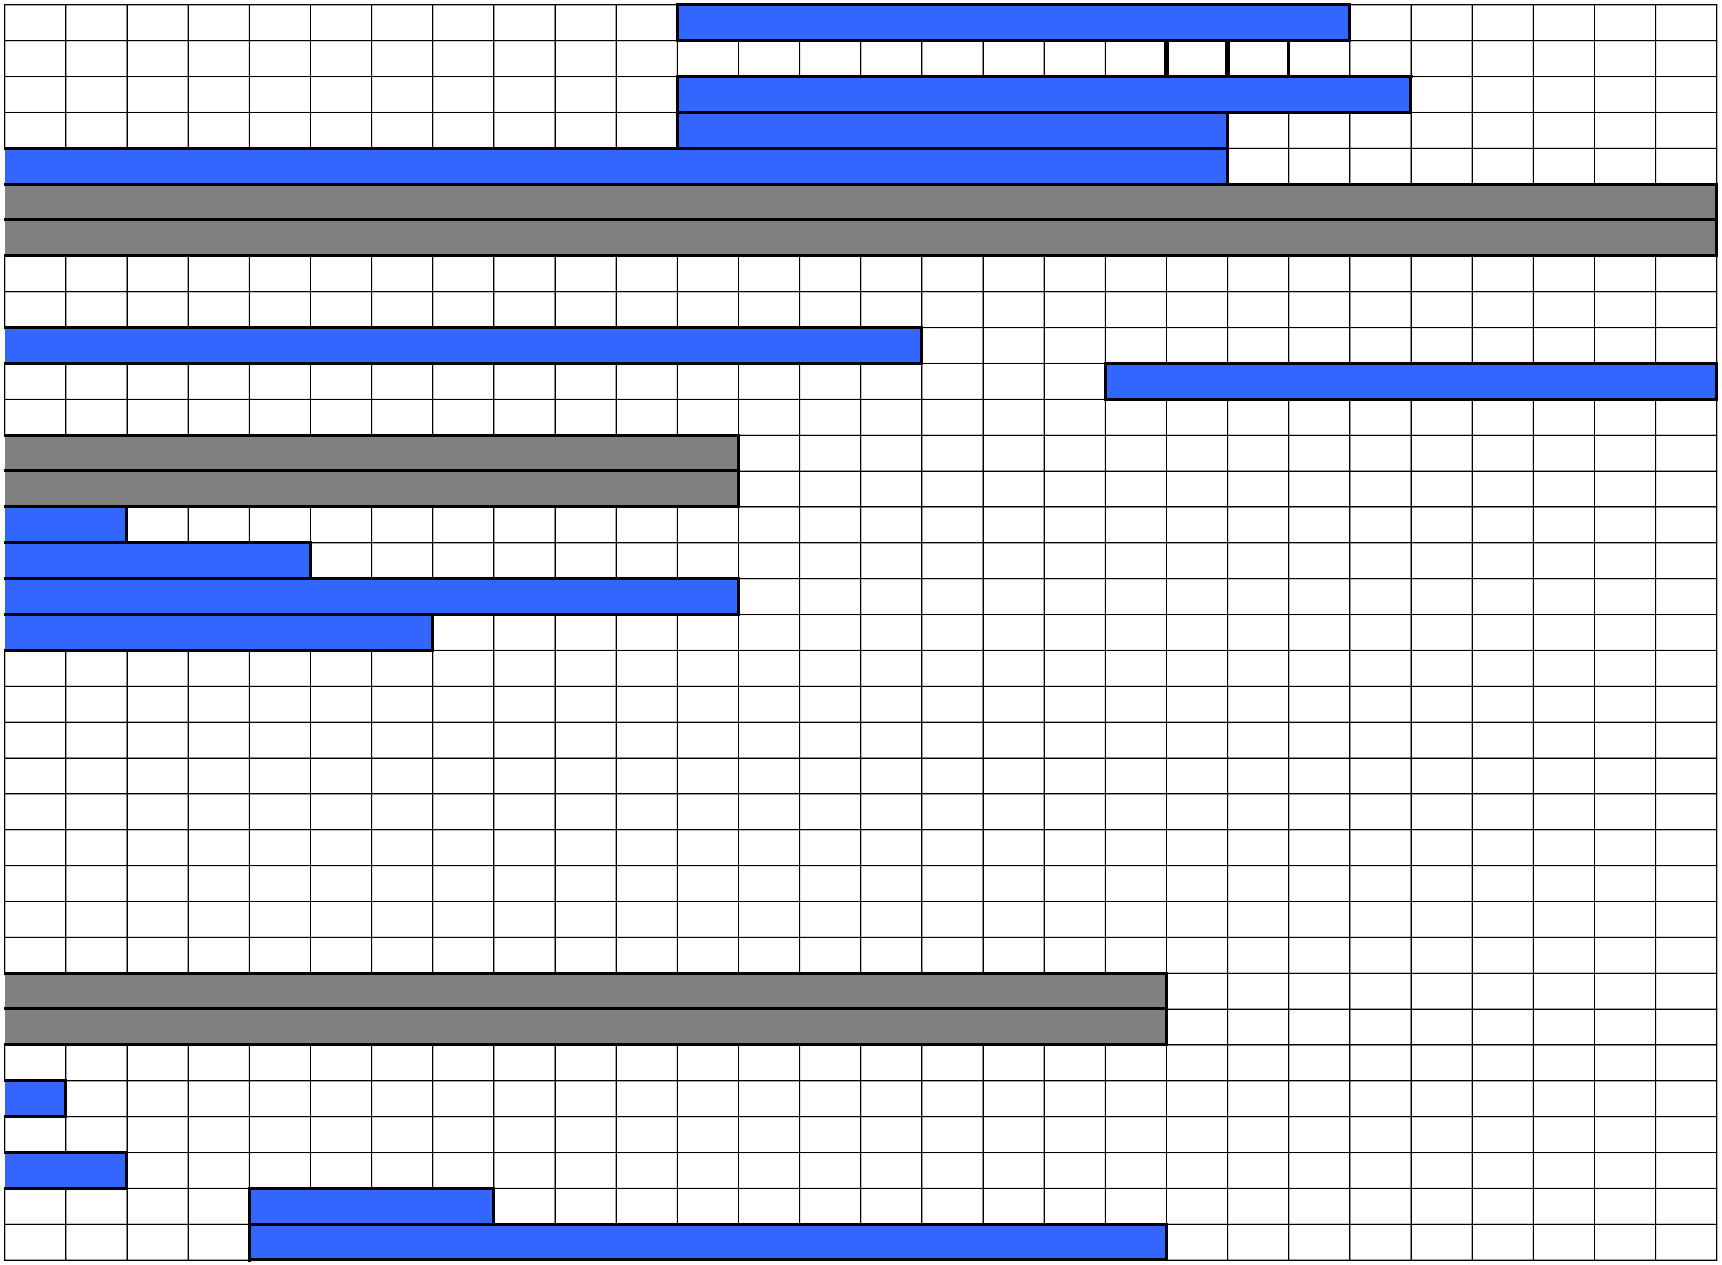

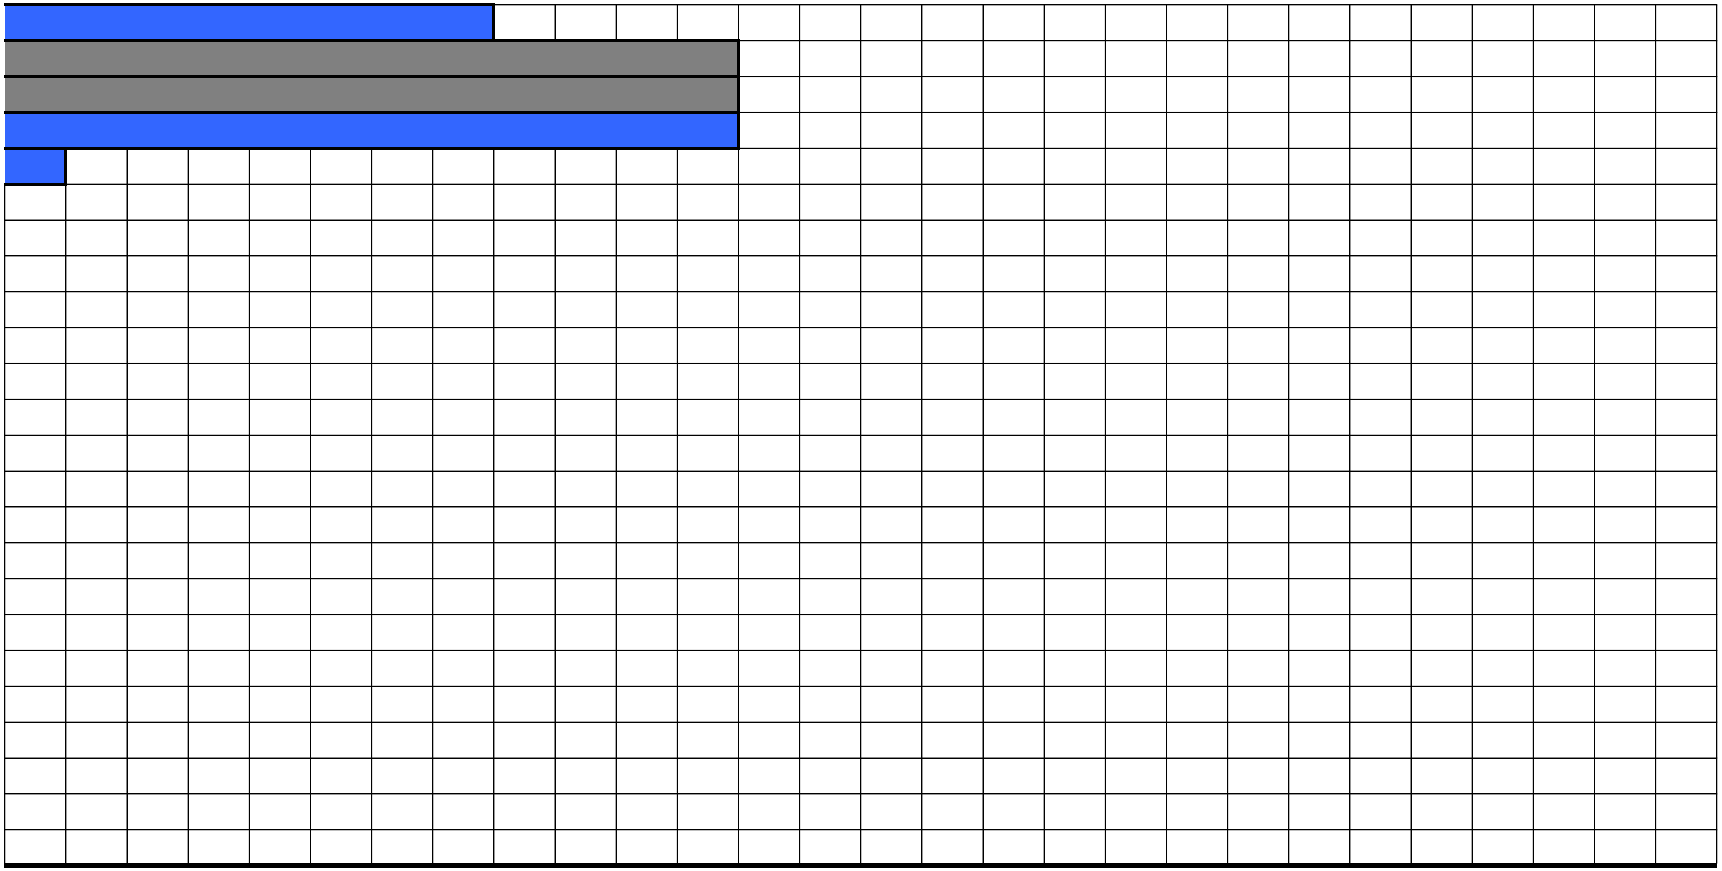
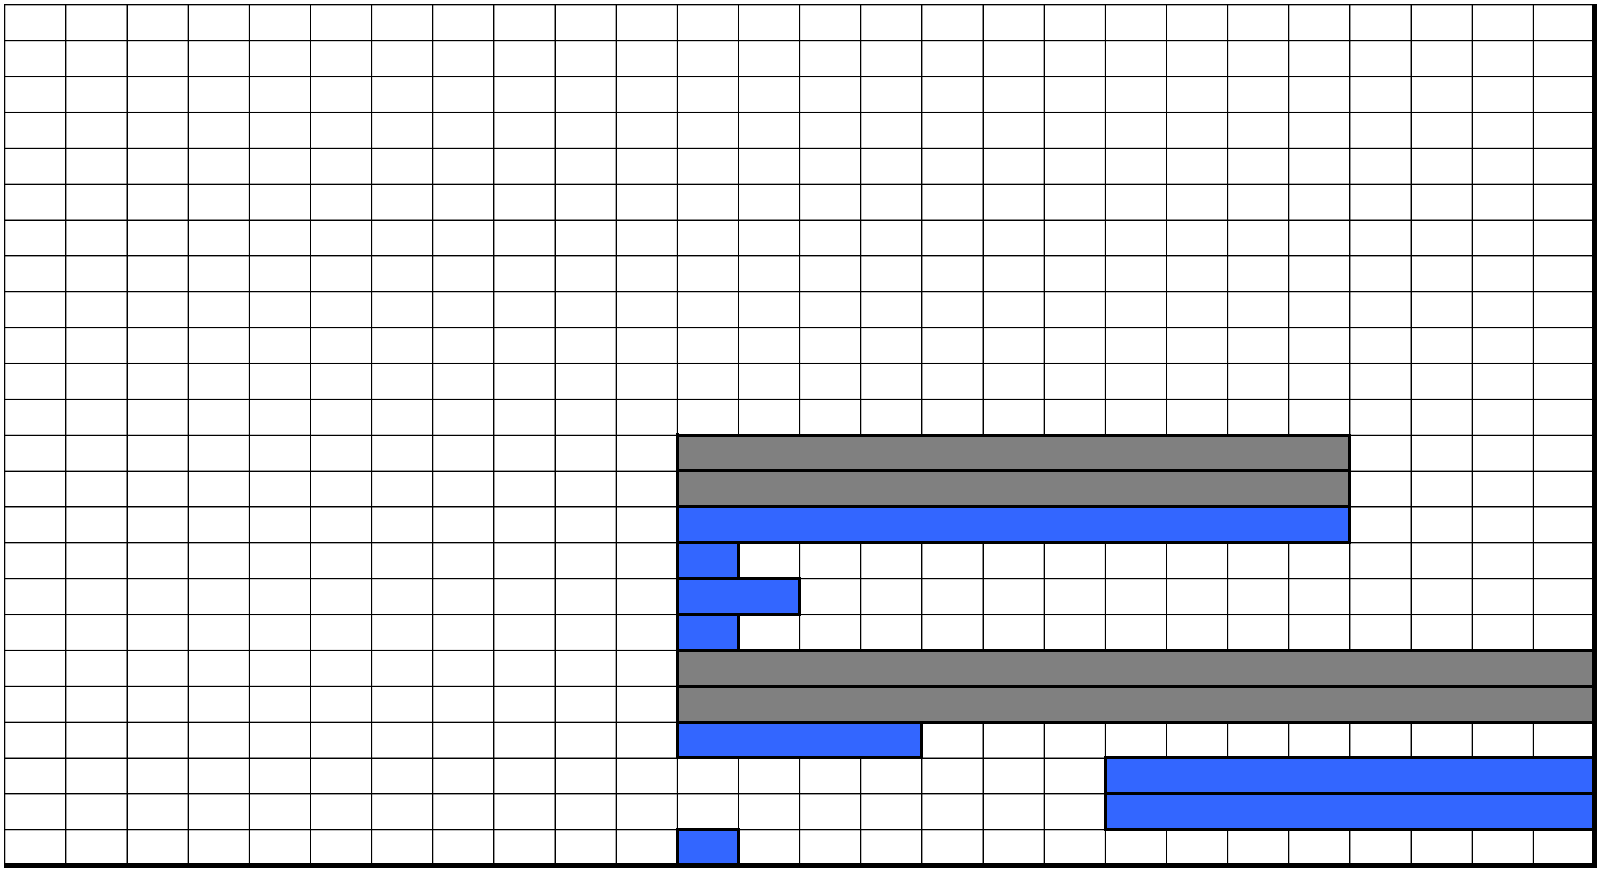
48. T				49. T							50. T							51. T							52. T
28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
