



00823592

ZMLUVA O DIELO

ZM/2018/0323

Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1 v km 32,000 – 32,250 vpravo.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

č. objednávateľa :

č. zhotoviteľa :

1. Objednávateľ:
Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť,
zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa,
vložka č. 3518/B
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT kód:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 2021937775
DIČ: 2021937775
Štatutárny orgán: Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:
- o veciach technických:
- pre skúšanie a kvalitu:
- o veciach cenových:

Technický dozor:
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Názov: Združenie: „ALPINE R1 2018“
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. – vedúci člen skupiny
Sídlo: Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Peter Russegger, konateľ
Ing. Michal Kocián, konateľ
IČO: 34 112 103
IČ DPH: SK2020358021

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Tel./Fax:

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:
- o veciach technických:
- o veciach cenových:

a

Názov: ALPINE Bau CZ a.s. – člen skupiny
Sídlo: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, ČR
Právna forma: akciová spoločnosť

Štatutárny orgán: Ing. Peter Russegger, predseda predstavenstva
Miroslav Dorňák, člen predstavenstva

IČO: 026 04 795

DIČ: CZ02604795

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Tel./Fax:

Osoby oprávnené rokovať

- o veciach zmluvných:
- o veciach technických:
- o veciach cenových:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, **touto zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami** dielo, ktorým sú: **Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1 v km 32,000 – 32,250 vpravo** (ďalej len „dielo“), a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včasné vykonanie diela cenu uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP sú uvedené na webovej stránke
- 1.2. Zmenu rozsahu alebo obsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadaním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Cenu diela uvedenú v čl. 3 tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť v súlade s ustanovením § 18 ZVO, ak navyše práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Článok 2

Miesto a čas plnenia

- 2.1 Miestom plnenia, resp. vykonávania diela je rýchlostná cesta R1 Báb – Nitra západ v km 32,000 – 32,250 vpravo, v katastrálnom území Veľké Zálužie.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná stavebné práce na diele v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, a to najneskôr do 65 dní odo dňa začatia vykonávania stavebných prác na diele.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele nasledujúci kalendárny deň po dni, v ktorom bolo písomne odovzdané a prevzaté stavenisko, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na okamžité odstúpenie od zmluvy.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska e-mailom na adresu: najneskôr 5 dní pred termínom odovzdania. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať v deň uvedený v liste podľa predchádzajúcej vety. Podmienkou pre odovzdanie staveniska je schválenie kontrolného a skúšobného plánu a počiatočných skúšok typu laboratóriom objednávateľa v súlade s Technicko-kvalitatívnymi podmienkami. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť tento kontrolný a skúšobný plán na schválenie najneskôr do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa

- zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi zápisom do stavebného denníka.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezprostredne po oznámení o ukončení stavebných prác zaslať objednávateľovi výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 15 dní odo dňa ohlásenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
- 2.7 Termín zápisničného odovzdania a prevzatia diela podľa čl. 7 tejto zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi po doručení výzvy na začatie preberacieho konania.
- 2.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele nepretržite 7 dní v týždni (pracovné dni, soboty, nedele a štátne sviatky).
- 2.9 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty na vykonanie stavebných prác na diele. Predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie stavebných prác na diele zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškание v zmysle čl. 9 tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci. Výslovne sa stanovuje, že vyššou mocou nie je štrajk personálu zhotoviteľa ani hospodárske pomery zmluvných strán.

Článok 3 Cena za dielo

- 3.1 Cena za vykonanie diela (čo do rozsahu a množstva) je totožná s ponúkanou cenou zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Prijaté jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1 – Špecifikácia ceny (ocenený výkaz výmer) sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy, bez nároku na úpravy jednotkových cien a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena za dielo bez DPH: 168 080,83 €

DPH 20%: 33 616,17 €

Cena za dielo vrátane DPH: 201 697 €

Slovom: Stošesťdesiatosemtisícosemdesiat eur/ osemdesiattri centov bez DPH

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 1 tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je dohodnutá v rozsahu objednávateľom predložených súťažných podkladov a výkazu výmer, oceneného zhotoviteľom v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Pri ocenení nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri uzavretí tejto zmluvy, budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Článok 4 Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce na diele. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených do sídla objednávateľa.
- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Súpis technický dozor potvrdí po predložení protokolov zhotoviteľa o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí (preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok), ktoré budú odsúhlasené povereným pracovníkom laboratória objednávateľa. Súpis potvrdený technickým dozorom je zhotoviteľ povinný doložiť ako prílohu ku každej faktúre.
- 4.4 Po vykonaní diela v termíne do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru. Súčasťou konečnej faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný oboma zmluvnými stranami, rekapitulácia súpisu skutočne vykonaných prác a prehlásenie zhotoviteľa ku konečnej faktúre, že cena diela predstavuje požadovanú konečnú platbu. Mesačné faktúry aj konečná faktúra budú vystavené v plnej čiastke.
- 4.5 Pri úhrade každej mesačnej faktúry zadrží objednávateľ 10 % z fakturovanej sumy bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená vo faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 4.6.1 Objávateľ uvoľní zádržné po podpísaní preberacieho protokolu a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov podľa bodu 4.6.2, vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy, a zároveň za predpokladu, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2 tohto článku zmluvy. Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú objednávateľ požaduje, a to v prípade, ak zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávateľ vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 4.6.2 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, sú zádržné a banková záruka určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi bankovú záruku v zmysle bodu 4.6.1 tohto článku, objednávateľ uvoľní zádržné v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi po uplynutí záručnej doby diela a to len v prípade, že nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2 tohto článku.

- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle bodu 4.6 tohto článku uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.
- 4.8 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.9 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „Zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) Zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.
- 4.10 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

Článok 5

Podmienky vykonávania diela

- 5.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na vykonanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s vykonaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.
- 5.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 5.3 Počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne na základe dodatku k tejto zmluve. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objávateľ má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov

- verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nespĺnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné Údaje nového subdodávateľa.
- 5.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
- 5.6 Pred začiatkom vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami, ak takéto nedostatky existujú.
- 5.7 Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 5.8 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, uvedený v čl. 6 bod 6.1 tejto zmluvy.
- 5.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonať žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 5.10 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 5.11 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO.
- 5.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci a predpisy o ochrane životného prostredia.
- 5.13 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie prevádzky na rýchlostnej ceste.
- 5.14 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 5.15 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o odpadoch“) je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä nie však výlučne o povinnosti držiteľa odpadu

podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a Vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

- 5.16 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ povinný všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 5.17 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu objednávateľovi nahradiť.
- 5.18 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR v zmysle § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 5.19 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoj zavinený zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.

Článok 6

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe

- 6.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho _____, v jeho neprítomnosti _____, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavení faktúr.
- 6.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora svojho zamestnanca _____ v jeho neprítomnosti svojho zamestnanca _____ zastupujúcich objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, preberaní diela resp. jeho ucelenej časti a kontrole vystavených faktúr.
- 6.3 Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a technického dozora sú obe strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
- 6.4 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 písm. g) ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinností a zodpovedností za činnosť stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybratého zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

- 6.5 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom tejto zmluvy v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnenne zdržiavajú na území členských štátov.
- 6.7 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

Článok 7

Preberanie diela

- 7.1 Preberanie diela bude vykonané v súlade so súťažnými podkladmi a s požiadavkami technicko - kvalitatívnych podmienok v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadna konštrukčná časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek konštrukčnú časť diela pred jej zakrytím. O prevzatí jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 7.2 Najneskôr 5 dní pred začatím preberacieho konania (čl. 2, bod 2.7 zmluvy) zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi na kontrolu kompletnosti dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) - opečiatkovanú a podpísanú povereným zástupcom zhotoviteľa, správu o hodnotení kvality prác odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa, stavebný denník s rekapituláciou výmer skutočného realizovania prác, geodetickú dokumentáciu - zameranie skutočného vyhotovenia 1x v tlačenej forme a 2x v elektronickej forme vo formáte 1 x DWG (DGN) a 1 x PDF.
- 7.3 Objednávateľ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho-odovzdávacieho konania.
- 7.4 Za riadne vykonané dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez vád a v súlade so súťažnými podkladmi, kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, technicko-kvalitatívnymi podmienkami a technickými normami.
- 7.5 V prípade, že po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie vád, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.

- 7.6 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 7.5 tohto článku, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Článok 8

Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 8.1 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na celé dielo záručnú dobu v dĺžke **60 mesiacov**.
- 8.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa na základe preberacieho protokolu podľa čl. 7 bod 7.6 tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 15 dní, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám, uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho užívania.
- 8.4 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 7 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady aj s odôvodnením v uvedenej 7-dňovej lehote.
- 8.5 Ak zhotoviteľ napriek reklamácií objednávateľa neodstráni vady v lehote podľa bodu 8.2 tohto článku, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 8.6 Vady diela je objednávateľ povinný uplatniť najneskôr do konca záručnej doby.
- 8.7 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 8.8 Pred uplynutím záručnej doby objednávateľ písomne zvolá hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou zmluvných strán. Z prehliadky sa vyhotoví Protokol o ukončení záručnej doby obsahujúci vyhodnotenie stavu diela ku koncu záručnej doby.

Článok 9

Zmluvné sankcie

- 9.1 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne vykonávať stavebné práce na diele podľa čl. 2 bod 2.3 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác na diele v súlade s čl. 2 bodom 2.2 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní harmonogramu prác má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

- 9.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa bodu 7.5 čl. 7 zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.5 V prípade, ak počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržiava kvalitatívne parametre určené na dielo podľa technicko-kvalitatívnych podmienok, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou. V prípade, ak si objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu, je oprávnený požiadať zhotoviteľa o predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku, pričom zhotoviteľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Takéto predĺženie záručnej doby na dielo sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 9.6 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v bode 2.8 čl. 2 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 9.7 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.8 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to samostatne za každé porušenie povinnosti.
- 9.9 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 9.10 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, ktorá mu vznikla najmä prípravou a zabezpečením miesta plnenia pozostávajúcou v osadení dočasného dopravného značenia alebo inými na realizáciu diela nadväzujúcimi činnosťami. Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.

Článok 10

Ukončenie zmluvy

- 10.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy alebo výpoveďou objednávateľa.
- 10.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 10.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 10.4 Objávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom, a to najmä v prípadoch:
- 10.4.1 ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- 10.4.2 ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.3, 5.1 až 5.5, 5.9, 12.2 alebo 12.3,
- 10.4.3 ak je zjavné, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,

- 10.4.4 v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 10.5 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.
- 10.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou v zmysle predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 10.7 Nepodstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa je najmä:
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa tejto zmluvy, súťažných podkladov a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom
 - ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní
 - ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v čl. 2 zmluvy okrem lehoty podľa bodu 2.3
- 10.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa), alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávatel má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii zhotoviteľ predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Článok 11

Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne, okrem prípadov, keď je v zmluve výslovne uvedené inak. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte (príp. iného poštového podniku), za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte (príp. iného poštového podniku). V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty (príp. iného poštového podniku) „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Článok 12

Ostatné ustanovenia

- 12.1 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a zhotoviteľ nie je oprávnený kopírovať alebo sprístupniť tretej strane akékoľvek údaje, informácie alebo autorské diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorú mu poskytol objednávatel' okrem prípadov, keď je to nutné pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 12.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva), vyplývajúce z tejto zmluvy, na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatel'a.

- 12.3 Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné vedenia ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble a podobné, povinný písomne požiadať vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je navyše povinný overiť si u správcov existenciu prípadných inžinierskych sietí, položených v období po dokončení projektovej dokumentácie. Náklady, spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša zhotoviteľ.

Článok 13 **Záverečné ustanovenia**

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 13.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dva (2) rovnopisy.
- 13.3 Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o ukončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o zrušení zmluvy nedošlo.
- 13.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 13.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Špecifikácia ceny
Príloha č. 2 Harmonogram prác
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 Opis predmetu zákazky časť B.1 súťažných podkladov
- 13.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa prípadne vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave dňa: 8.8.2018

V Bratislave dňa: **20. 09. 2018**

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Juraj Pojezdál
na základe plnej moci


Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudák, PhD.
podpredseda predstavenstva

Rekapitulácia stavby, Súpis prác

Stavba: Sanáčné opatrenia na zabezpečenie zosuvu násypového svahu na R1 km 32,000 - 32,250 vpravo
 Stavbný objekt: Sanáčné opatrenia na zabezpečenie zosuvu násypového svahu

P.Č.	KP	Kód položky	Úplný popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena bez DPH	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	45.00.00	113	Zmluvné požiadavky - Dokumentácia skutočného realizovania stavby	ks	2,00	1 705,93	3 411,86
2	45.00.00	112	Zmluvné požiadavky - Poplatky za skládky	t	920,00	0,00	0,00
3	45.00.00	111	Zmluvné požiadavky - Poistenie - Zodpovednosť za škody	kpl	1,00	1 568,67	1 568,67
4	45.11.11	05030304022400	Výhranie obrub betónových, s vybraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok z krajinikov, obrubníkov stojatých -0,145 t	m	280,00	15,50	4 340,00
5	45.11.11	05030161032400	Odstránenie krytív s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo do 200 m ² , z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m ²	10,00	28,89	288,90
6	45.11.11	05030264042430	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo nad 200 m ² , z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy 300 do 400 mm -0,560 t	m ²	530,00	12,49	6 619,70
7	45.11.11	05030261032400	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v ploche jednotlivo do 200 m ² , z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m ²	150,00	28,89	4 333,50
8	45.11.11	05090462024210	Odstránenie asfaltov, podkladu alebo krytú frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok ploch nad 500 m ² na jednom mieste alebo pruhu šírky nad 750 mm, bez prekážok v trase hr. 50 mm -0,127 t	m ²	1 730,00	2,87	4 965,10
9	45.11.11	05030407002410	Rozobranie a odstránenie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou a s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 10 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zášepným jám po odstránení stĺpoch a s jeho zhutnením zvodidla v š. stĺpkov s jednou pásnicou -0,042 t	m	280,00	16,72	4 681,60
10	45.11.11	05090461032400	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu betónového, hĺbky nad 150 do 200 mm	m	285,00	7,31	1 937,15
11	45.11.11	05090462022400	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu asfaltového, hĺbky nad 50 do 100 mm	m	800,00	2,10	1 680,00
12	45.11.21	01030202030010	Híbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna do predpísaného profilu a spádu, s príp. nutným prehodnením výkopu na vzdial. do 3 m vo výkopisku, s prehodnením výkopu na príťažom teréne na vzdial. do 5 m od pozdžnej osi rýhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100 m ³	m ³	95,00	31,82	3 022,90
13	45.11.21	01030301030010	Híbenie šacht zapážených s prípadným nutným premiestnením výkopu vo výkopisku s prehodnením výkopu na príťažom teréne na vzdialenosť do 5 m od hrany šachty alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100 m ³	m ³	40,00	54,16	2 166,40
14	45.11.23	01080503020010	Výsev trávniku hydrosevom na hlušinu	m ²	102,00	5,35	545,70
15	45.23.11	01080402010010	Svahovanie trvalých svahov do projektovaných profilov, s potrebným premiestnením výkopku pri svahovaní násypu	m ²	102,00	12,88	1 313,76
16	45.23.11	01020200030010	Odkopávky a prskopávky nezapažené s prehodnením výkopku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok v hornine 4 do 100 m ³	m ³	73,00	48,43	3 535,39
17	45.23.11	11280301071810	Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení z cementu portlandského alebo troskoportland., dno alebo steny šacht kanalizačných hr. nad 200 mm, z prostého betónu C 30/37	m ³	9,00	361,48	3 252,72
18	45.23.11	32200203010030	Filterné vrstvy akékoľvek hrúbky a sklonu z hrubého drveného kameniva bez zhutnenia, zrnitosti 63-125 mm	m ³	10,00	56,45	564,50
19	45.23.11	22040617011020	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. B 7, š z prefabrikátov celkovej šírky rigolu do 1030 mm	m	105,00	62,90	6 604,50
20	45.23.11	01040202010040	Úlož. sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním, zhutnených s uzavretím povrchu násypu s predpís. mlerou zhutnenia v % vysl. skúšok Proctor-Standard(PS) z hornín súdržných od 100 do 102% PS	m ³	73,00	7,00	511,00
21	45.23.12	22250362010010	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového s jednou pásnicou, s osadením stĺpkov so zabaranením stĺpkov pri vzdialenosti 2 m	m	280,00	17,82	4 989,60
22	45.23.12	22251661022531	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO DRAIN z polymbetónu s krycím roštom, šírky do 50 cm, do bet. lôžka C 25/30, triedy zaťaženia D 400	m	283,00	214,23	60 834,49
23	45.23.12	22030641010020	Koberiec asfaltový modifikovaný mastixový SMA 11 O tr. I. stredozrný po zhutnení hr. 40 mm	m ²	435,00	14,03	6 103,05
24	45.23.12	22030330030010	Postrek živičný spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m ²	m ²	865,00	0,63	468,45
25	45.23.12	22030329010040	Postrek živičný infiltrčný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,00 kg/m ²	m ²	355,00	0,60	213,00
26	45.23.12	22010204000060	Spevnenie krajnic alebo komunikácií pre peších s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení štrkodrvinou hr. 100 mm	m ²	280,00	6,12	1 713,60
27	45.23.12	22251083022070	Dilatačné škáry rezané pozdžne, tesnenie škár dvojnásobným penetračným náterom a s gumenou podložkou pod zálievkou, zálievkou za studena	m	1 630,00	16,50	26 895,00
28	45.23.12	22030640040030	Betón asfaltový modifikovaný PMB 45/80-75 s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení, tr.I stredozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 60 mm	m ²	395,00	17,83	7 042,85
29	45.23.12	22030640040020	Betón asfaltový modifikovaný PMB 45/80-75 s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení, tr.I stredozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr. 60 mm	m ²	708,00	14,73	10 428,84
						EUR	158 080,83
						EUR	33 616,17
						EUR	201 697,00

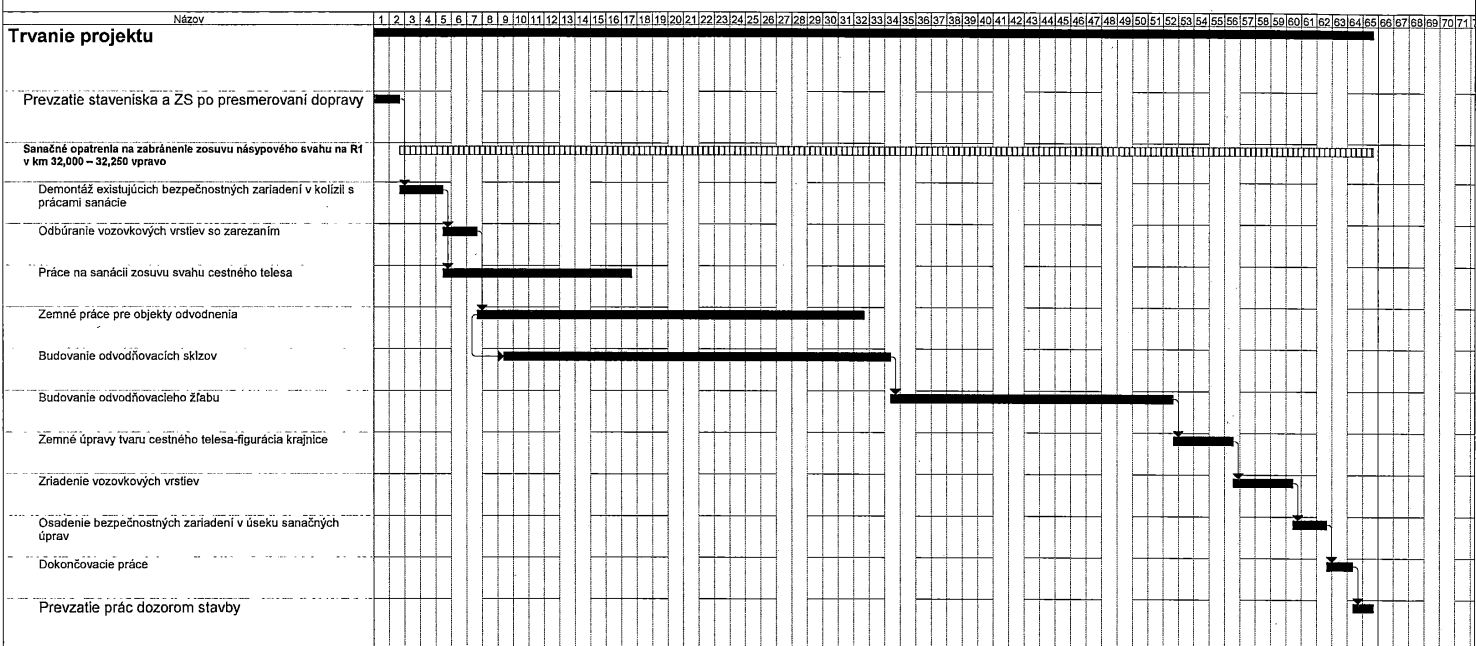

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	% podiel subdodávok
1.				
2.				
3.				

Nevzťahuje sa.

V Bratislave dňa 8.8.2018

Meno, priezvisko a podpis uchádzača resp. štatutárneho zástupcu:
Ing. Juraj Pojezdál, na základe plnej moci

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. PREDMET ZÁKAZKY:

- 1.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce „Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1 v km 32,000 – 32,250 vpravo“
- 1.2 Obsahom stavebných prác je riešenie sanácie, vodnou eróziou poškodeného násypového svahu na rýchlostnej ceste R1 v km 32,000 – 32,250 vpravo a stavebno-technické opatrenia na odvedenie dažďových vôd z koruny pozemnej komunikácie.

Opis a rozsah stavebných prác je uvedený v nasledovných prílohách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou časti B.1 súťažných podkladov:

a.) Dokumentácia na ponuku

Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky doplnky k súťažným podkladom vydané v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace s akýmkoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného výkazu výmer. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s **pisomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov**. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.

1.3 Miesto vykonania prác:

Rýchlostná cesta R1 úsek Báb – Nitra západ v km 32,000 – 32,250 vpravo.

2. ROZSAH PRÁC A TERMÍNY PLNENIA

2.1 Termín plnenia predmetu obstarávania:

Predpokladaná lehota trvania prác: **do 65 dní odo dňa odovzdania staveniska**. Z klimatických dôvodov a povahy predmetu zákazky/diela je predmet zákazky/dielo možné vykonať v období od 01.04. do 31.10. kalendárneho roka (ďalej aj len „sezóna letnej údržby“). Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať podľa vopred vypracovaného harmonogramu prác, ktorý musí zahŕňať všetky práce podľa súťažných podkladov - grafický harmonogram prác (riadkový graf), so stručným popisom hlavných činností, postupnosťou a časovou návaznosťou prác, ktorý reprezentuje návrh zhotoviteľa na vyhotovenie diela a ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy.

2.2 Cena prác :

Cena prác bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena bude obsahovať náklady na všetky nevyhnutné úkony, potrebné na vykonanie danej technológie, podľa popisovníka položiek.

3. TECHNICKÉ A KVALITATÍVNE PODMIENKY A POŽIADAVKY

3.1 Popis súčasného stavu predmetu obstarávania

Súčasná pozemná komunikácia je vedená v predmetnom úseku, v pravotočivom oblúku, v násype výšky od 11,0 do 1,5 m. Počas užívania rýchlostnej cesty došlo na pravom jazdnom páse k zosuvu častí násypového telesa a k poškodeniu vybudovaných dvoch sklzov. Na usmernenie a odvedenie dažďových vôd nepostačuje ani dodatočne osadený obrubník pri krajnici rýchlostnej cesty.

3.2 Spôsob vykonania práce

- 3.2.1 Jedná sa o stavebné práce na rýchlostnej ceste R1 Báb – Nitra západ v km 32,000 – 32,250 vpravo v katastrálnom území Veľké Zálužie.

3.2.2 Realizácia zahŕňa nasledovné práce:

Stavebné práce spočívajú v dočasnom odstránení zvodnice, odstránenie jestvujúceho obrubníka, odfrézovanie vrstiev spevnenej krajnice, výkop ryhy pre osadenie štrbinového žlabu a šácht, osadenie štrbinového žlabu, betonáž šácht, vybudovanie nových sklzov, sanácia zosuvu, montáž stĺpikov a zvodnice a dokončovacie práce.

Dočasné dopravné značenie počas realizácie zákazky zabezpečí objednávateľ.

3.2.3 Stavebné práce budú realizované podľa PD „Sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu na R1 v km 32,000 – 32,250 vpravo“, ktorá je v elektronickej forme prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov.

3.3 Požiadavky počas záruky

3.3.1 Zhotovené dielo musí mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a musí zodpovedať technickým predpisom a normám, ktoré budú uplatnené v zmluve.

3.3.2 Zhotovené dielo nesmie mať vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na predpokladané účely.

4. Vykonanie prác

4.1 Práce budú vykonávané počas **čiasťočného obmedzenia dopravy počas pracovnej zmeny**.
Usmernenie premávky – obmedzenie dopravy bude vyznačené prenosnými dopravnými značkami, na zníženie rýchlosti počas prác. **Zhotoviteľ musí rešpektovať schválený POD a podmienky uzávierky stanovené MDVRR SR.**

Práce budú vykonávané **nepretržite, aj v dňoch pracovného pokoja** (soboty, nedele a sviatky).

4.2 **Zabezpečenie obmedzenia dopravy** v rozsahu vyznačenia, údržby a zrušenia v zmysle Zásad pre používanie prenosného dopravného značenia na pozemných komunikáciách, schválených MDVRR SR pod č.p.: 1110/271-97 zo dňa 14. 10. 1997 v platnom znení a určenia organizácie dopravy podľa § 3q zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien doplnkov **nie je súčasťou predmetu zákazky a bude zabezpečené kapacitami verejného obstarávateľa.**

4.3 Pred uvedením do užívania zhotoviteľ odstráni zariadenie staveniska a vyčistí dotknuté územie odstavebného materiálu.

4.4 Pri všetkých činnostiach zhotoviteľa na rýchlostnej ceste R1 musia byť rešpektované pravidlá cestnej premávky a bezpečnosti práce.

4.5 Potrebnú spoluprácu si zhotoviteľ vopred prerokuje s SSÚR 1 Galanta s dostatočným predstihom pred nástupom prác. Tel. kontakt: priama linka: 031/774 3112.

5. OSTATNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY

5.1 Uchádzač je povinný predložiť do ponuky Harmonogram prác (ktorý bude tvoriť Prílohu č. 2 zmluvy), v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác stanovenú verejným obstarávateľom (bod 2 B.1 Opis predmetu zákazky SP) vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.6.2017)). Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie.

Príloha č. 1 k časti B.1 – Projektová dokumentácia
