

## ZMLUVA O DIELO U ZHOTOVITEĽA POD ČÍSLOM: ZOD 48/2024/08431

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

**Obchodné meno:** Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Radovan Karkuš, riaditeľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu: Ing. Radovan Karkuš

vo veciach technických oprávnený ku konaniu: Ing. Ivan Senko

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK5081800000007000510133

IČO: 37 915 568

DIČ: 2021764767

(ďalej aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

**Obchodné meno:** COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka číslo 10798/T

štatutárny zástupca: predstavenstvo spoločnosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, členka predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

zastúpený: vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín

stavbyvedúci: Ing. Marián Riegel, stavbyvedúci

bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky

číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

telefón: +421 33 55 45 243 ; +421 910 803 947

e-mail: [colas@colas-sk.sk](mailto:colas@colas-sk.sk) ; [roman.vlachynsky@colas-sk.sk](mailto:roman.vlachynsky@colas-sk.sk)

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spolu aj len ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, túto Zmluvu o Dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok:

## Článok I. Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné**“ (ďalej aj len ako „**Dielo**“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Ponukového rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené Dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene, ako aj v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí Prílohu č. 3, vrátane zabezpečenia vydania kolaudačného rozhodnutia/í povolujúceho užívanie Diela a vykonanie všetkých úkonov s tým súvisiacich.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez ďalšieho na základe tejto Zmluvy zhotoviť v prospech objednávateľa Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, a to vrátane zabezpečenia vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia/í povolujúceho užívanie Diela. Termíny zhotovenia Diela sú stanovené v Harmonograme prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade ak zhotoviteľ využíva kapacity tretích osôb, ktorými preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá za plnenie Diela v plnej miere zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje podstatnú časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť priamo sám, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

## Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom plnenia je: Obec Stupné

## Článok III. Cena Diela

1. Cena Diela v celom rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena Diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností, v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
2. Celková cena Diela je Zmluvnými stranami dojednaná vo výške **67 963,86 Eur (slovom: šesťdesiatšesťtisíc deväťstošesťdesiattri eur a osemdesiatšesť centov) bez DPH**. Cena Diela spolu s DPH predstavuje sumu 81 556,63 Eur (slovom: osemdesiatjedentisíc päťstopäťdesiatšesť eur a šesťdesiattri centov), sadzba DPH je 20%, čo predstavuje sumu 13 592,77 Eur.
3. Cena Diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí

prílohu č. 2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s výkazom výmer. Cena Diela podľa tohto Článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby, prekládky inžinierskych sietí ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii Diela.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že v prípade ak dôjde k prerušeniu prác bez ohľadu na to, z akého dôvodu k prerušeniu došlo, nemá zhotoviteľ nárok na úhradu žiadnych nákladov či škody vzniknutých v dôsledku tohto prerušenia ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

#### **Článok IV. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo podľa Článku I. tejto Zmluvy riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy.
2. Za riadne zhotovenie Diela v zmysle predchádzajúceho odseku sa považuje riadne vykonanie všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy a zabezpečenie vydania prvostupňového (aj neprávoplatného) kolaudačného rozhodnutia/í povoľujúceho užívanie Diela za podmienky, že toto rozhodnutie následne (aj po uplynutí lehoty uvedenej v ods. 1) nadobudne právoplatnosť.
3. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu, ktorý obe Zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc), si Zmluvné strany dohodnú nový termín lehoty výstavby, pričom predĺženie lehoty výstavby bude dohodnuté dodatkom k Zmluve o dielo.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
5. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu Diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

#### **Článok V. Zoznam zodpovedných osôb**

1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy bude poskytnutý druhej zmluvnej strane bezodkladne po určení takýchto osôb, v nasledovnom zložení:
  - a) za objednávateľa: Ing. Peter Ševčík
  - b) za zhotoviteľa :Ing. Marián Riegel
2. V prípade zmeny osoby na pozíciách určených v bode 1. písm. a) a b) tohto Článku Zmluvy je zmluvná strana povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od vykonania zmeny, upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vykonaní zmeny a oznámiť druhej zmluvnej strane novú osobu určenú na výkon pozície.

## Článok VI. Podmienky zhotovenia Diela

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb v dostatočnom predstihu potrebnom na realizáciu diela, na základe výzvy na prevzatie staveniska zaslanej objednávateľom zhotoviteľovi (ďalej aj len ako „výzva“), v termíne určenom na prevzatie podľa výzvy. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne uvedenom vo výzve, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu v prípade omeškania s prevzatím staveniska o viac ako 3 dni vo výške 0,1% denne z ceny Diela do prevzatia staveniska a právo odstúpiť od tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu Zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie Diela, t.j. od odovzdania staveniska až do nadobudnutia právoplatnosti posledného kolaudačného rozhodnutia vydaného v súvislosti s Dielom.
3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
  - odberové miesta elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícii.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie Diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom Diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na Diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene Diela. Všetky úkony v súvislosti s likvidáciou odpadu hradí zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím Diela.
9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom

objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.

11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy.
12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.
15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy.
17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa. Predovšetkým, ale nie výlučne, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť splnenie povinností vyplývajúcich objednávateľovi ako stavebníkovi z §3 a nasl. Nariadenia vlády SR č. 396/2006, k čomu mu udeľuje objednávateľ poverenie. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr však v deň zahájenia realizácie Diela) informovať objednávateľa o osobe, ktorú poveril výkonom funkcie koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v zmysle §3 a nasl. Nariadenia vlády SR

č. 396/2006. Zhotoviteľ má povinnosť bezodkladne (najneskôr však v lehote 3 pracovných dní) informovať objednávateľa o prípadnej zmene v osobe koordinátora.

18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie Diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 - Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
23. Objednávateľ počas realizácie Diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie Diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
25. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie Diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.
26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie Diela zvoľávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí všetky činnosti súvisiace s vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia v súčinnosti s objednávateľom, pričom v prípade potreby je za týmto účelom objednávateľ povinný udeliť zhotoviteľovi príslušnú plnú moc.

29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

30. Pre odovzдание predmetu Zmluvy/Diela platí:

- Zmluvné strany pristúpia k odovzdaniu a prevzatiu Diela potom, ako zhotoviteľ riadne vykoná všetky stavebné a iné práce a dodávky podľa tejto Zmluvy,
- Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného Diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, pričom platí, že ak lehota nebude v protokole uvedená, Zmluvné strany si dohodli lehotu 15 dní, povinnosť zhotoviteľa následne zabezpečiť vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia/í povoliujúceho užívanie Diela, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
- ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
- odovzдание Diela sa uskutoční ešte pred jeho kolaudáciou z dôvodu potreby získania podkladov ku kolaudačnému konaniu, a to po riadnom vykonaní všetkých stavebných a iných prác a dodávok podľa tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.

Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany uvádzajú, že odovzdaním predmetu Zmluvy v zmysle tohto bodu sa Dielo nebude považovať za úplne a riadne zhotovené (viď čl. IV ods. 1 a 2 Zmluvy), ale za úplné a riadne dokončenie Diela podľa tejto Zmluvy sa považuje až nadobudnutie právoplatnosti predmetného kolaudačného rozhodnutia/í (viď Článok IV. ods. 2 Zmluvy).

31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach všetky dokumenty nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu a k riadnemu užívaniu a prevádzke Diela, pričom zhotoviteľ zodpovedá za to, že zoznam dokladov uvedených v tomto odseku je úplný a kompletný, a to najmä:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pas porty a návody na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- v prípade potreby overený geometrický plán na vysporiadanie pozemkov a zriadenie vecných bremien
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení (v prípade ak Dielo bude tieto zariadenia obsahovať),
- iné potrebné dokumenty.

32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.

33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na

stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

#### **Článok VII. Subdodávatelia**

1. Zhotoviteľ je oprávnený uskutočňovať Dielo prostredníctvom subdodávateľov za podmienok uvedených v tomto Článku Zmluvy. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
2. Každý subdodávateľ, ktorý podľa osobitného predpisu má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcim po dni, kedy k zmene došlo.
4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu ods. 1 tohto Článku zmluvy.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
6. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

#### **Článok VIII. Platobné podmienky**

1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná mesačnými faktúrami za jednotlivé časti Diela samostatne, pričom faktúra(y) bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác za uplynulý kalendárny mesiac odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru(y) najneskôr do piatich dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Posledná faktúra bude vystavená v minimálnej výške 10% z celkovej ceny Diela, a to po odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov.



2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác do vždy 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa daný Súpis vykonaných prác vyhotovuje. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

3. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením doplneného/prepracovaného dokladu objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ je povinný pred podpisom tejto Zmluvy doručiť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „zábezpeka“). Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške

a) 10 % z ceny Diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania Diela, pričom táto banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania Diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené Dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny Diela bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania Diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

5. Zmluvné strany sa dohodli na garančnej zábezpeke, ktorá predstavuje:

- 5% z celkovej ceny Diela bez DPH.

Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5 % z celkovej ceny Diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej doby.

## Článok IX.

### Zodpovednosť za vady a záruky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa, kedy nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie/ia povoľujúce užívanie Diela, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom.
4. Záruka sa vzťahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby Diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia Diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, a vadu odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 10 dní od začatia s jej odstraňovaním, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
7. V prípade, že zhotoviteľ nespĺní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa, alebo od Zmluvy odstúpiť.

## Článok X.

### Zmluvné pokuty a sankcie

1. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením povinností podľa Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny Diela s DPH, a to za každý deň omeškania so splnením tejto povinností.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením ktorejkoľvek z povinností definovaných v Článku IX. ods. 5 tejto Zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom: päťsto eur), a to za každý deň omeškania so splnením každej tejto povinnosti.
3. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na zmluvnú

pokutu vo výške 5 % z ceny Diela vrátane DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

5. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku dotknuté.
6. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodržaním termínu riadneho zhotovenia a odovzdania Diela stanoveného v Článku IV. ods. 1 tejto Zmluvy, ak takéto omeškanie vzniklo v dôsledku prietáhov prietahmi v kolaudačnom konaní zo strany príslušného správneho orgánu, ktoré neboli zavinené zo strany zhotoviteľa.

### **Článok XI. Odstúpenie od Zmluvy**

1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od Zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
  - ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie Diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťenie Zmluvy podľa Článku VI. ods. 2 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 4 tejto Zmluvy a/alebo garančnú zábezpeku podľa Článku VIII. ods. 5 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať Dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom,
  - ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením akejkoľvek etapy Diela podľa stanoveného Harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
  - ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú svoju povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy (ako tie čo sú uvedené vyššie v tomto odseku) a toto porušenie neodstráni ani do 15 dní potom, čo ho objednávateľ na toto odstránenie vyzval resp. v tejto lehote neodstráni negatívne následky

tohto porušenia.

## **Článok XII.**

### **Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia Zmluvy**

1. Každá zo Zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

## **Článok XIII.**

### **Záverečné ustanovenia**

#### **Rovnopisy**

Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch exemplároch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

#### **Zmeny Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od doručenia návrhu dodatku. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho podala.

#### **Zrušenie Zmluvy**

Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zrušiť len písomnou formou.

#### **Doručovanie**

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, správy a pod. (ďalej aj len ako „**Oznámenia**“) týkajúce sa tejto Zmluvy, si Zmluvné strany budú doručovať niektorým z nasledovných spôsobov: osobne, doporučeným listom s doručenkou, alebo kuriérom na adresy Zmluvných strán a kontaktné údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, ak zmluvná strana doručuje formou doporučeného listu s doručenkou a zmluvná strana, ktorej je Oznámenie adresované, jeho prijatie odmietne alebo iným spôsobom jeho prijatiu zabráni (neoznámením zmeny jej adresy alebo iných kontaktných údajov), považuje sa na účely tejto Zmluvy za preukázané doručenie vrátane nedoručenej zásielky odosielateľovi podľa poslednej známej adresy takejto zmluvnej strany. To platí aj vtedy, ak je v tejto Zmluve začiatok dohodnutej lehoty viazaný na okamih doručenia písomnosti. V takomto prípade sa za okamih doručenia považuje okamih vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi. Za poslednú známu adresu zmluvnej strany sa považuje adresa pozostávajúca z označenia obce, názvu ulice alebo verejného priestranstva (ak je obec členená na ulice a inak označované verejné priestranstvá), súpisného, popr. i orientačného čísla a poštového smerovacieho čísla a v prípade, ak ide o adresu mimo Slovenskej republiky i označenie štátu, oznámená písomne inej zmluvnej strane, inak adresa, ktorá je uvedená pri každej zo zmluvných strán v záhlaví tejto Zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán v súlade a za podmienok uvedených v tejto Zmluve oznámi inej zmluvnej strane zmenu adresy, považuje sa za poslednú známu adresu táto oznámená adresa, a to vždy tá, ktorá bola oznámená najneskôr. Pre účely tejto Zmluvy budú Oznámenia považované za doručené dňom:

- potvrdenia doručenia adresátom, alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje osobne, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje kuriérom, alebo
- potvrdenia doručenia adresátom alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, ak sa doručuje doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou.

### **Počítanie lehôt**

Na účely tejto Zmluvy sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, kedy došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číselným označením zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, prípadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

### **Povinnosť mlčanlivosti**

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva, ako aj jej časti a informácie, dáta a skutočnosti nadobudnuté niektorou zo zmluvných strán na základe a/alebo v spojení s touto Zmluvou, nemôžu byť prístupné tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu ďalšej zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán berie na vedomie, že za dôverné informácie sa v právnom vzťahu založenom touto Zmluvou považujú informácie, ktorých obsahom sú majetkové pomery ďalšej zmluvnej strany a všetky ďalšie informácie, ktoré vypovedajú o osobnom a majetkovom postavení zmluvnej strany a členov jeho rodiny, o predmete Zmluvou dojednaného obchodu a iné informácie, ktoré sú mu objektívne spôsobilé privodiť ujmu alebo narušiť intímnu sféru zmluvnej strany. Každá zo zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a chrániť ich pred neoprávneným, úplným alebo čiastočným, prístupným tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:

- je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť na základe zákona alebo
- dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

V prípade, ak zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom bez zbytočného odkladu informovať vopred ďalšiu zmluvnú stranu. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnomu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo auditorovi zmluvnej strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané zmluvnou stranou k povinnosti mlčanlivosti. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa tejto Zmluvy sa nepovažuje ani poskytnutie informácií orgánom štátnej správy, samosprávy, prokuratúry alebo iným právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorým zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach, za podmienky, že poskytnutie informácie súvisí s činnosťou subjektu, ktorému sa informácia poskytuje. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa tiež nepovažuje poskytnutie informácií tam, kde to prikazuje právny poriadok Slovenskej republiky.

### **Vyššia moc**

Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, a Zmluvné strany ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným v dôsledku vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť na vyššiu moc odvolať, je povinná do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci požiadať ďalšiu zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy v tej časti, ktorá bola vyskytnutím sa prípadu vyššej moci dotknutá. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

### **Notifikačné povinnosti**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach

spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

#### **Súčinnosť**

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané.

#### **Riešenie sporov**

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákolvek zo zmluvných strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde, prípadne inom príslušnom orgáne.

#### **Nadpisy**

Zmluvné strany vyhlasujú, že nadpisy jednotlivých článkov a ustanovení tejto Zmluvy slúžia len na informačný účel a nezakladajú Zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

#### **Zánik Zmluvy**

Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

#### **Započítanie**

Zmluvné strany sú oprávnené jednostranne započítať svoje vzájomne pohľadávky, ktoré vzniknú ktorejkoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto Zmluvou. Zápočet vzájomných pohľadávok je možný najmä na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.

#### **Zmluvná pokuta**

Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti zmluvnou stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej zmluvnej strany domáhať sa od druhej zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

#### **Zmeny právneho poriadku**

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o jeho uzatvorenie záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

#### **Prechod práv a povinností**

Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.

### **Interpretácia**

Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov tejto Zmluvy z hľadiska tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.

### **Platnosť a účinnosť**

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

### **Platnosť uvedených údajov**

Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú v súlade so skutočným stavom platným v čase uzavretia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť zmenu príslušných údajov bezodkladne písomne inej zmluvnej strane, pokiaľ tak neučinia, nemôžu sa domáhať voči inej zmluvnej strane žiadnych nárokov spojených s touto zmenou.

### **Vyhlasenia Zmluvných strán**

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

### **Právna úprava**

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

### **Voľba práva a právomoci**

Zmluva sa uzatvára podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky je rozhodujúcim právnym poriadkom pre úpravu všetkých vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa dohodli, že právomoc na rozhodovanie sporov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť z právnych vzťahov založených touto Zmluvou, majú všeobecné sudy Slovenskej republiky.

### **Súčasť Zmluvy**

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Harmonogram prác

Príloha č. 2 – Ponukový rozpočet

Príloha č. 3 – Identifikácia projektovej dokumentácie

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov



v Trenčíne, dňa 15. 05. 2024

v TRNAVE, dňa 23-04-2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

 COLAS



**Správa ciest  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  
Ing. Radovan Karkuš  
riaditeľ**

**COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. Martin Papala  
Predseda predstavenstva**




**COLAS Slovakia, a.s.  
Ing. ....  
Člen /členka predstavenstva**

**Jaroslav Mikuš  
člen predstavenstva**



## Stupné - rekonštrukcia mostného objektu

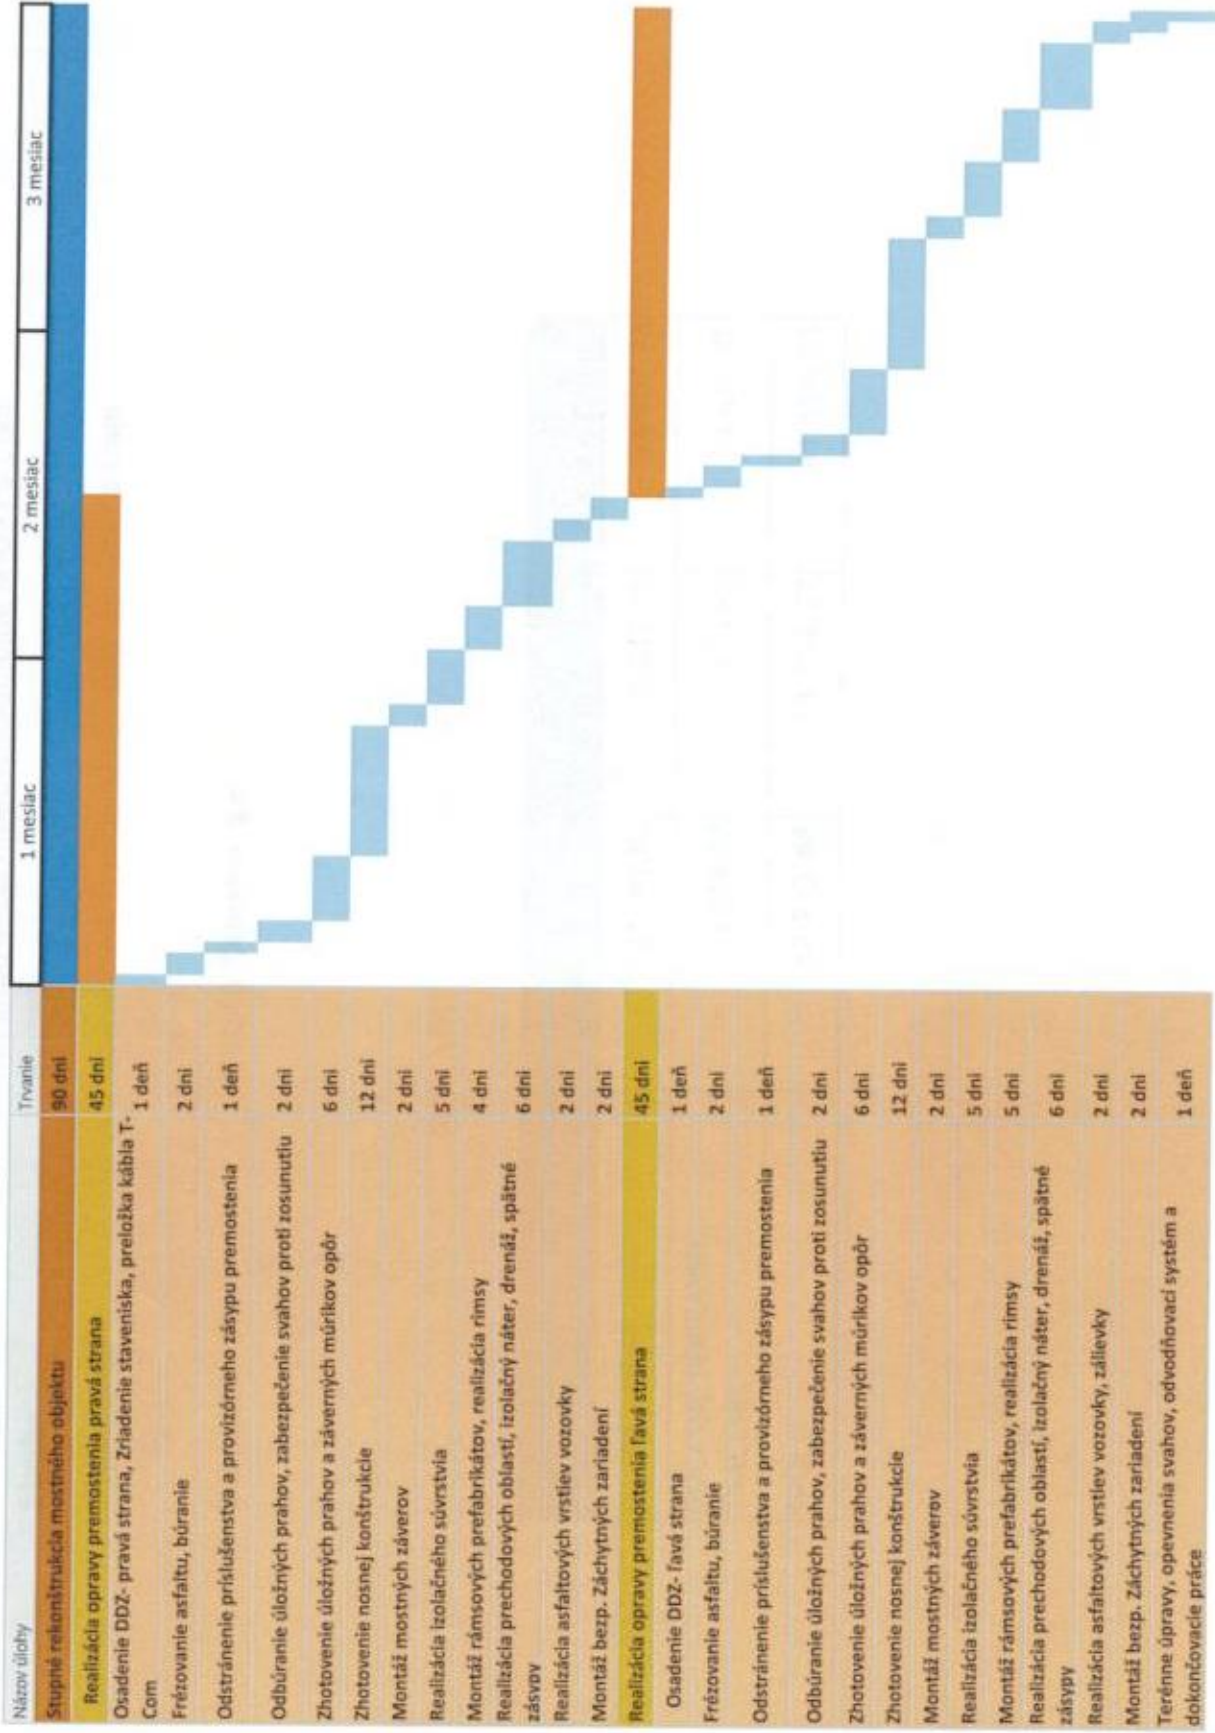

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci  
Stupné

Objednávateľ: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Uchádzač: COLAS Slovakia, a.s.

**REKAPITULÁCIA PONUKY**

Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 201 - MOST	64 089,82	12 817,96	76 907,78
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE	3 874,04	774,81	4 648,85
<b>SPOLU</b>	<b>67 963,86</b>	<b>13 592,77</b>	<b>81 556,63</b>

# PONUKA

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: SO 201 Most

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 62 038,199**

**1 Zemné práce 3 784,446**

1	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	4,000	6,360	25,440
2	113152220.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m <sup>2</sup>	125,000	6,520	815,000
3	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m <sup>2</sup> , pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 100 mm 0,254 t	m <sup>2</sup>	85,000	8,360	710,600
4	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,600	14,590	242,194
5	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m <sup>3</sup>	16,600	48,740	809,084
6	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	28,800	13,060	376,128
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	62,000	13,000	806,000

**2 Zakladanie 1 503,490**

8	212312111	Lôžko pre trativod z betónu prostého	m <sup>3</sup>	4,000	17,910	71,640
9	212755115	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	20,000	4,830	96,600
10	212971113.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	20,000	2,700	54,000
11	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	1 025,000	1,250	1 281,250

**3 Zvislé a kompletne konštrukcie 18 659,432**

12	317141111.S	Osadenie ríms zo sklovláknitých tvaroviek s kotvením dĺžky do 2 m	ks	20,000	163,240	3 264,800
13	59383001005.S	1 Mostný prefabrikát rímsový - polymérbetónový, dĺžka do 1 m	kus	20,000	163,240	3 264,800

# PONUKA

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: SO 201 Most

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímky do mostovky kotvou do vývrtu	ks	24,000	25,440	610,560
15	311990008	/Kotviaci prvok	ks	24,000	29,680	712,320
16	317321119.S	Mostové rímky z betónu železového triedy C 35/45	m3	3,280	271,360	890,061
17	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,487	2 819,600	1 373,145
18	326312511.S	Murivo nadzákladové z betónu prostého, objemu do 3 m3 tr. C 16/20	m3	2,340	162,180	379,501
19	326351111.S	Debnenie lícných plôch a plôch dilatčných škár bet. konštr. plôch rovinných, konštr. hr. do 1 m	m2	4,600	48,760	224,296
20	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	7,020	271,360	1 904,947
21	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	2,100	271,360	569,856
22	334351115.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, zhotovenie	m2	25,750	48,760	1 255,570
23	334351215.S	Debnenie mostných konštrukcií-úložných prahov výšky do 20 m, odstránenie	m2	25,750	12,720	327,540
24	334359111.S	Výrez debnenia pre prestup rúr betónovou konštrukciou DN 150	ks	4,000	24,380	97,520
25	334362166.S	/Výstuž úložných prahov a záverových múrikov z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,590	2 713,600	1 601,024
26	348171121.S	Osadenie mostného ocelového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	11,140	51,940	578,612
27	553000***	/ Dodávka ocel. konštrukcie zábradlia	T	0,440	3 392,000	1 492,480
28	388995213.S	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad DN 110 do DN 140	m	20,000	5,620	112,400

**4**

**Vodorovné konštrukcie**

**16 453,334**

29	421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	12,860	217,300	2 794,478
30	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	36,000	30,740	1 106,640

# PONUKA

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: SO 201 Most

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	36,000	14,520	522,720
32	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	4,320	30,740	132,797
33	421351231.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	6,073	30,740	186,684
34	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	4,320	14,520	62,726
35	421351331.S	Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - odstránenie	m2	6,073	14,520	88,180
36	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,097	2 819,600	5 912,701
37	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,046	4 558,000	209,668
38	458501111.S	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách	m3	23,000	39,220	902,060
39	469521122.S	Spevnenie dna alebo svahov drv. kamenivom zrna 63-125 mm cem. maltou a betónu vodostav. C 25/30 bez hutnenia hr. 250 mm	m2	46,000	98,580	4 534,680

**8 915,053**

**5**

## Komunikácie

40	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	22,800	12,190	277,932
41	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	22,800	30,100	686,280
42	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	22,800	15,850	361,380
43	573111113.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	22,800	0,670	15,276
44	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	195,100	0,520	101,452
45	577134271.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	152,300	35,840	5 458,432
46	577144331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	42,800	41,610	1 780,908
47	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,250	10,350	85,388

# PONUKA

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: SO 201 Most

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	581114113.S	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr. 100 mm	m2	8,250	17,940	148,005

## 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 77,400

49	622211111.S	Čistenie muriva podpier, pilierov, krídiel od machu a inej vegetácie	m2	10,000	3,820	38,200
50	627455111.S	Škárovanie starého muriva z lomového kameňa, so škárovaním do hĺbky 80 mm	m2	10,000	3,920	39,200

## 8 Rúrové vedenie 309,000

51	812479011.S	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 -1,640 t	m	7,500	41,200	309,000
----	-------------	--	---	-------	--------	---------

## 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 336,045

52	911382121.S	Osadenie cestného zvodidla betónového jednostranného, typ základný dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	4,000	13,510	54,040
53	91138321x.S	Odstránenie betónového panela dĺžky 1 m, výšky 1,0 m	ks	2,000	33,490	66,980
54	911383221.S	Odstránenie cestného betónového zvodidla dĺžky 4 m, výšky 0,8 m	m	8,000	30,250	242,000
55	917862112.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	11,000	16,230	178,530
56	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	11,110	3,710	41,218
57	919726721.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15 mm hl. 25 mm	m	11,675	7,950	92,816
58	919726731.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm	m	42,125	10,390	437,679
59	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	42,125	2,650	111,631
60	931941142.S	Osadenie a dodávka dilatačného mostného záveru podpovrchového - posun do 20 mm	m	17,450	331,780	5 789,561
61	931992121.S	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	5,235	9,540	49,942
62	931994141.S	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	5,000	5,300	26,500

# PONUKA

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: SO 201 Most

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
63	931994142.S	Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2	m	4,000	10,600	42,400
64	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	1,000	57,240	57,240
65	552410006000.S	Antikoro trubička na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 500 mm pre mostný odvodňovač	ks	1,000	47,710	47,710
66	961021112.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z kameňa -2,49000t	m3	10,400	68,900	716,560
67	961041211.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost. betónu, -2,20000t	m3	0,600	159,000	95,400
68	961051111.S	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	4,005	223,660	895,758
69	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	10,300	13,780	141,934
70	96681111x.S	Demontáž dočasnej kovovej vodiacej kofajnice	m	20,000	2,650	53,000
71	971045803.S	Vrty priklepovým vrtákom do D 18 mm do stien alebo smerom dole do betónu -0.00001t	cm	1 025,000	0,160	164,000
72	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	83,300	9,670	805,511
73	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 832,200	0,290	821,338
74	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	83,300	6,920	576,436
75	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	58,600	6,360	372,696
76	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné	t	22,200	17,490	388,278
77	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné	t	0,600	1,060	0,636
78	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,500	26,500	66,250

PSV

Práce a dodávky PSV

2 051,618

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

2 051,618

# PONUKA

Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: SO 201 Most

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
79	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	15,120	0,480	7,258
80	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,005	2 650,000	13,250
81	711112011.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovou suspenziou za studena	m2	30,240	0,610	18,446
82	111630002300.S	Suspenzia asfaltová	t	0,033	1 471,280	48,552
83	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	15,120	5,510	83,311
84	283230001900.S	Profilovaná fólia z PE, výška nopov 20 mm, pevnosť v tlaku 200 kN/m2, pre spodnú stavbu	m2	17,388	2,070	35,993
85	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	40,800	13,460	549,168
86	711331111.S	Zhotovenie izolácie AIP pásmi na sucho cestných mostoviek	m2	24,540	7,050	173,007
87	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	32,454	9,430	306,041
88	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	40,800	9,170	374,136
89	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	46,920	9,430	442,456
<b>Celkom</b>						<b>64 089,818</b>



# PONUKA

Stavba: Rekonštrukcia mostného objektu M4231 v obci Stupné

Objekt: Dočasné dopravné značenie

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**3 874,040**

**9**

**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**3 874,040**

1	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	13,490	134,900
2	404410211400.S	<i>Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa</i>	ks	5,000	20,190	100,950
3	915714112.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej deliacich čiar šírky 120 mm	m	150,000	9,270	1 390,500
4	915714121.S	Dočasné vodorovné značenie krytu lepením pásky plochej vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	13,000	18,540	241,020
5	915911111.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	15,000	7,210	108,150
6	404450003600.S	<i>Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom I. trieda</i>	ks	15,000	11,850	177,750
7	915911112.S	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s 2 svetlami	ks	8,000	6,390	51,120
8	404450003500.S	<i>Zariadenie dopravné Z2 (Zábrana na označenie uzávierky) s 2 svetlami, rozmer 1000x200 mm, pre dočasné dopravné značenie</i>	ks	4,000	10,820	43,280
9	915912211.S	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	10,000	5,970	59,700
10	404450006000.S	<i>Zariadenie dopravné - Smerová alebo vodiaca doska Z4, rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová</i>	ks	10,000	11,540	115,400
11	915913111.S	Montáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaformi	ks	2,000	46,350	92,700
12	404420000100.S	<i>LED - diódová prenosná semaforová súprava s priemerom svetiel 200 mm</i>	ks	1,000	1 071,200	1 071,200
13	915913211.S	Montáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	5,150	10,300
14	404490009900.S	<i>Akumulátor 12V 170 Ah s výkonom 1000 A</i>	ks	2,000	10,300	20,600
15	966812211.S	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	7,210	72,100

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
16	966821111.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	15,000	5,150	77,250
17	966821112.S	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m s svetlami	ks	8,000	5,150	41,200
18	966822211.S	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	10,000	5,150	51,500
19	966823111.S	Demontáž prenosnej semaforovej súpravy s 2 semaforami	ks	2,000	5,150	10,300
20	966823211.S	Demontáž akumulátora prenosnej semaforovej súpravy 12V/170Ah	ks	2,000	2,060	4,120

**Celkom**

**3 874,040**
