

ZMLUVA O DIELO

je uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ:	Mesto Bardejov
Sídlo:	Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca:	MUDr. Boris Hanuščák
IČO:	00321842
Bankové spojenie:	VÚB banka a.s. Slovensko
IBAN:	SK84 0200 0000 0046 3297 3351

Zhotoviteľ:	CUKSTAV s.r.o.
Sídlo:	Stöcklova 3263/49, 085 01 Bardejov
Zapísaný v:	OR Okr. súd Prešov
Zastúpená:	František Harčarik - konateľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných:	František Harčarik - konateľ
vo veciach technických:	František Harčarik - konateľ
IČO:	45344086
DIČ:	2022947025
IČ DPH:	SK2022947025
Bankové spojenie:	VÚB
IBAN:	SK16 0200 0000 0032 4694 8559

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže – **Stavebné práce „Parkoviská“ – časť PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE**
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.

I. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) **PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE** podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov a predstavuje bez DPH 79 693,09 €, DPH predstavuje sumu 15 938,62 € a cena predmetu zmluvy s DPH, ktorú sa objednávatel' zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť predstavuje sumu 95 631,71 €. Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany. V tejto cene sú zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu. Cena je konečná a nie je možné ju meniť.
2. Objednávatel' je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné aj jednotlivo za realizované stavebné práce, v mesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí objednávatel'om.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávatel'ovi a to po protokolárnom prevzatí stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.
5. Predpoklad na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávatel'a poskytovaný nebude.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovaný v K. ú. **Mesto Bardejov**.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet obstarávania **do 180 kalendárnych dní** od prevzatia staveniska.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávatel'a.
5. V prípade, že zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávatel'a, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávatel' právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávatel' určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie.
6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávatel'a hneď ako ich zistil. Objednávatel' je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávatel'a
 - a) Objednávatel' je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho

zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o.i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
 - i. prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
 - ii. zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - iii. oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - iv. zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- c) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas celej doby realizácie diela a to najneskôr v deň prevzatia staveniska. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny diela s DPH podľa bodu II.1 tejto Zmluvy.

- d) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- e) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník a fotodokumentáciu prác. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor a Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- f) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- g) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- h) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- i) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- j) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- k) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- l) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- m) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- n) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- o) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.

- p) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- q) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok.
- r) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.
- s) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- t) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- u) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- v) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- w) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- x) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

V.

Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou časti diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa

- poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a. neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 2. tohto článku alebo;
 - b. nepristúpi k odstraňovaniu vád diela v termíne požadovanom Objednávateľom, najneskôr však do 3 (slovom: troch) kalendárnych dní alebo;
 - c. neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 4 tohto článku.
 4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 3 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a. požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b. odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c. zabezpečiť odstránenie vád Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
 5. Náhradu nákladov podľa bodov 3 a 4 tohto článku Objednávateľ vykoná zaslaním listu zhotoviteľovi s priložením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto článku, pričom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť uvedené náklady do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia listu Zhotoviteľovi.
 6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
 7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
 8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.

7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinnosti Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 - Harmonogram prác.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý aj začatý týždeň omeškania.
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením väd a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 60 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Prílohe č. 1 z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
 - a. Ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 10 (desať) dní.
 - b. Ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou
 - c. Ak Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme prác o viac ako 10 (desať) dní.
 - d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa tejto zmluvy.

- e. Ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie
 - f. Ak dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov Zhotoviteľa
2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernú akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.

Záverečné ustanovenia

1. **Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:**
Príloha č. 1: Cenová a technická špecifikácia ponúkaného riešenia - Výkaz výmer
Príloha č. 2: Harmonogram prác v členení na jednotlivé činnosti
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do času splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
3. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
5. Objednávateľ je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa do troch mesiacov od uzavretia tejto zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
7. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne

záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
9. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch ako originál. Z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
11. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
12. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

V Bardejove dňa 18.9.2024

V Bardejove dňa 18.9.2024

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....

.....

MUDr. Boris Hanuščák
primátor mesta

František Harčarik
konateľ

Krycí list stavby

Stavba PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE

Miesto:

Ks:

Zákazka: 978

Spracoval:

Dňa

9.8.2024

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-TIS a.s., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	79 193,09	15 355,74	79 193,09			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	500,00	500,00	500,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			79 693,09	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Stlažené podmienky dopravy		0,00
Stlažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		79 693,09
				DPH 20% z	79 693,09	15 938,62
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		95 631,71

Odberateľ

Dodávateľ

CUKSTAV s.r.o.
 Sídklova 3263/49, 085 01
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01 - PARKOVISKO	79 693,09		0,00	0,00	0,00	79 693,09
Celkom bez DPH	79 693,09		0,00	0,00	0,00	79 693,09
DPH 20% z	79 693,09					15 938,62
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						95 631,71

Krycí list rozpočtu

Stavba PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVISKO

Miesto:

Ks:

Zákazka: 978

Spracoval:

Dňa

9.8.2024

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

IČO:

DIČ:

Projektant: A-TIS a.s., Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	79 193,09	15 355,74	79 193,09		0
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	500,00	500,00	500,00	HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			79 693,09	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	79 693,09
				DPH 20% z	15 938,62
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	95 631,71

Odberateľ

Dodávateľ

CUKSTAV s.r.o.
 Stáckova 3265
 IČO: 45 344 086

V
 25

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-TIS a.s., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 9.8.2024

Stavba PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE
Objekt SO 01 - PARKOVISKO

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	14 822,62	126,24	14 822,62	0,0200	39,9300			
ZÁKLADY	950,99	0,00	950,99	1,3300	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	19,29	0,00	19,29	0,0200	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 465,94	636,69	1 465,94	0,0300	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	40 188,77	10 843,39	40 188,77	802,1900	0,0000			
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 253,36	3 749,42	14 253,36	132,9400	0,0000			
PRESUNY HMŔT	7 492,12	0,00	7 492,12	0,0000	0,0000			
Práce HSV	79 193,09	15 355,74	79 193,09	936,5200	39,9300			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	500,00	500,00	500,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	500,00	500,00	500,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	79 693,09	15 855,74	79 693,09	936,5200	39,9300			

Rozpočet

Odberateľ: MESTO BARDEJOV

Spracoval:

Projektant: A-TIS a.s., Prešov

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 9.8.2024

Zákazka PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE

Objekt SO 01 - PARKOVISKO

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1E+06	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	440,189	0,87	382,96	0,000	0,000	0,000
		"odkopy spolu							
		(233.667+205,922)		439,589					
		"pre značky							
		0.5*0.5*0.8*3		0,600					
1E+06	17120901311	Poplatok za skládku výkopovej zeminy	m3	212,467	4,00	849,87	0,000	0,000	0,000
		"odvoz mimo							
		211,867		211,867					
		"pre značky							
		0.5*0.5*0.8*3		0,600					
1E+06	171101105_1	Násyp s urovnávaním zo sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	m3	227,722	9,96	2 268,11	0,000	0,000	0,000
		"svah A1-1 - preírež x dl.							
		1.04*33		34,320					
		"svah A2-2 - preírež x dl.							
		2.45*10		24,500					
		"svah A3-3 - preírež x dl.							
		2.55*38		96,900					
		"svah A4-4 - preírež x dl.							
		0.9*17,5		15,750					
		"svah A5-5 - preírež x dl.							
		2.87*19,6		56,252					
1E+06	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	480,530	0,68	326,76	0,000	0,000	0,000
		480,53		480,530					
1E+06	130201011	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	0,600	48,48	29,09	0,000	0,000	0,000
		"pre značky							
		0.5*0.5*0.8*3		0,600					
1E+06	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	KG	16,000	7,89	126,24	0,001	0,016	0,000
		480.53/30		16,018					
		16-16.018		- 0,018					
1E+06	181301105	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 plocha do 500 m2 hrúbka do 300 mm	m2	480,530	7,27	3 493,45	0,000	0,000	0,000
		"svah A1-1 - š x dl.							
		33*2		66,000					
		"svah A2-2 - š x dl.							
		10*4,2		42,000					
		"svah A3-3 - š x dl.							
		38.05*4,2		159,810					
		"svah A4-4 - š x dl.							
		17,5*2		35,000					
		"svah A5-5 - š x dl.							
		19,6*5,4+11*0,6		112,440					
		"boky							
		5*0,6*20+2,2*0,6*4		65,280					
1E+06	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	408,650	1,72	702,88	0,000	0,000	0,000
		"svah odkop ornice A1-1 - š x dl.							

Rozpočet PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVISKO

		33*2		66,000						
		"svah odkop ornice A2-2 - š x dl.								
		10*4.2		42,000						
		"svah odkop ornice A3-3 - š x dl.								
		38.05*4.2		159,810						
		"svah odkop ornice A4-4 - š x dl.								
		17.5*2		35,000						
		"svah odkop ornice A5-5 - š x dl.								
		19.6*5.4		105,840						
1E+06	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	42,777	15,64	669,03	0,000	0,000	19,250	
		"pri novonavrhovaných park. miestach								
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3		42,777						
1E+06	113202111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	142,590	2,64	376,44	0,000	0,000	20,676	
		"pri novonavrhovaných park. miestach								
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)		142,590						
1E+06	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornine triedy 3 od 100 m3 do 1000 m3	m3	205,922	4,11	846,34	0,000	0,000	0,000	
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc								
		8)*1.1*0.37		205,922						
1E+06	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	111,309	0,53	58,99	0,000	0,000	0,000	
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc - ornica								
		8)*1.1*0.2		111,309						
1E+06	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,600	8,60	5,16	0,000	0,000	0,000	
		"pre značky								
		0.5*0.5*0.8*3		0,600						
1E+06	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	667,311	2,39	1 594,87	0,000	0,000	0,000	
		"odkopy spolu			2,39					
		(233.667+205.922)		439,589						
		"výkaz obsypu								
		227.722		227,722						
1E+06	122101102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1000 m3	m3	233,667	2,39	558,46	0,000	0,000	0,000	
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc - ornica								
		8)*1.1*0.2		111,309						
		"svah odkop ornice A1-1 - preirez x dl.								
		0.54*33		17,820						
		"svah odkop ornice A2-2 - preirez x dl.								
		1.24*10		12,400						
		"svah odkop ornice A3-3 - preirez x dl.								
		1.35*38		51,300						
		"svah odkop ornice A4-4 - preirez x dl.								
		0.62*17.5		10,850						
		"svah odkop ornice A5-5 - preirez x dl.								
		1.53*19.6		29,988						
1E+06	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	227,722	2,14	487,33	0,000	0,000	0,000	
		"výkaz obsypu								
		227.722		227,722						
1E+06	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	211,867	9,66	2 046,64	0,000	0,000	0,000	
		"odkopy spolu								
		(233.667+205.922)		439,589						
		"výkaz obsypu								
		-227.722		- 227,722						
1	ZEMNÉ PRÁCE					14 822,62	0,02	39,930		
2	ZÁKLADY									
1E+06	275313621	Betón základových páliek prostý triedy C 20/25	m3	0,600	110,13	66,08	2,212	1,327	0,000	
		"pre značky								
		0.5*0.5*0.8*3		0,600						
1E+06	21590120511	Zhutnenie podkladu vibračnou doskou (žabou, žehličkou)	m2	556,545	1,59	884,91	0,000	0,000	0,000	
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc								
		8)*1.1		556,545						
2	ZÁKLADY					950,99	1,33	0,000		

Rozpočet PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVISKO


	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1E+06	338171121	Osadenie stĺpika oceľového dopr. značky do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	kus	3,000	6,43	19,29	0,006	0,019	0,000
		"pre značky							
		3		3,000					
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				19,29		0,02	0,000
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
1E+06	451971111_4	Položenie podklad. vrstvy z geotext., s prekrytím pásov 150 mm,	m2	556,545	1,49	829,25	0,000	0,028	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc							
		8)*1.1		556,545					
1E+06	673062010105	Geotextília Geonetex A 200 g/m2, BAL: 2x50 m	M2	612,200	1,04	636,69	0,000	0,000	0,000
		556,545*1.1		612,200					
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				1 465,94		0,03	0,000
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
1E+06	592036015001	Dlažba, typ ako PREMAC SIKO-eco, hrúbka 8 cm, 20 x 20 cm, farba sivá	M2	538,065	19,50	10 492,27	0,160	86,090	0,000
		"parkovisko medzi obrubníkmi - plocha z pc							
		(505.95)*1.1		556,545					
		"odpočet deliaca							
		-18.48		- 18,480					
1E+06	592036014951	Dlažba, typ ako PREMAC SIKO-eco, hrúbka 8 cm, 20 x 10 cm, farba grafitová	M2	18,480	19,00	351,12	0,160	2,957	0,000
		"deliace miesta výkaz z pc							
		118*0.1*1.1		12,980					
		"výplň imobilný - výkaz z pc							
		1*5*1.1		5,500					
1E+06	564762113_1	Podklad z kameniva, hrubého drveného fr. 0-64 mm hrúbky 220 mm	m2	556,545	9,00	5 008,91	0,532	296,004	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc							
		8)*1.1		556,545					
1E+06	564762113_2	Podklad z kameniva, hrubého drveného fr. 0-32 mm hrúbky 220 mm	m2	505,950	8,80	4 452,36	0,532	269,095	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc							
		8)		505,950					
1E+06	59691300111	Zhutnenie dlažby vibračnou doskou (žabou, žehličkou) s gumenou podložkou	m2	505,950	1,85	936,01	0,000	0,000	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc							
		8)		505,950					
1E+06	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	505,950	20,00	10 119,00	0,112	56,666	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc							
		8)		505,950					
1E+06	577151213	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 60 mm	m2	42,777	20,00	855,54	0,157	6,713	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3		42,777					
1E+06	565151041	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením do hrúbky 70 mm, trieda dopravného zaťaženia I.	m2	42,777	18,22	779,40	0,190	8,130	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3		42,777					
1E+06	564581110	Ložná vrstva zo sypaniny, po zhutnení hr.50 mm	m2	505,950	2,00	1 011,90	0,000	0,000	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach - plocha z pc							
		8)		505,950					
1E+06	581510000610	Zeolit - ZeoWater 2,5-5mm	t	8,095	305,00	2 469,04	1,000	8,095	0,000
		"parkovisko medzi obrubníkmi - plocha z pc 20% z objemu							
		(505.95)*0.05*0.2*1.6		8,095					
1E+06	583410001100	Kamenivo drvené drobné frakcia 4-8 mm	t	36,428	24,00	874,28	1,000	36,428	0,000
		"parkovisko medzi obrubníkmi - plocha z pc 80% z objemu							
		(505.95)*0.05*0.8*1.8		36,428					
1E+06	p96	Miešanie podkladových vrstiev + ložnej vrstvy podľa zloženia vid. PD	t	44,523	17,00	756,89	0,000	0,000	0,000
		"zeolit							
		8.095		8,095					
		"štrkodra 4-8 mm							

Rozpočet PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVISKO

		36,428		36,428					
1E+06	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	42,777	0,72	30,80	0,006	0,257	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3		42,777					
1E+06	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	85,554	0,38	32,51	0,001	0,052	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3*2		85,554					
1E+06	577143112	Betón asfaltový po zhutnení, strednozrnný AC 11, CA 50/70, II hr. 50mm	m2	42,777	20,00	855,54	0,132	5,663	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3		42,777					
1E+06	584772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného fr. 0-32 mm (vibr. šírka) po zhut. hr. 250 mm	m2	42,777	10,55	451,30	0,601	25,711	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)*0.3		42,777					
1E+06	599142111	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár hĺbky do 40 mm, šírky nad 20 do 40 mm	m	144,990	4,91	711,90	0,002	0,325	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)+0.3*8		144,990					
5		SPEVNENÉ PLOCHY				40 188,77		802,19	0,000
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1E+06	917862111	Osadenie cestného obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	383,000	8,13	3 113,79	0,126	48,204	0,000
		"zvýšený - výkaz z pc							
		257		257,000					
		"zapustený - výkaz z pc							
		126		126,000					
1E+06	979089201	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - asfaltové zmesi	t	19,250	43,84	843,90	0,000	0,000	0,000
		"asf. plocha							
		42.777*0.45		19,250					
1E+06	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	3,000	20,44	61,32	0,227	0,681	0,000
		"pre značky							
		3		3,000					
1E+06	4044713033_1	Dopravná značka 506-86 - dodatková tabuľa 600x330 mm	ks	3,000	75,00	225,00	0,003	0,008	0,000
		"značky pre imob.							
		3*1		3,000					
1E+06	4044713027	Dopravná značka 272 (Parkovisko)	ks	3,000	64,00	192,00	0,003	0,008	0,000
		"značky pre imob.							
		3*1		3,000					
1E+06	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	6,000	8,97	53,82	0,000	0,000	0,000
		"značky pre imob.							
		3*2		6,000					
1E+06	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl. 3,5m	ks	3,000	49,00	147,00	0,000	0,000	0,000
		"značky pre imob.							
		3*1		3,000					
1E+06	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	3,000	7,97	23,91	0,000	0,000	0,000
		"značky pre imob.							
		3*1		3,000					
1E+06	915709113	Príplatok k cene za úpravu vodorovného značenia balotínovou reflexnou fóliou	m2	6,000	0,64	3,84	0,000	0,002	0,000
		"pre imob.							
		3*2		6,000					
1E+06	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípk napísav, prechodov a pod.	m2	6,000	22,00	132,00	0,001	0,004	0,000
		"pre imob.							
		3*2		6,000					
1E+06	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	144,990	15,58	2 258,94	0,000	0,010	0,000
		"pri novonavrhovaných park. miestach							
		(10.5+6.53*3+16.8+51.2+32.5+12)+0.3*8		144,990					
1E+06	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 16/20 XF1	m3	22,980	101,90	2 341,66	2,201	50,581	0,000
		"zvýšený - výkaz z pc							

Rozpočet PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA V BARDEJOVE / SO 01 - PARKOVISKO

		257*0.2*0.3		15,420					
		"zapustený - výkaz z pc							
		126*0.2*0.3		7,560					
1E+06	592036040401	Obrubník cestný so skosením 12/4 cm, 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	260,000	8,47	2 202,20	0,085	22,100	0,000
		"zvýšený - výkaz z pc							
		257*1.01		259,570					
		"dorovnanie							
		260-259.57		0,430					
1E+06	592036040501	Obrubník cestný bez skosenia 100 x 15 x 26 cm, farba sivá	KUS	126,000	8,97	1 130,22	0,090	11,340	0,000
		"zapustený - výkaz z pc							
		126		126,000					
1E+06	97908111011	Nakladanie sutiny na dopravný prostriedok	t	39,925	7,02	280,27	0,000	0,000	0,000
1E+06	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,925	15,58	622,03	0,000	0,000	0,000
1E+06	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	558,950	0,52	290,65	0,000	0,000	0,000
		39.925*14		558,950					
1E+06	979089212	Poplatok za skladovanie sute	t	20,675	16,00	330,81	0,000	0,000	0,000
		"spolu							
		39.925		39,925					
		"asf. plocha							
		-42.777*0.45		- 19,250					
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				14 253,36		132,94	0,000
99		PRESUNY HMÔT							
1E+06	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	936,515	8,00	7 492,12	0,000	0,000	0,000
99		PRESUNY HMÔT				7 492,12		0	0,000
		Práce HSV				79 193,09		936,520	39,930
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1E+06	P - 1002_11	Preložka Verejného osvetlenia o 4m do zeleného pásu,(demont. stáv. stĺpa + komplet nová ryha, rozvod, základ +stĺp, revízia)	kpl	1,000	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				500,00		0,000	0,000
		Montážne práce				500,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				79 693,09		936,520	39,930

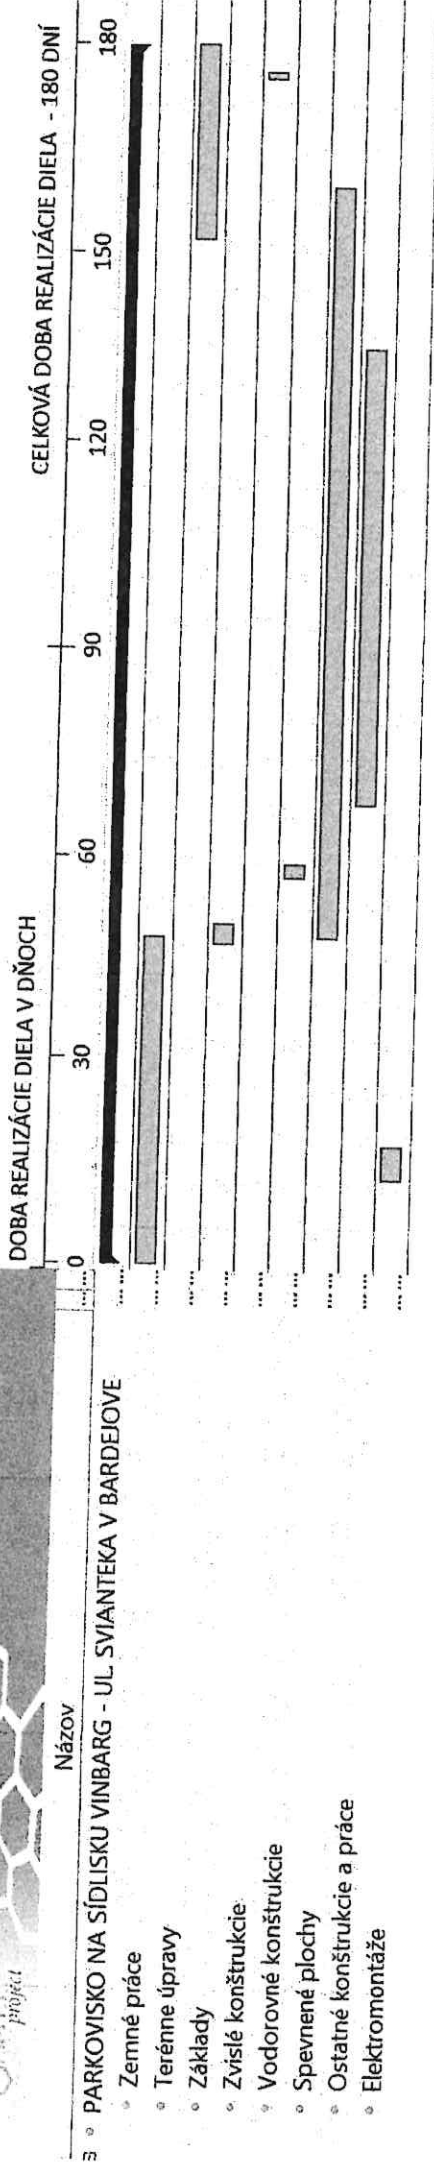

CUKSTAV s.r.o.
 Štádkova 3263/49, 035 01 Bardejov
 IČO: 45 344 086, IČ DPH: SK

Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08501 Bardejov
Zákazka: Stavebné práce „PARKOVISKO NA SÍDLISKU VINBARG - UL. SVIANTEKA
V BARDEJOVE“

Uchádzač: CUKSTAV s.r.o

Adresa sídla, miesta podnikania alebo pobytu: Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov

Zoznam subdodávateľov: Bez subdodávateľov

Subdodávateľ (obchodné meno, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%
		00,0%

Dátum: 19.9.2024

CUKSTAV s.r.o.
Stocklová 3263/49, 085 01 Bardejov
085 006, IČ DPH: SK2022947025

otlačok pečiatky uchádzača

František Harčari
pod
(meno, priezvisko, funkcia)
zástupcu uchádzača oprávneného
 konať v záväzkových vzťahoch)
