

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa:
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z25-014-0060

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet obstarávania

„I/59 Biely Potok – most 057“
(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

1. Objednávateľ

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Slovenská správa ciest

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

000 033 28

2021067785

Telefón:

+421 41 507 4612

e-mail:

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných
 - vo veciach technických
 - vo veciach realizačných
 - stavebný dozor
 - kontroly kvality materiálov a prác:
- Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová - oddelenie právne SSC IVSC ZA
Ing. Stanislav Lališ - námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC ZA
Ing. Jana Štoderová - oddelenie prípravy stavieb SSC IVSC ZA
Ing. Vladimír Veveričik - námestník úseku investičnej výstavby SSC IVSC ZA
Ing. Vladimír Hudec
Ing. Ružena Moravčíková, PhD - OL SSC IVSC ZA

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M 95 zo dňa 07.12.1995

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ, JUDr. Lukáš Galeštok-konateľ

00 896 225

SK2020294144

041/516 64 97

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
 - vo veciach technických:
 - vo veciach realizačných:
- Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
Roman Banič – stavbyvedúci
Ing. Ondrej Mištrík – zástupa stavbyvedúceho

Právna forma:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

spoločnosť s ručením obmedzeným

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania
(Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list
(Zväzok 1)
 - (c) Príloha k ponuke
(Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (d) Osobitné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (e) Všeobecné zmluvné podmienky
(Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (f) Technické špecifikácie
(Zväzok 3 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
(Zväzok 5 súťažných podkladov, na priloženom CD/DVD nosiči)
 - (h) Cenová časť
(Zväzok 4 súťažných podkladov)
 - (i) Ponuka Zhotoviteľa
(neprikladá sa k písomnému vyhotoveniu Zmluvy)
 - (j) Vzorové tlačivá
(Zväzok 2 Časť 4 až 14 súťažných podkladov)
 - (k) Ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu
 - (l) Environmentálny plán výstavby

Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.

2. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
3. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
4. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
5. Súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov uvedené na webovej stránke uvo.gov.sk v profile Objednávateľa, v dokumentoch zákazky. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „I/59 Biely Potok – most 057“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
7. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
8. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH 1 237 625,26 EUR
DPH 23% 284 653,81 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH 1 522 279,07 EUR
(slovom jedenmiliónpäťstodvadsaťdvatisícdevstosedemdesiatdeväť EUR, 07/100 EUR)
9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, pod pojmom Zhotoviteľ sa rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ

- zaväzuje doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Zmluvných podmienok.
10. V prípade, ak v mene Zhotoviteľa koná splnomocnený zástupca, neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo je plná moc udelená Zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti na predmet zákazky „I/59 Biely Potok -most 057“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 12. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo náhrady škody podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Zmluvných podmienok. Zmluvné Strany sa zároveň dohodli, že pri uplatnení nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa ustanovenie § 300 Obchodného zákonníka neuplatňuje.
 13. Zmluva o Dielo je vyhotovená v *troch* rovnopisoch, z ktorých *dva* obdrží Objednávateľ a *jeden* Zhotoviteľ.
 14. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Vzhľadom na skutočnosť, že v deň platnosti tejto Zmluvy nemá objednávateľ ešte zabezpečené financovanie plnenia predmetu tejto Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na tejto odkladacej podmienke účinnosti Zmluvy: Zmluva nadobudne účinnosť šesťdesiaty kalendárny deň potom, ako bude zhotoviteľovi doručené písomné oznámenie objednávateľa (SSC) o tom, že objednávateľ si zabezpečil financovanie plnenia predmetu tejto zmluvy. Táto Zmluva zanikne a bude sa na ňu hľadieť ako keby k jej uzavretiu nikdy nedošlo v prípade, ak objednávateľ nedoručí zhotoviteľovi písomné oznámenie o zabezpečení financovania predmetu tejto Zmluvy podľa bodu 2 a to ani najneskôr do konca rozpočtového roka nasledujúceho po rozpočtovom roku v ktorom nadobudla platnosť táto Zmluva.
 15. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
 - Príloha č. 1 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
 - Príloha č. 2 Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe
 - Príloha č. 3 Harmonogram prác - tak ako bol predložený v ponuke Zhotoviteľa
 - časť 3.1 Vecný harmonogram
 - časť 3.2 Míľníky - **nebudú určené, kdekoľvek v texte v obchodných podmienkach sa nachádzajú odkazy na míľníky, tieto uchádzač/Zhotoviteľ nemá brať do úvahy**
 - časť 3.3 Fakturačný harmonogram
 - Príloha č. 4 Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok
 16. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými stranami, s výnimkou uvedenou v bode 17 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok vrátane zmien Prílohy č. 3 týchto Zmluvných dojednaní, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roka a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce

- vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
17. Zmluvné Strany sa výslovne dohodli, že na zmenu Prílohy č. 1 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 15 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Zmena Prílohy č. 1 sa realizuje postupom v zmysle podčlánku 4.4b Zmluvných podmienok. Zmena Prílohy č. 3 sa realizuje postupom v zmysle podčl. 13.3 Zmluvných podmienok, čím nie je dotknutá povinnosť zmluvných Strán uzavrieť písomný dodatok podľa bodu 16 týchto Zmluvných dojednaní.
 18. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
 19. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
 - a) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej Únie,
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi aktmi Európskej Únie.
 20. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi. Ustanovenie tohto bodu sa uplatní v prípade, ak nie je v rozpore so zákonom č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 21. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné Strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných Strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných Strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
 22. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Žiline, dňa

V, dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Juraj Serva
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Príloha č. 1 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), Zhotoviteľ uvádza zoznam všetkých navrhovaných subdodávateľov v členení:

A/ Priami Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8.1 Osobitných zmluvných podmienok

B/ Podzhotovitelia v zmysle podčlánku 1.1.2.8 Osobitných zmluvných podmienok (s výnimkou Priamych Podzhotoviteľov)

C/ Dodávateľia Zhotoviteľa

A/

p.č.	Priami Podzhotovitelia (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konat' za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	FREYSSINET CS, a.s., Kráľovická 267, 250 01 Zápy, IČO 61 673 048, Česká republika		Predpínanie nosnej konštrukcie	3,10%	46 668,66 €
2.	GEOAKTUAL s.r.o., Nitrianska 1531/75, 927 05 Šaľa, IČO 36 710 954, Slovensko,		Geodetické práce	2,14 %	32 595,00 €
3.	Bohrfix s.r.o., Brodňanská 479/116A, 010 14 Žilina, IČO 45 633 142, Slovensko		Špeciálne zakladanie	5,25%	79 950,00 €
4.	BRB výroba s.r.o., Bytčianska 126/497, 010 03 Žilina, IČO 50 928 295, Slovensko		Zvodidlá a zábradlia	2,42%	36 777,00 €
5.	TESScontrol, s.r.o., Dubochňianska 1/A, 831 04 Bratislava, IČO 47 716 363, Slovensko		Kontrolno- preberacie skúšky	0,73%	11 070,00 €
6.	DAQE Slovakia s.r.o., Príbinova 8953/62, 010 01 Žilina, IČO 36 848 751, Slovensko		DSRS a DVP	0,61%	9 225,00 €
7.	VIA-CESTY s.r.o., 1180, 023 01 Oščadnica, IČO 36 382 558, Slovensko		Frézovanie asfaltových povrchov	0,50%	7 380,00 €
8.	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3, IČO 03 579 727, Česká republika		Monitoring predpätia a prvá prehliadka mosta	1.87%	28 474,50 €
			Súhrn podielu subdodávok	16,62%	252 140,16 €

B/

p.č.	Podzhovitelia (s výnimkou Priamych Podzhotovitel'ov) (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
1.	Geotechnik SK, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina, IČO 36 432 202, Slovensko		Geologický prieskum	0,06%	984,00 EUR
2.	G.B.DAD, s.r.o., Šrobárová 665/5, 917 01 Trnava, IČO 36 250 961, Slovensko		Asfaltové postreky	0,18%	2 767,50 EUR
			⋮		
3.	VIA FLEX, s.r.o., Nádražná 33, 90 901 Skalica, IČO 44 259 867, Slovensko		Asfaltové zálievky	0,16%	2 460,00 EUR
4.	ZNAČKY, s.r.o., Nemocničná 2321, 026 01 Dolný Kubín, IČO 43 931 111, Slovensko		Vodorovné a zvislé dopravné značenie	0,27%	4 059,00 EUR
			Súhrn podielu subdodávok	0,67%	10 270,50 EUR

C/

p.č.	Dodávateľia Zhotoviteľ'a (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, štát)	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávky	Podiel subdodávok	
				v %	v EUR s DPH
				-	-
			Súhrn podielu subdodávok	-	-

V Žiline dňa

.....
Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Príloha č. 2 k Zmluvným dojednaniám - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe

Funkcia	Meno a priezvisko
Hlavný stavbyvedúci	Roman Banič
Zástupca hlavného stavbyvedúceho	Ing. Ondrej Mištrík
Zodpovedný geodet	Ing. Martin Borza
Koordinátor BOZP	Bc. Ivan Gajdoš

V Žiline dňa

.....
Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: I/59 Biely Potok - most 057
 Objednávateľ: Slovenská správa ciest, IVSc Žilina
 Zhotoviteľ: Swietalský-Slovakia, spol. s r.o.

Realizácia diela: do 7 mesiacoch od odovzdania staveniska

Sídlo vedenia stavby: Běnovská cesta 11, Žilina (sídlo uchádzača)
 Zariadenie staveniska: bunkovisko a sklady v oblasti mostného objektu
 Výrobia asfaltových zmesí: Obalovačka Martin, s.r.o., Martin - Priekopa (46 km)
 Betonáreň: RBR betón, a.s., Ružomberok
 Laboratórium: TESS Control, spol. s r.o., Žilina, Bratislava, Zvolen

Navrhovaný postup výstavby je zrejmy z harmonogramu výstavby.

PČ	Činnosť	Dni realizácie	Týždeň realizácie																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
1	Zriadenie zariadenia staveniska a osadenie DDZ pre 1. etapu	7																																	
2	Odstáranie krovín, stromov a omnice v mieste obchádzky	7																																	
3	Zhotovenie opôr mostného provizória a násypu obchádzky	14																																	
4	Osadenie mostného provizória a zhotovenie konštrukčných vrstiev obchádzky	7																																	
5	Dokončovacie práce na obchádzkovej trase a osadenie DDZ pre 2. etapu	7																																	
6	Odstáranie zvodidiel, zábradlia a konštrukčných vrstiev vozovky	7																																	
7	Vybúranie mostného objektu a recyklácia betónovej suty	21																																	
8	Zemné práce a hĺbkové zakladanie mostného objektu	21																																	
9	Zhotovenie základov, mostných opôr a krídliel	35																																	
10	Zhotovenie novej konštrukcie mostného objektu	42																																	
11	Zhotovenie mostného zvršku a prechodových oblastí	21																																	
12	Osadenie DDZ pre 3. etapu a presmerovanie dopravy na ľavú stranu cez nový mostný objekt	2																																	
13	Demontáž dopravného značenia a mostného provizória	7																																	
14	Odstáranie konštrukčných vrstiev a odkop zemného telesa obchádzky	14																																	
15	Úprava komunikácie na pravej strane	14																																	
16	Dokončovacie práce (zvodidla, značenie, krajnice)	7																																	
17	Osadenie DDZ pre 4. etapu a presmerovanie dopravy na pravú stranu cez nový mostný objekt	2																																	
18	Úprava komunikácie na ľavej strane	14																																	
19	Dokončovacie práce (zvodidla, značenie, krajnice)	7																																	
20	Vypratanie staveniska a odstáranie DDZ	2																																	

Poznámka: V harmonograme sú vyzobrazené nosné stavebné práce. Ostatné neuvedené stavebné práce nebudú mať vplyv na lehotu výstavby diela alebo jej časti.

V Žiline 25.11.2024

.....
 Ing. Juraj Serva
 riaditeľ oblasti Sever

.....
 Ing. Ján Karoň, PhD.
 vedúci oddelenia prípravy a kalkulácií


FAKTURAČNÝ HARMONOGRAM

Stavba: I/59 Biely Potok – most I/057
 Objednávateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Žilina
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.

Realizácia diela: do 7 mesiacoch od odovzdania staveniska

PČ	Číslo objektu	Názov objektu	1	2	3	4	5	6	7	CELKOM
1	000-00	Všeobecné položky stavby	19,797.41 €	21,749.64 €	16,713.84 €	16,713.84 €	16,713.84 €	16,713.84 €	86,001.35 €	194,403.76 €
2	101-00	Cesta I/59	0.00 €	20,065.20 €	7,023.17 €	0.00 €	3,592.25 €	13,095.67 €	113,414.23 €	157,190.52 €
3	201-00	Most ponad Revúcu	0.00 €	153,980.44 €	55,947.48 €	105,167.46 €	225,977.08 €	62,408.67 €	59,751.03 €	663,230.16 €
4	801-00	Obchádzková trasa	73,340.87 €	46,097.99 €	19,724.64 €	19,724.64 €	19,724.64 €	30,692.48 €	13,495.57 €	222,800.82 €
CELKOM FA PO MESIACHOCH BEZ DPH			93,138.28 €	241,893.27 €	99,409.13 €	141,605.94 €	266,007.81 €	122,908.66 €	272,662.18 €	1,237,625.26 €
KUMULATÍVNA FA BEZ DPH			93,138.28 €	335,031.55 €	434,440.68 €	576,046.61 €	842,054.42 €	964,963.08 €	1,237,625.26 €	2,280,846.76 €

KUMULATÍVNA FAKTURÁCIA

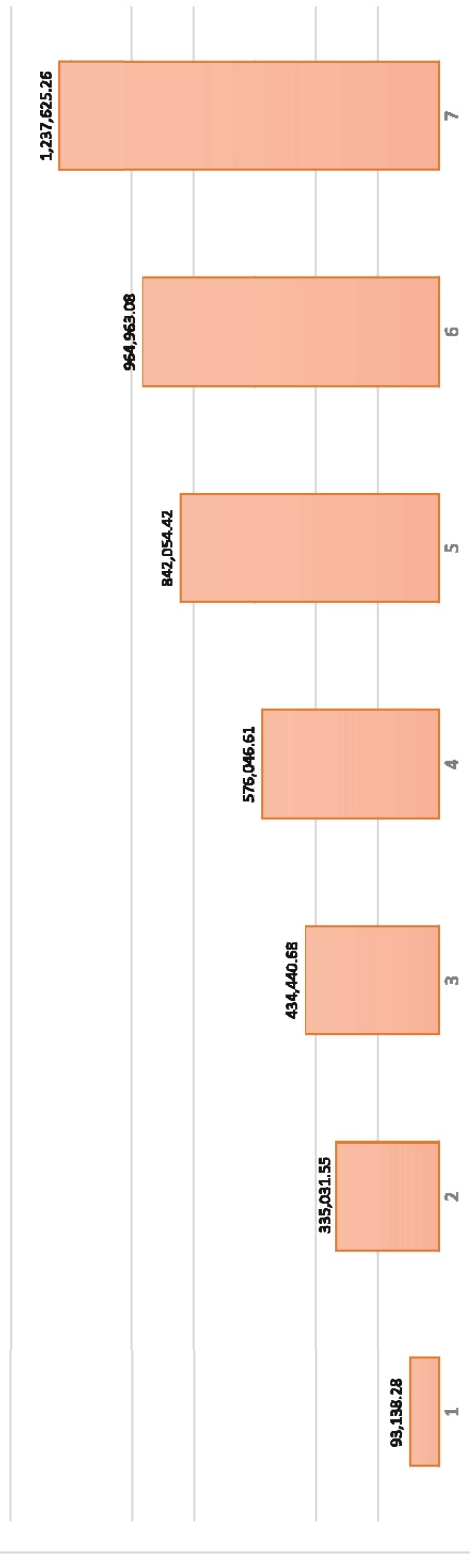

.....
 Ing. Juraj Ševca
 riaditeľ oddelení Sever

.....
 Ing. Ján Karčoň, PhD.
 vedúci prípravy a kalkulácií

Príloha č. 4 k Zmluvným dojednaniám - Podmienky BOZP na stavenisku a Sankčný poriadok

Podmienky BOZP na stavenisku

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

1. Týmito podmienkami sa ustanovujú všeobecné zásady a základné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách stavieb, ktorých stavebníkom je Objednávateľ.
2. Určuje povinnosti Zhotoviteľa stavby, resp. Priamych Podzhotoviteľov, Podzhotoviteľov a Dodávateľov Zhotoviteľa (ďalej len „subdodávateľia“):
 - a) pri zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách Objednávateľa;
 - b) pri kontrole dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách Objednávateľa;

Povinnosti stavebníka, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pri zabezpečení splnenia minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na staveniskách Objednávateľa sú zabezpečované v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.“).

Čl. 2

Základné pojmy

Koordinátorom bezpečnosti sa rozumie:

- a) fyzická osoba - zamestnanec Zhotoviteľa, resp. osoba, ktorá má so Zhotoviteľom pracovno-právny, alebo iný zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je na základe predložených dokladov uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke), ako osoba zodpovedná za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) na stavenisku; Podpisom Zmluvy o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je Príloha k ponuke, sa osoba navrhnutá Zhotoviteľom na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, stáva osobou poverenou Objednávateľom/stavebníkom v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko; a v plnom rozsahu zodpovednou za BOZP na predmetnom stavenisku Objednávateľa;
- b) fyzická osoba - zamestnanec Objednávateľa, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a ktorá je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke);
- c) fyzická osoba, ktorá nie je zamestnancom Objednávateľa, avšak Objednávateľ s ňou má uzavretý zmluvný vzťah, ktorá spĺňa podmienky a má príslušné oprávnenia vykonávať činnosť koordinácie bezpečnosti podľa osobitného predpisu a je uvedená v Zmluve o dielo (resp. v Prílohe k Ponuke).

Základnými opatreniami na zaistenie BOZP na stavenisku sa rozumejú:

- a) bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko ustanovené v Prílohe č. 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
- b) bezpečnostné a zdravotné označenie na stavenisku ustanovené v Prílohe č. 1 Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci;
- c) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych prácach a prácach s nimi súvisiacimi, pri murárskych prácach, pri montážnych prácach, pri

práci vo výške a nad voľnou hĺbkou, pri búracích prácach a rekonštrukčných prácach, pri práci so strojom a pri prácach súvisiacich so stavebnými prácami

ustanovené v Prílohe č. 1 až 9 Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Práce s osobitným nebezpečenstvom sú najmä práce uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z., pri ktorých sa riziko zvyšuje vzhľadom na jej charakter, použitý pracovný postup alebo podmienky pracovného prostredia.

Všeobecné zásady prevencie sú požiadavky na zaistenie BOZP uvedené v §7 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.

Čl. 3

Povinnosti stavebníka (Objednávateľ'a)

1. Stavebník je povinný :
 - a) umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazeráť do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu;
 - b) bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

Čl. 4

Povinnosti Zhotoviteľa (realizátora)

1. Zhotoviteľ je povinný plniť opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rozsahu stanovenom príslušnou Zmluvou o dielo a jej nedeliteľných súčasti a v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku aj zo strany subdodávateľ'ov, ktorí sú uvedení v príslušnej Zmluve o dielo.

Čl. 5

Organizačné zložky

Organizačná zložka Objednávateľ'a - Oddelenie investičnej výstavby IVSC Žilina

zabezpečuje spoluprácu s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektorátmi práce a Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pri oznamovaní a kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na staveniskách;

koordinuje spôsob vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane Plánu BOZP pre konkrétne stavenisko;

zabezpečuje vypracovanie Plánu BOZP, ak nebol súčasťou projektovej dokumentácie DSP/DP a jeho zmien a dodatkov, ak je to potrebné prostredníctvom Zhotoviteľa alebo tretej strany;

vykonáva kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a noriem na stavenisku v súlade s platnou legislatívou počas celej doby trvania výstavby.

SANKČNÝ PORIADOK

Porušenie povinností BOZP a OPP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi)

1. **NAPOMENUTIE (porušenie povinností zistené prvý krát):**

- nepoužívanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- nesprávne postavenie rebríka pre výkon práce
- lešenie bez bezpečnostného štítka
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - pracovník nemá osvedčenie pri sebe na stavenisku
- neoznačenie elektrických rozvádzačov, umiestnenia požiarnych zariadení a prostriedkov prvej pomoci
- nesprávne vedenie rozvodných elektrických káblov
- fajčenie na stavenisku v blízkosti horľavého materiálu
- nevyhovujúce ukladanie stavebného materiálu
- na stavenisku nájdené obaly z alkoholických nápojov
- manipulácia s chemikáliami do objemu 1 litra v rozpore s inštrukciami od výrobcu

2. **ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinností opakovane (aspoň 2 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinností uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí vyššie, považuje sa takéto porušenie za závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)**

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP **vo výške 30,- EUR** za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinností udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinností uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie nevyhovujúceho rebríka
- nezabezpečenie revízie lešenia v stanovených termínoch
- nezabezpečenie staveniska proti pádu z výšky alebo do hĺbky zistené opakovane
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) - zhotoviteľ nevie preukázať osvedčenie pracovníka
- zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarnym zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- ukladanie materiálu na rozvodné elektrické káble, prechádzanie po nich vozíkmi, motorovými vozidlami a pod.
- vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru bez požadovaného zabezpečenia
- používanie nevhodného spôsobu viazania bremien
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade

podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa

- manipulácia s chemikáliami do objemu 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu

3. OBZVLÁŠŤ ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE BOZP a OPP (Porušenie povinnosti opakovane (aspoň 3 x). V prípade, ak sa jedná o porušenie povinnosti uvedenej v tomto odseku a zároveň neuvedenej v Napomenutí a v Závažnom porušení BOZP a OPP vyššie, považuje sa takéto porušenie za Obzvlášť závažné porušenie BOZP a OPP vtedy, ak bolo porušenie zistené aj prvý krát)

Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujúce porušenia povinností v oblasti BOZP, OPP vo výške 500,- EUR za každé zistené porušenie povinností zvlášť:

- nepoužívanie OOPP za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, zistené opakovane; alebo ak pracovníci nemajú požadované OOPP vôbec k dispozícii na stavenisku
- nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku, a to najmä, nie však výlučne, za nedodržanie povinnosti udržiavať vyčistené a zjazdné komunikácie a spevnené plochy na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov, za nedodržanie povinnosti uložiť skladový materiál na Stavenisku podľa bezpečnostných predpisov
- používanie rebríka nebezpečným spôsobom (ako podpera, prechodový mostík a pod.) bez určenia výrobcom
- používanie lešenia bez ochranných prvkov, zábradlí a pod.
- vykonávanie práce bez kolektívneho a osobného zabezpečenia proti pádu z výšky a do hĺbky
- vykonávanie práce bez osvedčenia (napr. zvárač, strojník, viazač, ...) pri ktorej sú zároveň porušené aj iné požiadavky na bezpečnú prácu
- opakované zamedzenie prístupu k elektrickým rozvádzačom, požiarным zariadeniam, alebo prostriedkom pre poskytnutie prvej pomoci
- práca s poškodeným ručným elektrickým náradím
- vykonávanie činností s otvoreným ohňom bez požadovaného zabezpečenia
- používanie poškodeného viazacieho prostriedku pri prenášaní bremena
- požívanie alkoholických nápojov, alebo omamných látok alebo psychotropných látok a za odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky, resp. v prípade podrobenia sa takejto skúške s pozitívnym výsledkom, za každého zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa
- manipulácia s chemikáliami v objeme nad 100 litrov v rozpore s inštrukciami od výrobcu.
